
*INFORME SOBRE LOS AVANCES DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA 2021-2023
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL*

Periodo julio a diciembre 2022



Junta General Ejecutiva

Sesión Ordinaria

14 de febrero de 2023

**INFORME SEMESTRAL DE LOS AVANCES DEL
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA
INMOBILIARIA 2021-2023 DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL**

Período

julio a diciembre 2022

C O N T E N I D O

- 1. Antecedentes.**
- 2. Informe Semestral de los Avances.**
 - a) Junta Local Ejecutiva en el Estado de Zacatecas.
 - b) Junta Local Ejecutiva en el Estado de Nuevo León.
 - c) Junta Local Ejecutiva en el Estado de Guerrero.
 - d) Edificio Acoxpa en la Ciudad de México.
 - e) Conjunto Tlalpan en la Ciudad de México.
 - f) Adquisición de un inmueble para la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Durango.
 - g) Mantenimiento y conservación de inmuebles que ocupan las Juntas Locales y Distritales; así como de las Oficinas Centrales del Instituto.
 - I. Cómputo y Resguardo Documental (**CECYRD**).
 - II. Junta Local Ejecutiva en el Estado de Jalisco.
 - h) Edificio de Insurgentes en la Ciudad de México.
 - i) Junta Local Ejecutiva en el Estado de Aguascalientes.
 - j) Junta Local Ejecutiva en el Estado de Durango.
- 3. Destino, uso y aplicación de los recursos erogados o comprometidos.**

1. ANTECEDENTES

- Que el 14 de febrero de 2022 en la Primera Sesión Ordinaria del Comité Técnico “Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral”, se aprobó el Programa Anual de Trabajo en materia inmobiliaria para el ejercicio 2022.
- Que mediante Acuerdo No. INE/JGE151/2022 de fecha 18 de julio de 2022, la Junta General Ejecutiva aprobó la modificación del Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2021-2023 del Instituto Nacional Electoral.
- Que mediante Acuerdo No. INE/JGE216/2022 de fecha 4 de noviembre de 2022, la Junta General Ejecutiva aprobó la modificación del Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2021-2023 del Instituto Nacional Electoral en el periodo comprendido de 2022-2023.
- Que en dicho acuerdo en el punto “SEGUNDO.- Se autoriza que en el marco del Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2021-2023 del Instituto Nacional Electoral, se lleven a cabo las acciones contempladas en dicho Programa, por un monto actualizado sin modificar su monto inicial estimado de \$341,722,000.00 (Trescientos cuarenta y un millones setecientos veintidós mil pesos 00/100 M.N.), a precios corrientes”.
- Asimismo, en el punto “SEXTO.- La Dirección Ejecutiva de Administración informará semestralmente a la Junta General Ejecutiva, de los avances sobre la ejecución del Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2021 – 2023 del Instituto Nacional Electoral, en el periodo de 2022-2023 así como el destino, uso y aplicación de los recursos erogados o comprometidos para tal fin, sin perjuicio de los informes que solicite el Secretario Ejecutivo”.

2. INFORME SEMESTRAL DE LOS AVANCES

a) CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO SEDE PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE ZACATECAS.

Actividades relevantes

- Durante el segundo semestre del año 2022, concluyeron los trabajos de construcción del Edificio sede para la Junta Local Ejecutiva (JLE) del estado de Zacatecas; razón por la cual con fecha 02 de septiembre de 2022 se realizó el acto de inauguración del Edificio sede, entregándose este a la Junta Local Ejecutiva, realizándose el acto de recepción de la obra por la contratista encargada de la ejecución de los trabajos con fecha 07 de noviembre de 2022; en razón de ello, actualmente se trabaja en la integración del finiquito y cierre administrativo de la obra.
- Respecto a las gestiones realizadas por la Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas (UVIE), con fecha 6 de Diciembre de 2022 se emitió el Dictamen de Verificación de Instalaciones eléctricas, por lo que con fecha 7 de diciembre de 2022, se gestionó ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la contratación definitiva del servicio de acometida eléctrica.

Álbum fotográfico



Fachadas



Fachadas



Acto de Inauguración



Acto de Inauguración

INFORME SOBRE LOS AVANCES DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA 2021-2023
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL



Periodo julio a diciembre 2022




Plaza de Acceso, Exteriores



Acceso Estacionamiento, Exteriores

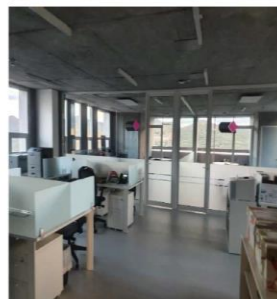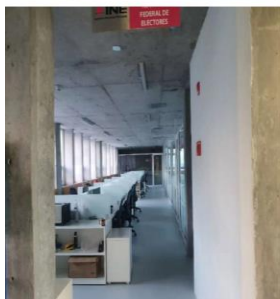

Área de Oficinas

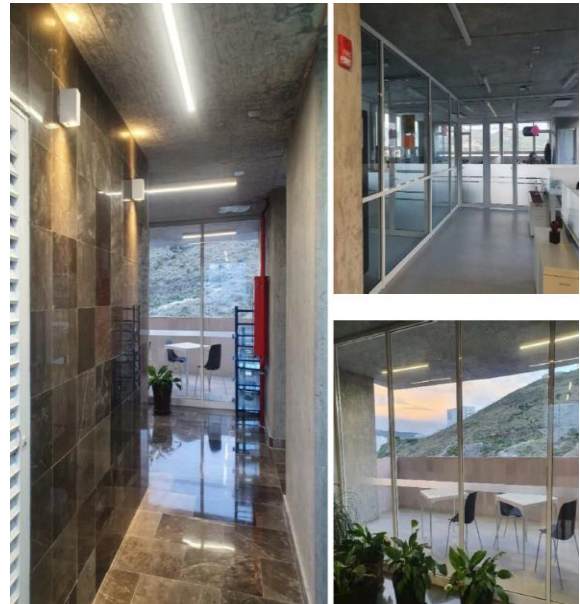

Área de Oficinas

b) CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO SEDE PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

Actividades relevantes

- Durante el segundo semestre del año 2022, se continúa con la suspensión del servicio para el Desarrollo del proyecto ejecutivo para la Construcción del Edificio sede de la Junta Local Ejecutiva del Estado de Nuevo León, derivado de la suspensión parcial de la partida Gestión de trámites, hasta en tanto se resuelva por la Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible (SEDUSO) en el municipio de Monterrey, la procedencia del trámite para la obtención de la Licencia de Construcción; no obstante este retraso, se obtuvo la Licencia de Demolición.
- Es de destacar que en el trámite de la Licencia de Construcción el atraso en su expedición por la SEDUSO se ha motivado por los cambios en los criterios sobre los requisitos que deben cumplirse; de ahí que, se han solicitado estudios complementarios y la actualización de la documentación que integra el expediente; en razón de ello, actualmente el trámite se ha dividido en tres fases: Factibilidad de Uso de Suelo, Fijación de Lineamientos Generales y Permiso de Licencia de Uso de Suelo y Construcción; por lo que, hasta en tanto se apruebe el expediente con los requisitos adicionales establecidos por la autoridad el pasado 20 de octubre de 2022 y que involucra a otras dependencias en la entidad, se podrá iniciar con la primera fase para obtener la licencia, momento en el que se determinará el importe a pagar por los derechos correspondientes y el plazo probable para su expedición.
- Se dio inicio con las acciones para la contratación de la obra y sus servicios relacionados, encontrándose en proceso la Licitación Pública Nacional número LP-INE-14/OP/2022, relativa a los servicios de “Construcción del Edificio sede para la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Nuevo León del Instituto Nacional Electoral”, así como la Licitación número LP-INE-13/SROP/2022, relativa a los trabajos de “Supervisión de la Construcción del Edificio sede para la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Nuevo León del Instituto Nacional electoral”, en ambos casos se prevé su inicio de actividades en el primer semestre de 2023.


Avances

- El servicio presenta un avance real del 97.85%.
- El avance financiero del servicio es del 85.08%.

Álbum fotográfico



Fachada



Áreas Operativas

c) CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO SEDE PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE GUERRERO.

Actividades relevantes

- Durante el segundo semestre del ejercicio 2022, con la finalidad de iniciar con el proceso de contratación de los trabajos para la construcción del Edificio sede de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guerrero, se continúa con la integración del expediente y la definición de los alcances del proyecto integral para la actualización del Proyecto Ejecutivo desarrollado en el año 2015.
- En coordinación con la Junta Local Ejecutiva se están identificando los requisitos para obtener los permisos y licencias que permitan la construcción del edificio; de ahí que, se han realizado las gestiones para obtener el alineamiento y número oficial, uso de suelo y realizado consultas técnicas con Directores Responsables de obra de la localidad para determinar la viabilidad del proyecto.

d) REMODELACIÓN Y REMOZAMIENTO DEL EDIFICIO DE ACOXPA.

Actividades relevantes

- El servicio relacionado con la obra pública, relativo a la “Evaluación y dictamen estructural del edificio de Acoxpa 436, Col. Ex hacienda de Coapa en la CDMX, propiedad del Instituto Nacional Electoral para obtener la constancia de seguridad estructural y el visto bueno de habitabilidad y operación”, se encuentra concluido; por lo que, se trabaja en la revisión y verificación del servicio para iniciar con el finiquito del contrato.
- Durante el segundo semestre del 2022, se continuó con la gestión de los permisos ante la Alcaldía Tlalpan para estar en condiciones de contratar los trabajos de reforzamiento Estructural.
- Paralelamente, se trabaja en el levantamiento de necesidades para optimizar la ventilación natural del edificio.


e) REMODELACIÓN Y REMOZAMIENTO DEL CONJUNTO TLALPAN.

1. Trabajos de Remodelación en Lobby y Auditorio del edificio "B".

Actividades relevantes

- Durante el segundo semestre del año 2022, se terminó la ejecución de los trabajos de “Remodelación en Lobby y Auditorio del Edificio B del Conjunto Tlalpan del Instituto Nacional Electoral” relativo al contrato de obra No. INE/OP/02/2022, con fecha 09 de noviembre de 2022 se llevó a cabo el Acto de Entrega-Recepción de los trabajos encontrándose en proceso de revisión y verificación para llevar a cabo el finiquito del contrato. Durante el segundo semestre del año 2022, se ejecutaron trabajos de mantenimiento, albañilerías, acabados, cancelerías, carpintería, muebles y accesorios sanitarios, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas y accesorios, así como se realizaron trabajos de colocación de mobiliario en área de auditorio.

Álbum fotográfico



Lobby y Oficinas Planta Alta



Auditorio



Vestidor y Núcleo de Baños

2 Trabajos de remozamiento, mantenimiento y optimización de casetas, luminarias, pasos de cortesía, guarniciones y banquetas en acceso de las áreas exteriores del Conjunto Tlalpan.


Actividades relevantes

- Con fecha 16 de noviembre de 2022 se formalizó el Acto de Entrega - Recepción de los trabajos del contrato No. INE/OP/07/2022, encontrándose en proceso de revisión y verificación para llevar a cabo el finiquito y cierre administrativo del contrato; los trabajos ejecutados comprendieron las partidas de preliminares, albañilerías, banquetas y balizado, cambio de luminarias en área de estacionamiento, colocación de señalamiento, colocación de loseta tipo Basaltex en pasos de cortesía, así como la remodelación de las casetas número 1 y 2, del conjunto Tlalpan.

Álbum fotográfico



Banquetas y Balizado

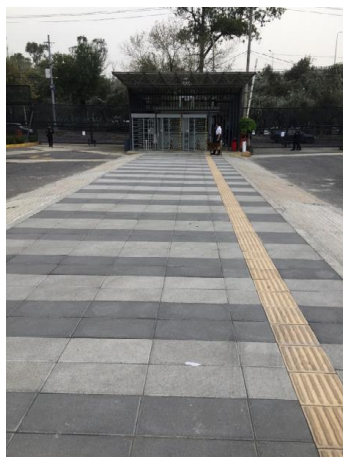

Paso de Cortesía en Edificio "C"



Paso de Cortesía en Edificio “D”




Luminarias en Estacionamiento

3 Evaluación y Dictamen Estructural del Edificio “C” del conjunto Tlalpan.


Actividades relevantes

- Durante el segundo semestre del año 2022, se terminó con la ejecución del motivo del contrato No. INE/SROP/04/2022, llevándose a cabo el Acto de Entrega–Recepción el 20 de septiembre de 2022. Las actividades incluidas en el servicio se integraron por las partidas: Preliminares, (levantamiento estructural y topográfico), estudio de calidad de los materiales y elementos estructurales (extracción de núcleos de concreto endurecido e informe técnico de las actividades de los estudios de calidad), análisis para elaboración de dictamen (verificación de cargas actuantes sobre el edificio, revisión y análisis).
- Con fecha 18 de noviembre de 2022, se formalizó el Acto de finiquito al contrato, resultando un monto contractual ejercido de \$1,694,533.88 IVA incluido y un monto por cancelar de \$238,170.61 IVA incluido, encontrándose en proceso de realización el Acta de extinción de derechos del contrato.

Álbum fotográfico

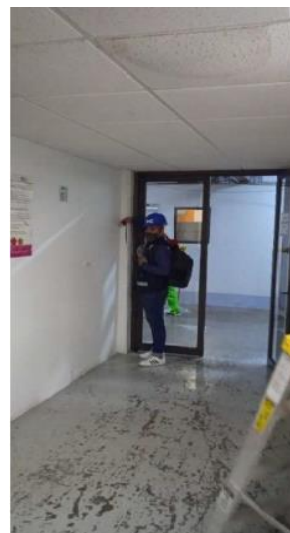

Levantamiento Visual Estructural

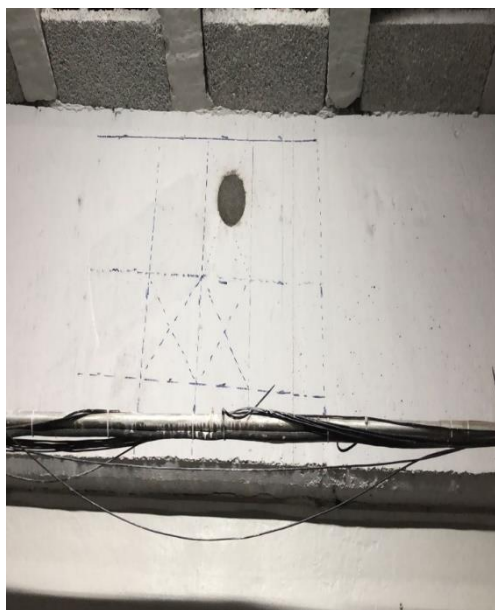

Detección de barras de acero de refuerzo en trabes y columnas

INFORME SOBRE LOS AVANCES DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA 2021-2023
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Periodo julio a diciembre 2022



Prueba de Extracción de corazones en trabes y columnas



Levantamiento Topográfico

4 Gestoría de un Director Responsable de Obra para la ampliación del conjunto Tlalpan propiedad del Instituto Nacional Electoral.

Actividades relevantes

- Durante el segundo semestre de 2022, se continuó con la realización del servicio de Gestoría de un Director Responsable de Obra motivo del contrato No. INE/SROP/06/2022, realizando las siguientes actividades; Trámite de Alineamiento y Número Oficial, ingreso, revisión y seguimiento del Proyecto de Sistema Alternativo ante SACMEX, la SEDEMA y el Instituto de la Seguridad para las Construcciones de la CDMX, asimismo, se realizó la solicitud del Dictamen de Factibilidad de Servicios Hidráulicos y se realizaron los estudios correspondientes para conocer las condiciones mecánicas del terreno.
- Con fecha 21 de diciembre de 2022 la empresa contratista encargada del servicio presentó solicitud de convenio modificatorio para prorrogar la fecha de terminación del contrato, motivado por la suspensión de actividades de las distintas dependencias en el periodo vacacional de diciembre de 2022, impidiendo el ingreso de la documentación necesaria para las gestiones objeto del servicio, obteniéndose solamente respuesta a los trámites de alineamiento y numero oficial del Inmueble.

Avances

- La obra presenta un avance físico del 14.92%.
- El avance financiero de la obra es del 0.00%.

Álbum fotográfico



Estudio de mecánica de suelos



Estudio de mecánica de suelos

5 Trabajos de Remodelación para las Oficinas y áreas comunes del Edificio “A” que se encuentra en el Inmueble del conjunto Tlalpan propiedad del Instituto Nacional Electoral.

Actividades relevantes

- Con fecha 21 de julio de 2022 se suscribió el contrato No. INE/OP/08/2022, a precios unitarios y tiempo determinado, denominado “Trabajos de remodelación para las Oficinas y áreas comunes del Edificio “A”, con un periodo contractual de ejecución del 22 de julio de 2022 al 30 de octubre de 2022; sin embargo, la empresa contratista encargada de la ejecución de los trabajos solicitó prorrogar la fecha de terminación del contrato, motivado por la falta de liberación de las áreas de trabajo.
- Los trabajos ejecutados tuvieron por objeto la remodelación de Oficinas en áreas comunes del Edificio “A”, ejecutando para ello, trabajos diversos en el acceso principal, escaleras, vestíbulos, pasillos de consejo, asesores y sala de usos múltiples, áreas comunes en planta baja y planta alta, sala de consejeros 1 y 2, limpiezas planta baja y planta alta, sala de consejeros en planta alta y oficina de Dirección del Secretariado.
- Con fecha 24 de noviembre de 2022, el contratista notificó el término de los trabajos, realizándose los días 02 de diciembre de 2022 y 23 de diciembre de 2022 las verificaciones correspondientes para corroborar que se cumplió con los criterios de calidad requeridos por el Instituto, que permita realizar el acto de entrega recepción en el arranque del ejercicio 2023, para su posterior finiquito.

Álbum fotográfico



Mantenimiento a puertas de madera



Vestíbulo de Acceso



Acabados en áreas comunes y sala de consejeros



Aplicación de pintura en muros y plafones



Aplicación de pintura en muros y plafones



Colocación de piso en exteriores

6 Trabajos de remodelación para las instalaciones de la Coordinación Nacional de Comunicación Social en el ala norte, de la planta baja del Edificio “D” en el Conjunto Tlalpan propiedad del Instituto Nacional Electoral.

Actividades relevantes

- Durante el segundo semestre de 2022, se realizó el proceso de Licitación Pública Nacional electrónica número LP-INE-12/OP/2022 para la contratación de los trabajos de remodelación para las instalaciones de la Coordinación Nacional de comunicación social en el ala norte, de la planta baja del Edificio “D”; se prevé su inicio en el primer semestre de 2023.

7 Asimismo, se trabaja en la planeación y presupuestación para la contratación de diversos proyectos integrales para continuar con los trabajos de conservación y mantenimiento del inmueble, como son:

- a) Remodelación del edificio C.
- b) Remodelación del edificio D.
 - I. Primera Etapa.
 - II. Segunda Etapa

f) ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE DURANGO.

Actividades relevantes

- 8 Durante el segundo semestre de 2022 se concluyó el procedimiento de Adquisición del terreno adjunto al Edificio sede con el Registro Federal Inmobiliario RFI 10 -7063-5 otorgado por la Dirección de Registro Público y Control Inmobiliario dependiente del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales el 06 de octubre de 2022, al declarar procedente el alta del inmueble.

g) MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES QUE OCUPAN LAS JUNTAS LOCALES Y DISTRITALES; ASÍ COMO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO.

I. Edificio del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECyRD).

Actividades relevantes

- Durante el segundo semestre de 2022, se continúa con la ejecución de los trabajos de conservación y mantenimiento del CECyRD con las actividades de limpieza y aplicación de pintura en estructura, colocación de policarbonato en muros de fachadas, colocación de película emblemática institucional en cristales interiores, instalación de muebles y mamparas en área de baños, instalación de muebles en área de comedor, así como la colocación de piso cerámico en baños.

Avances

- La obra presenta un avance físico del 84.02%.
- El avance financiero de la obra es del 35.10%.

Álbum fotográfico



Aplicación de Pintura en Estructura



Policarbonato en Fachada



Película con Rótulo Institucional



Colocación de mamparas en baños



Instalación de muebles en área de baños



Colocación de muebles de cocina en área de comedor



II. Junta Local Ejecutiva en el Estado de Jalisco.

Actividades relevantes

- Con fecha 21 de julio de 2022, se formalizó el Acto de finiquito de los trabajos de mantenimiento y conservación del Inmueble que ocupa la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Jalisco, cuyo objeto fue construir un muro de colindancia para delimitar las instalaciones

del Instituto en respuesta a la demolición de la construcción del predio colindante; resultando un monto total ejercido de \$379,747.62 IVA incluido y un monto por cancelar de \$380,845.09 IVA incluido, en consecuencia, con fecha 14 de noviembre de 2022 se realizó el Acta de extinción de derechos y obligaciones.

h) REMODELACIÓN Y REMOZAMIENTO DEL EDIFICIO DE INSURGENTES

Sustitución de Elevadores y Eleva-autos.

Actividades relevantes.

- Durante el segundo semestre del 2022, se realizaron las actividades de adecuaciones y adaptaciones en cuarto de máquinas, demolición en foso del cubo del montacoches, se continúa con la desinstalación del segundo elevador, así como se inicia con la instalación del primer elevador.

Avances

- La obra presenta un avance físico del 75.73%.
- El avance financiero de la obra es del 57.56%.

Álbum fotográfico



Adecuaciones y Adaptaciones en cubículos y cuarto de máquinas



Demolición en Foso del Montacoches



Desmontaje y desinstalación de Elevador 2



Inicio de Instalación de Elevador 1

i) CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO SEDE PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

Actividades relevantes

- Se continúa trabajando en la planeación y presupuestación para la contratación del Proyecto Integral, así como la realización del Proyecto Ejecutivo y la contratación de la Construcción del Edificio sede para la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Aguascalientes.
- En la localidad se realiza una investigación normativa para identificar los requisitos que debe cumplir el proyecto ejecutivo y el procedimiento a seguir para obtener de la autoridad competente los permisos y licencias para la construcción del edificio.


j) JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE DURANGO.


Actividades relevantes

- Se trabaja en la definición del anteproyecto arquitectónico de acuerdo a las necesidades de la Junta Local ejecutiva para contar con los insumos que permitan la contratación del proyecto ejecutivo para su construcción.
- Con el apoyo y asesoría de un Director Responsable de Obra del Centro Histórico de la ciudad de durango se identifican los requerimientos que establece el municipio de Durango para obtener los permisos y licencias para la construcción del edificio.

Álbum fotográfico

Solución arquitectónica propuesta

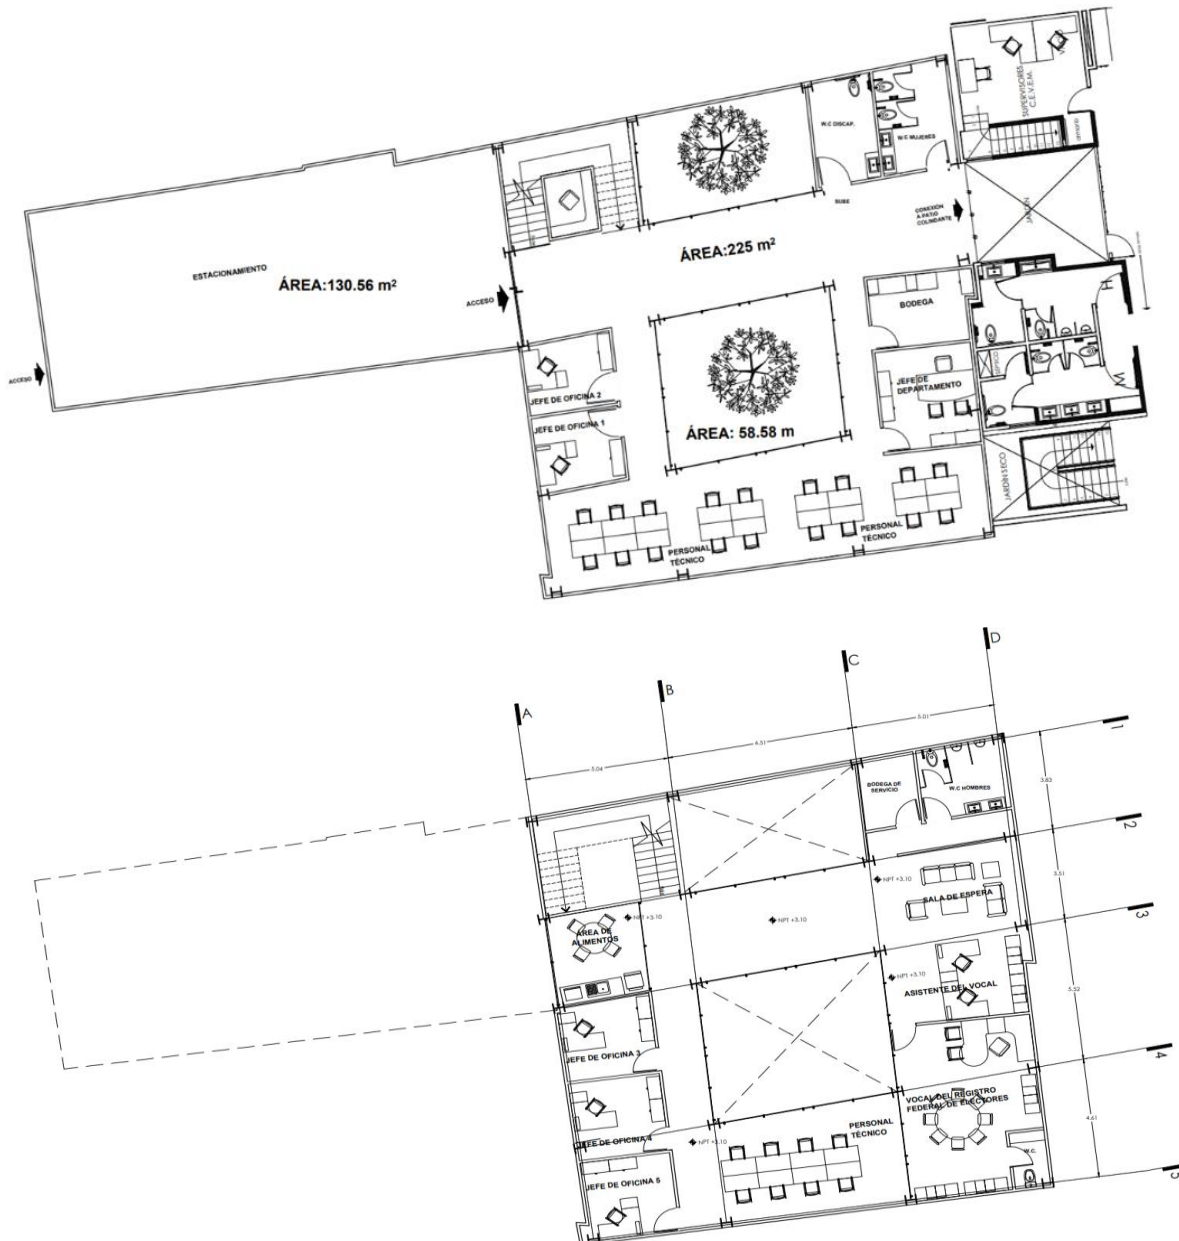

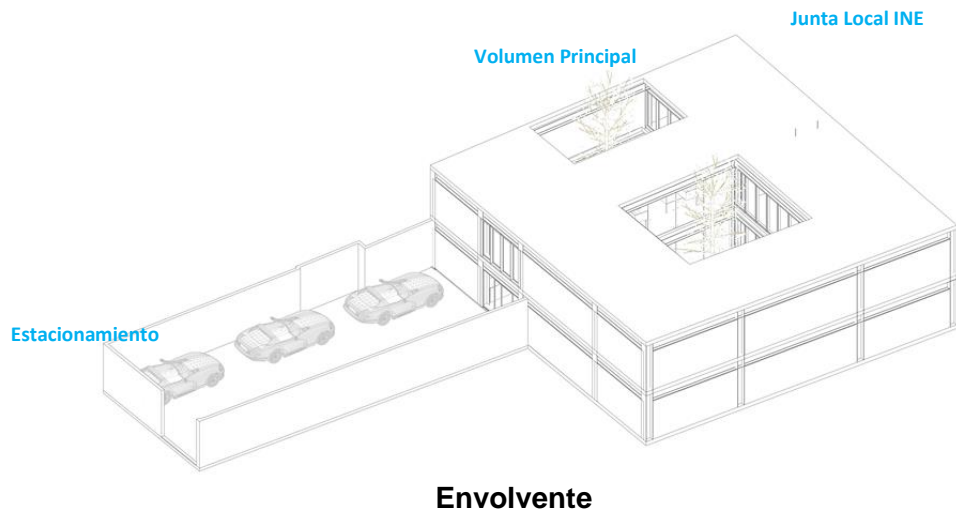**INFORME SOBRE LOS AVANCES DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA 2021-2023
 DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL**
Periodo julio a diciembre 2022


3. DESTINO, USO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS EROGADOS O COMPROMETIDOS.

En el marco del Programa de Infraestructura Inmobiliaria, actualmente se tienen siete Acuerdos que corresponden a los proyectos en proceso de ejecución autorizados en diversos ejercicios, como se detalla a continuación:

Entidad	Descripción	No. de Sesión y fecha	Importe		
			Autorizado	Total Pagado	Por ejercer
Zacatecas	Construcción del edificio sede para la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Zacatecas.	2a Sesión Extraordinaria 15/Junio/2018 1a Sesión Extraordinaria 06/Marzo/2019 3a Sesión Extraordinaria 15/Diciembre/2020 4a Sesión Extraordinaria 17/Diciembre/2021	\$138,900,000.00	\$120,207,381.96	\$18,692,618.04
Nuevo León	Construcción del edificio sede para la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Nuevo León.	1a Sesión Extraordinaria 30/Marzo/2020 1a Sesión Extraordinaria 20/Julio/2022	\$203,497,500.00	\$5,427,233.37	\$198,070,266.63
Ciudad de México	Trabajos de conservación y mantenimiento del Edificio de Acoxa. (Evaluación y dictamen estructural)	2a Sesión Extraordinaria 30/Julio/2021	\$5,000,000.00	\$2,145,513.20	\$2,854,486.80
Ciudad de México	Trabajos de conservación y mantenimiento para el conjunto Tlalpan.	1a Sesión Extraordinaria 30/Marzo/2020 1a Sesión Extraordinaria 23/Abril/2021	\$60,000,000.00	\$19,659,494.48	\$40,340,505.52
Hidalgo	Trabajos de conservación y mantenimiento para el Edificio del CECyRD.	3a Sesión Extraordinaria 08/Noviembre/2021	\$14,740,000.00	\$6,855,601.72	\$7,884,398.28
Ciudad de México	Trabajos de conservación y mantenimiento para el Edificio de Insurgentes.	3a Sesión Extraordinaria 08/Noviembre/2021	\$15,000,000.00	\$8,879,933.43	\$6,120,066.57
Durango	Contratación de los trabajos para la construcción del edificio contiguo a la sede de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Durango.	2a Sesión Extraordinaria 14/noviembre/2022	\$16,300,000.00	\$0.00	\$16,300,000.00
Total autorizado			\$453,437,500.00	\$163,175,158.16	\$290,262,341.84

INFORME SOBRE LOS AVANCES DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA 2021-2023
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Periodo julio a diciembre 2022

De los cuales, durante el segundo semestre de 2022, se concluyeron los proyectos que se detallan a continuación:

Entidad	Descripción	No. de Sesión y fecha	Importe	Estatus
Jalisco	Trabajos de mantenimiento y conservación del inmueble que ocupa la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Jalisco.	Primera Sesión Ordinaria 14/Febrero/2022	\$800,000.00	Concluido
Durango	Adquisición de un inmueble para la Junta Local Ejecutiva n el Estado de Durango	Cuarta Sesión Extraordinaria 17/Diciembre/2021	\$5,000,000.00	Concluido
Total autorizado			\$5,800,000.00	

Es de destacar que, en el marco del Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2021-2023 del Instituto Nacional Electoral, aprobado el 4 de noviembre de 2022, al 31 de diciembre de 2022, para el periodo 2022-2023 se autorizó se lleven a cabo diversas acciones en materia de infraestructura inmobiliaria por un monto inicial estimado de \$341,722,000.00 (Trescientos cuarenta y un millones setecientos veintidós mil pesos 00/100 M.N.), de los cuales al 31 de diciembre de 2022, se tiene comprometidos mediante un acuerdo de autorización recursos que se detallan a continuación:

Entidad	Descripción	No. de Sesión y fecha	Importe
			Autorizado
Durango	Contratación de los trabajos para la construcción del edificio contiguo a la sede de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Durango	2a Sesión Extraordinaria 14/noviembre/2022	\$16,300,000.00
Total autorizado			\$16,300,000.00

Resultando que al cierre del ejercicio 2022, se tenga un importe por comprometer de \$325,422,000 (Trecientos Veinticinco millones cuatrocientos veintidós mil pesos 00/100 M.N.) para atender los proyectos prioritarios que integran el Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2021 – 2023 del Instituto Nacional Electoral.
