

## **PRIMER INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL AVANCE EN LA INSTRUMENTACIÓN DE LA ENTREGA ELECTRÓNICA DE MATERIALES Y ÓRDENES DE TRANSMISIÓN**

### **ÍNDICE**

I. Antecedentes.....	1
II. Actividades programadas del 12 de agosto al 15 de octubre de 2015.....	2
III. Avances registrados en el periodo.....	3
III. 1. Resumen General.....	3
III. 2. Ajustes al sistema electrónico.....	5
III. 3. Proyección para la entrega electrónica de materiales y órdenes de transmisión para los Procesos Electorales Locales 2015-2016.....	6
IV. Actividades previstas para el próximo trimestre (del 16 de octubre de 2015 al 15 de enero de 2016).....	7
ANEXO 1. Sistema para la Recepción de Materiales de Radio y Televisión .....	10
ANEXO 2. Portal de Pautas para Medios de Comunicación.....	13

### **I. Antecedentes**

1. El Comité de Radio y Televisión acordó, en su sesión extraordinaria del 6 de agosto de 2015, presentar a la consideración del Consejo General, el proyecto de Acuerdo por el que se aprobaron los “Lineamientos aplicables a la entrega y recepción electrónica o satelital de las órdenes de transmisión y materiales”.

2. El Consejo General, mediante el acuerdo número INE/CG515/2015, del 12 de agosto de 2015, aprobó los “Lineamientos aplicables a la entrega y recepción electrónica o satelital de las órdenes de transmisión y materiales” y; conforme al numeral SEGUNDO del acuerdo citado, aprobó “el cronograma para la implementación del sistema de entrega y recepción electrónica o satelital de las órdenes de transmisión y materiales”.

3. En este sentido, el Artículo CUARTO Transitorio de los “Lineamientos aplicables a la entrega y recepción electrónica o satelital de las órdenes de transmisión y materiales” instruyó a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos a presentar

trimestralmente al Comité y al Consejo “informes detallando el avance en la instrumentación de la entrega electrónica de materiales y órdenes de transmisión”.

4. En virtud de lo anterior, y en cumplimiento a las actividades, plazos y responsables establecidos en el “cronograma para la implementación del sistema” aprobado, se presenta al Comité de Radio y Televisión el “PRIMER INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL AVANCE EN LA INSTRUMENTACIÓN DE LA ENTREGA ELECTRÓNICA DE MATERIALES Y ÓRDENES DE TRANSMISIÓN”.

## II. Actividades programadas del 12 de agosto al 15 de octubre de 2015.

Las actividades, plazos y responsables previstos del 12 de agosto al 15 de octubre de 2015, conforme al cronograma aprobado mediante el acuerdo número INE/CG515/2015, y su situación actual, se resumen en la siguiente tabla:

ACTIVIDADES	Plazos	Responsable	Situación actual
Desarrollo del Sistema Electrónico (primera fase)	A más tardar el 30 de agosto de 2015	DEPPP – UNICOM	Concluido
Desarrollo del Sistema Electrónico (segunda fase): entrega electrónica de estrategias de transmisión de partidos políticos y autoridades electorales.	A más tardar el 31 de diciembre de 2015	DEPPP – UNICOM	En proceso
Periodo de pruebas selectivas con juntas locales y distritales, partidos políticos, autoridades electorales y concesionarios de radio y televisión.	Del 1 de septiembre al 16 de octubre de 2015.	DEPPP – UNICOM	En proceso (Ver nota)
Periodo de pruebas selectivas con partidos políticos y autoridades electorales.	Del 1 de septiembre al 16 de octubre de 2015.	DEPPP – UNICOM	En proceso (Ver nota)
Ajustes finales al Sistema Electrónico.	Del 1 de septiembre al 30 de octubre de 2015.	DEPPP – UNICOM	En proceso
Aprobación del formato de archivo electrónico y sus especificaciones para los materiales (Acuerdo de términos y condiciones para la entrega de materiales).	A más tardar el 30 de octubre	CRYT - DEPPP	En proceso (Se presenta proyecto de acuerdo al CRyT)
Publicación, en el portal del INE, de las características mínimas del equipo y de la conexión a internet para el uso óptimo del sistema electrónico.	A más tardar el 30 de octubre de 2015.	DEPPP	En proceso (Se presenta proyecto de acuerdo al CRyT)
Informes trimestrales al Comité y al Consejo sobre el avance en la instrumentación de la entrega electrónica de materiales y órdenes de transmisión.	Octubre de 2015, y enero, abril y julio de 2016.	DEPPP	En proceso (Se presenta primer informe trimestral)

NOTA: Para asegurar su óptimo aprovechamiento, en el Cronograma autorizado se previó que las actividades de prueba, notificación de usuario y contraseña, e inducción y capacitación podrían realizarse en fechas más próximas a los plazos establecidos por las autoridades electorales locales para el acceso de los partidos a los tiempos en radio y televisión durante las precampañas. Por tanto, para las elecciones locales en Durango estas actividades se realizaran en las fechas más próximas al inicio de las precampañas que establezca su calendario electoral.

### **III. Avances registrados en el periodo.**

Este apartado tiene por objeto dar cuenta de los avances en la instrumentación de la entrega electrónica de materiales y órdenes de transmisión a partir de la aprobación de los lineamientos aplicables, aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante el acuerdo INE/CG515/2015.

Se describen las actividades realizadas por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, en colaboración con la Unidad Técnica de Servicios de Informática y la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, conforme han sido programadas en el cronograma de instrumentación para el periodo comprendido entre el 12 de agosto y el 15 de octubre de 2015.

Se integra por los siguientes rubros:

1. Resumen general
2. Ajustes al Sistema electrónico, octubre-noviembre
3. Proyección para la entrega electrónica de materiales y órdenes de transmisión para Procesos Electorales Locales 2015-2016

#### **III. 1. Resumen General**

##### *a) Desarrollo del Sistema electrónico (primera fase).*

La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPPP) en conjunto con la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UNICOM) concluyeron el desarrollo de la primera fase del sistema electrónico para la recepción de materiales de los partidos políticos y autoridades electorales; y para la entrega de órdenes de transmisión y puesta a disposición de materiales a los concesionarios de radio y televisión. Entre otras, destacan las siguientes actividades:

- Revisión del sistema electrónico y módulos.
- Mejora al diseño y presentación de la información de las órdenes de transmisión y los materiales.
- Incorporación de un calendario para ubicar las próximas órdenes de transmisión.
- Mejora al formato de pantallas, textos y mensajes de la información en el sistema.
- Corrección a la función de carga de información a pautas.
- Optimización en la publicación de las órdenes de transmisión.
- Ajuste a filtros de búsqueda de información en el sistema.
- Vinculación de la recepción de materiales con el dictamen técnico.
- Integración de las órdenes de transmisión para su publicación en el portal de pautas para medios de comunicación.

*b) Licitación para contratación de servicios de carga, alojamiento y descarga de materiales de audio, video y datos*

Para optimizar la operación del sistema electrónico, se tomó la determinación de contratar servicios de carga, alojamiento y descarga de materiales de audio, video y datos. Con ese objetivo, el 6 de octubre se publicó en el portal del INE la convocatoria de la Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-047/2015, y el 8 de octubre en el Diario Oficial de la Federación.

Conforme al calendario previsto en la convocatoria, la junta de aclaraciones se realizó el 12 de octubre con la participación de tres empresas. La apertura de propuesta está prevista para el 19 de octubre, momento en el que se dará a conocer la fecha del acto de fallo.

Cabe señalar que, conforme a lo previsto en los Lineamientos aplicables a la entrega y recepción electrónica o satelital de las órdenes de transmisión y materiales, los servicios deben estar operando a partir del 1º de noviembre de 2015, por lo que se requiere que el fallo sea durante el mes de octubre. Lo anterior, para dar cumplimiento a los artículos segundo y tercero transitorios del Reglamento en Materia de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral, en los que se establece que la recepción y entrega de materiales de radio y televisión se realicen de manera electrónica a partir de los procesos electorales locales cuya jornada comicial sea en 2016.

*c) Línea telefónica nacional*

Se han realizado diversas reuniones de trabajo entre la DEPPP y la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE) para habilitar una línea telefónica nacional de orientación y soporte técnico para la entrega y recepción electrónica o satelital de las órdenes de transmisión y materiales. Como resultado, se enlistan los siguientes avances:

- La atención telefónica se realizará a través del Centro de Atención Ciudadana INEtel. El menú telefónico contará con una opción y un submenú que se hará del conocimiento de los usuarios del sistema para limitar el campo de atención.
- Los consultores del centro telefónico iniciaron su capacitación a partir de septiembre para brindar servicios informativos, normativos, registrar quejas, reconocimientos (observaciones) y canalizar las solicitudes de soporte técnico al área correspondiente, de conformidad al siguiente catálogo de servicios.

**Catálogo de servicios**

**Sistema electrónico para la entrega y recepción de materiales y órdenes de transmisión (primera fase)**

Evento	Servicio	Categoría
Registro y dictaminación de promocionales	Quejas	Registro para informe
	Reconocimientos	Registro para informe
	Solicitud de información	Implementación del sistema
		Normatividad

Evento	Servicio	Categoría
		Control de calidad
	Soporte técnico	Acceso al sistema
		Otros
	Sugerencias	Registro para informe
<b>Notificación de OT a concesionarios</b>	Quejas	Registro para informe
	Reconocimientos	Registro para informe
	Solicitud de información	Implementación del sistema
		Normatividad
	Soporte técnico	Acceso al sistema
		Otros
Sugerencias	Registro para informe	

- El Centro de atención ciudadana INEtel pondrá a disposición su personal propio para atención telefónica de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Adicionalmente, el Centro de Atención a Usuarios (CAU), estará disponible de lunes a viernes de 9 a 19 horas y sábado de 9 a 16 horas.

A partir del 1 de noviembre de 2015, se contratarán dos técnicos en informática que apoyarán a INEtel y CAU para proporcionar soporte técnico a los sujetos obligados en las diversas funcionalidades del Sistema Electrónico, así como para recibir reportes de fallas técnicas y/o suspensión temporal del servicio de internet.

- Adicionalmente, las Direcciones Ejecutivas trabajan en las actividades complementarias que permitirán contar con un protocolo de atención, listado de preguntas frecuentes y una plataforma de gestión que consentirá exportar información y generación de informes.

### III. 2. Ajustes al sistema electrónico.

*a) Periodo de pruebas selectivas con juntas locales y distritales, partidos políticos, autoridades electorales y concesionarios de radio y televisión.*

Durante el mes de octubre y noviembre se realizarán las pruebas selectivas del sistema electrónico con el personal de las juntas locales y distritales, los partidos políticos, las autoridades electorales y los concesionarios de radio y televisión. Lo anterior, a fin de asegurar el funcionamiento óptimo del sistema en condiciones de operación real y recabar observaciones para detectar oportunidades de mejora en el sistema.

Adicionalmente, se prevé que se realizarán ajustes en:

- Los formatos de correos electrónicos que se enviarán para los proceso de firma electrónica.
- El Manual de uso del sistema.

- La Guía de configuración de los equipos donde se descargarán las ordenes de transmisión.
- La migración de la información de los periodos actuales de pautas y materiales con dictamen óptimo relacionados a las órdenes de transmisión.

Por otra parte, la UNICOM se encuentra implementando la firma electrónica en la etapa de notificación de diversos procesos relacionados con la recepción y entrega electrónica de materiales y órdenes de transmisión. La firma electrónica es un requisito fundamental para garantizar la legalidad y certeza de los actos derivados de este proceso.

La firma electrónica se implementará en los siguientes procesos:

- Dictamen técnico de materiales registrados electrónicamente.
- Puesta a disposición de las órdenes de transmisión a los concesionarios de radio y televisión.

*b) Capacitación para usuarios.*

La capacitación a usuarios del sistema electrónico (primera fase) se realizará durante noviembre en las entidades federativas que están próximas a iniciar sus precampañas (Durango y Zacatecas), seguidas de las entidades restantes (Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz) conforme a los calendarios que apruebe el Comité de Radio y Televisión.

*c) Liberación del Sistema Electrónico.*

La DEPPP acordó con UNICOM liberar el sistema electrónico (primera fase) para realizar las pruebas selectivas con los partidos políticos y concesionarios de radio y televisión, a más tardar el 30 de octubre. De este modo, se dispondrá del mes de noviembre para realizar la capacitación a los usuarios.

### **III. 3. Proyección para la entrega electrónica de materiales y órdenes de transmisión para los Procesos Electorales Locales 2015-2016.**

Para asegurar una adecuada instrumentación del sistema electrónico para la recepción y entrega electrónica de materiales de radio y televisión, se prevé que en las próximas semanas se realicen las siguientes actividades:

- Los formatos de correo electrónico se integrarán al proceso de firma electrónica.

- Se invitará al personal de juntas locales y distritales, partidos políticos, autoridades electorales y concesionarios de radio y televisión a las pruebas selectivas del sistema electrónico y se generarán los ajustes necesarios.
- Se liberará el sistema electrónico.
- Se iniciará la capacitación a partidos políticos, autoridades electorales y concesionarios de radio y televisión en el estado de Durango.

El listado completo de actividades previstas en el cronograma autorizado para el próximo trimestre se muestra en el siguiente apartado.

#### IV. Actividades previstas para el próximo trimestre (del 16 de octubre de 2015 al 15 de enero de 2016)

Las actividades, plazos y responsables previstos del 16 de octubre de 2015 al 15 de enero de 2016, conforme al cronograma aprobado mediante el acuerdo número INE/CG515/2015, y su situación actual, se resumen en la siguiente tabla:

ACTIVIDADES	Plazos	Responsable	Situación actual
Habilitación de la Línea Telefónica Nacional de soporte técnico.	Al momento de la publicación en el portal del INE de las características mínimas.	DEPPP	En proceso
Capacitación de operadores de la Línea Telefónica Nacional.	A más tardar la semana previa a la apertura de la Línea Telefónica Nacional	DEPPP	En proceso
Notificación a los concesionarios de su nombre de usuario y contraseña para ingresar al Sistema Electrónico.	A partir del 30 de octubre de 2015	DEPPP	En proceso
Presentación de solicitudes de excepción de concesionarios que no dispongan de equipo de cómputo y/o de conexión a internet con las características mínimas.	Hasta cinco días hábiles después de la recepción de la clave de usuario y contraseña.	Concesionarios	Estas actividades se realizarán a partir de la notificación a concesionarios.  La DEPPP se encuentra preparada para su correcta instrumentación.
Valoración y confirmación de las solicitudes de excepción.	Hasta cinco días hábiles después de la recepción de la solicitud de excepción.	DEPPP	
Registro de concesionarios en el Sistema Electrónico.	Hasta cinco días hábiles después de la recepción de la clave de usuario y contraseña.	Concesionarios	
Solicitud de un mayor número de usuarios para ingresar al Sistema Electrónico.	En cualquier momento, a partir de la recepción de la clave de usuario y contraseña.	Concesionarios	

ACTIVIDADES	Plazos	Responsable	Situación actual
Solicitud de los concesionarios que opten por la puesta a disposición de los materiales de forma satelital.	Hasta cinco días hábiles después de la recepción de la clave de usuario y contraseña.	Concesionarios	
Verificación de los equipos y pruebas de transmisión satelital.	Hasta cinco días hábiles después de la recepción de la solicitud de los concesionarios.	DEPPP	
Capacitación para usuarios que opten por la transmisión satelital de los materiales.	Entre el 2 y el 30 de noviembre de 2015	DEPPP - UNICOM	
Notificación a los partidos políticos y autoridades electorales de su nombre de usuario y contraseña para ingresar al Sistema Electrónico.	A partir del 30 de octubre de 2015	DEPPP	En proceso
Solicitud de un mayor número de usuarios para ingresar al Sistema Electrónico.	En cualquier momento, a partir de la recepción de la clave de usuario y contraseña.	Partidos y autoridades	Esta actividad se realizará a partir de la notificación a usuarios.  La DEPPP se encuentra preparada para su correcta instrumentación.
Jornadas de inducción a los Lineamientos y capacitación en el uso del Sistema Electrónico para concesionarios de radio y televisión.	Entre el 2 y el 30 de noviembre de 2015	DEPPP - UNICOM	Estas actividades se realizarán en las fechas más próximas al inicio de precampañas.  La DEPPP se encuentra preparada para su correcta instrumentación.
Jornadas de inducción a los Lineamientos y capacitación en el uso del Sistema Electrónico para partidos políticos y autoridades electorales.	Entre el 2 y el 30 de noviembre de 2015	DEPPP - UNICOM	
Aprobación de las pautas para la transmisión de los mensajes de los partidos políticos y candidatos/as independientes en los procesos electorales locales 2016,	Sujetas a los calendarios electorales locales.	CRYT	En proceso
Inicio del periodo de precampaña de los procesos electorales locales en Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas	Sujetas a los calendarios electorales locales.	OPLES	Depende de los procesos internos de los OPLES.

ACTIVIDADES	Plazos	Responsable	Situación actual
Entrega, a través del sistema electrónico, de los materiales de radio y televisión para su dictamen técnico y pautado por parte de la DEPPP.	A más tardar una semana antes del inicio de las precampañas.	Partidos y autoridades	En proceso
Entrega de OT y puesta a disposición de materiales en el sistema electrónico para los concesionarios de radio y tv.	En los plazos legales establecidos previos al inicio de su transmisión.	DEPPP	

## ANEXO 1

### SISTEMA PARA LA RECEPCIÓN DE MATERIALES DE RADIO Y TELEVISIÓN DIRECCION EJECUTIVA DE PERROGATIVAS Y PARTIDOS POLITICOS

#### ➤ Recepción de Materiales de Radio y Televisión

En este módulo del Sistema Electrónico los actores políticos entregarán al Instituto sus materiales. La DEPPP hará la validación técnica del material de audio o video previo a su asignación en las órdenes de transmisión.

El primera paso será entrar al Sistema, con el nombre de usuario y la contraseña asignados (Pantalla 1).

#### Pantalla 1



The screenshot shows a web interface for the 'Sistema para la Recepción de Materiales de Radio y Televisión'. At the top left, there is a logo with a computer monitor and a CD, labeled 'Recepción de materiales'. The main title of the system is displayed in the center. Below the title, the user is prompted to log in using their institutional email account. A note states 'Todos los campos son requeridos'. The login form includes three input fields: 'Nombre de usuario:', 'Contraseña:', and 'Código de seguridad:'. The 'Código de seguridad:' field contains a CAPTCHA image with the text '5cpwpe'. An 'Aceptar' button is located below the input fields. At the bottom of the page, there is a footer with the INE logo, system version information ('Sistema para la Recepción de Materiales de Radio y Televisión 4.0'), compatibility information ('Compatibilidad óptima con Google Chrome'), and copyright notice ('© Derechos Reservados, Instituto Nacional Electoral'). On the right side of the footer, there are links for 'Centro de Ayuda', 'CAU', and 'Aviso de protección de datos'.

Posteriormente, se abrirá un menú con dos opciones: Materiales o Histórico (Pantalla 2).


### Pantalla 2



The screenshot shows a web application interface. At the top right, there is a user greeting 'Hola MORALES PUENTE ARIADNA' and a 'Cerrar Sesión' button. The main header contains the INE logo and the title 'Sistema para la Recepción de Materiales de Radio y Televisión'. Below the header is a navigation bar with 'Materiales' (selected) and 'Histórico' tabs. The main content area displays 'Periodo de operación' as 'Permanente' and 'Área responsable' as 'DEPPP'. A descriptive paragraph explains the system's purpose. To the right, there is a section for 'Sistemas relacionados' listing 'Sistema de Pautas, Control y Seguimiento de Materiales'. The footer includes the INE logo, system version '4.0', compatibility with Google Chrome, and copyright information.

En la opción de Materiales se registrarán los datos referentes a los materiales a capturar (Pantalla 3).

### Pantalla 3

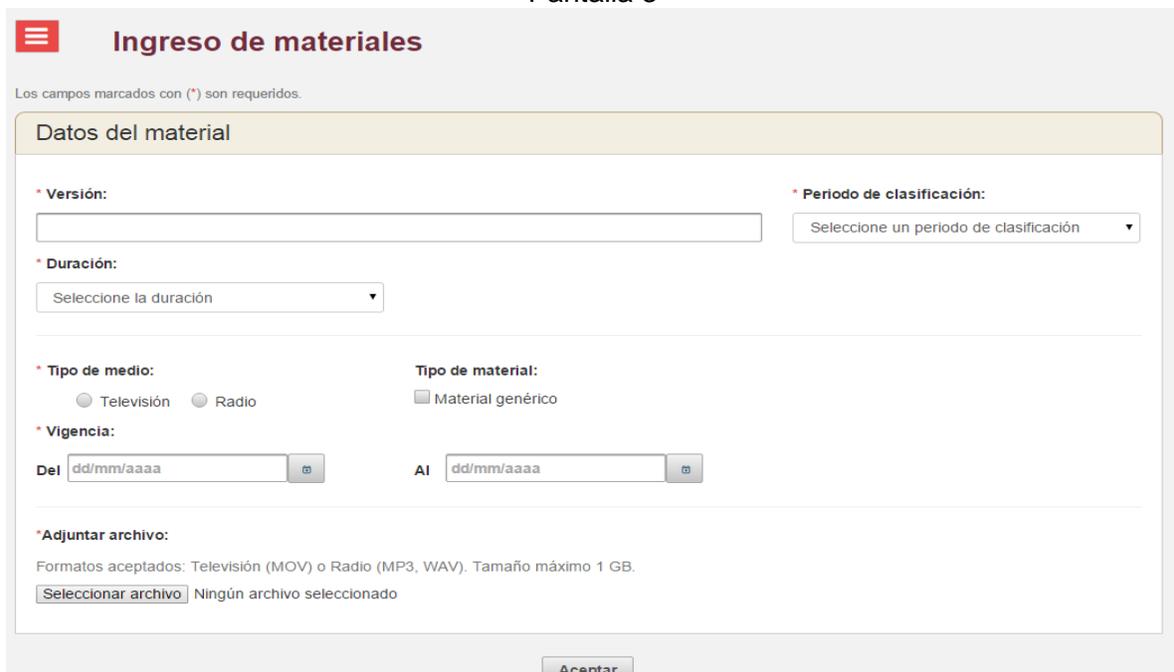

The screenshot shows a form titled 'Ingreso de materiales'. It includes a note: 'Los campos marcados con (\*) son requeridos.' The form is divided into sections: 'Datos del material', 'Versión' (text input), 'Periodo de clasificación' (dropdown menu), 'Duración' (dropdown menu), 'Tipo de medio' (radio buttons for 'Televisión' and 'Radio'), 'Tipo de material' (checkbox for 'Material genérico'), 'Vigencia' (date range 'Del' and 'Al' with calendar icons), and 'Adjuntar archivo' (file selection button). A note specifies accepted formats: 'Formatos aceptados: Televisión (MOV) o Radio (MP3, WAV). Tamaño máximo 1 GB.' The form ends with an 'Aceptar' button.

Por último, la opción de Histórico muestra los registros capturados por los actores políticos en donde descargaran el dictamen de la validación técnica del material de audio o video (Pantalla 4).

### Pantalla 4

☰

## Histórico de movimientos

Los campos marcados con (\*) son requeridos.

### Búsqueda

**Ámbito:**

**Estatus del material:**

**Periodo de consulta:**

Del  al

**Versión:**

### Resultado

(\*\*) Indica que es un material de reingreso.

Página: 1 de 4    1 2 3 4    15

Fecha y hora de recepción	Versión	Tipo medio	Nombre archivo	Folio	Estatus Material	Descargar dictamen control calidad
23/10/2015 13:34	PRUEBA PRD 23102015	TELEVISIÓN	RV00757-14.mov	**RV00040-15	ÓPTIMO	
23/10/2015 13:34	PRUEBA PRD 23102015	TELEVISIÓN	RV00757-14.mov	**RV00040-15	ÓPTIMO	
23/10/2015 13:25	PRUEBA PRD 23102015	TELEVISIÓN	RV00757-14.mov	RV00040-15	NO ÓPTIMO	
23/10/2015 12:33	Prueba calidad 8	TELEVISIÓN	Video.mov	RV00039-15	SIN DICTAMEN	
23/10/2015 12:03	PRUEBA CALIDAD 7	TELEVISIÓN	Video.mov	RV00038-15	SIN DICTAMEN	
22/10/2015 20:14	Prueba calidad 6	TELEVISIÓN	Video.mov	RV00036-15	SIN DICTAMEN	
22/10/2015 20:03	Material de Prueba	TELEVISIÓN	Video.mov	RV00035-15	SIN DICTAMEN	
22/10/2015 19:34	PRUEBA_CALIDAD	TELEVISIÓN	Video.mov	RV00030-15	SIN DICTAMEN	
22/10/2015 19:15	PRUEBA TEE NE R 2	RADIO	RA02518-15 IEPC BC 20 Años IEPC Baja California.wav	RA00025-15	SIN DICTAMEN	
22/10/2015 19:14	PRUEBA IEE NE R 2	RADIO	RA03124-15 INE NACIONAL YO SI V1 CHIAPAS.mp3	RA00024-15	SIN DICTAMEN	
22/10/2015 19:12	PRUEBA INE NE 4	RADIO	RA01302-15 IEM Michoacan Haz la diferencia V1.wav	RA00023-15	SIN DICTAMEN	

Descargar los resultados de la búsqueda:

## ANEXO 2

### PORTAL DE PAUTAS PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIRECCION EJECUTIVA DE PERROGATIVAS Y PARTIDOS POLITICOS

#### ➤ Portal de Pautas para Medios de Comunicación

En este módulo del Sistema Electrónico, los medios de comunicación recibirán vía internet las órdenes de transmisión y descargarán los materiales. Podrán consultar exclusivamente las órdenes de transmisión y materiales que les corresponden.

En el primera paso, deberán ingresar al Sistema con el nombre de usuario y la contraseña asignados (Pantalla 1).

#### Pantalla 1

[Regresar](#) [Ayuda](#) [Página del INE](#) Folio:

 **Pautas para medios de comunicación** 

**Acceso para medios de comunicación**

### Inicia sesión

Si eres un medio de comunicación [catalogado](#), utiliza tu usuario y contraseña para iniciar sesión.

Usuario:

Contraseña:

Código de seguridad: **1oppuz**  
Escribe el texto que se muestra en la imagen:

Si tienes problemas para acceder, llama a INETEL 01800 433 4357  
Las Pautas para Medios de Comunicación se rigen conforme al Acuerdo [INE/CG515/2015](#).

Una vez que ingresan, se despliegan las opciones de consulta para las órdenes de transmisión o materiales, por cada medio de comunicación específico (pantalla 2).

## Pantalla 2

[Cerrar Sesión](#) [Hola! vanessaheor.ext](#) [Ayuda](#) [Página del INE](#) Folio:

 **Pautas para medios de comunicación** 

**Acceso para medios de comunicación**

Elige un medio de comunicación

Grupo: GRUPO ACIR

Entidad:

Tipo de medio:

Medio:

Posteriormente, podrán descargar las órdenes de transmisión (Pantalla 3) y los materiales vigentes (Pantalla 4).

### Pantalla 3

Vigentes
Históricos
Bitácora

○ Órdenes de transmisión
● Materiales asignados

Búsqueda / GRUPO ACIR / Seleccione

[Regresar](#)

Seleccione un medio para mostrar el calendario.

**Nota** La selección del medio no afecta el resultado de la búsqueda.

#### Materiales asignados vigentes

#### Resultados de la búsqueda

No.	Inicio versión	Fin versión	Tipo de periodo	Periodo	Versión	Nombre del archivo	Descarga Formato	Zip
<a href="#">Descargar todas las ordenes</a>								
Órdenes del 17/01/2016 al 21/01/2016								
1	17/01/2016	21/01/2016	ELECTORAL	NO COINCIDENTE ( 10/01/2016 - 07/06/2016 )	8 . 2	E_AGS_F_NC_170116_210116_R_AGS_2537_XHDC-FM_H_8_2.xlsx	<a href="#">XLSX</a>	<a href="#">ZIP</a>
2	17/01/2016	21/01/2016	ELECTORAL	NO COINCIDENTE ( 10/01/2016 - 07/06/2016 )	8 . 2	E_AGS_F_NC_170116_210116_R_AGS_59_XEDC-FM_H_8_2.xlsx	<a href="#">XLSX</a>	<a href="#">ZIP</a>

### Pantalla 4

Vigentes
Históricos
Bitácora

○ Órdenes de transmisión
● Materiales asignados

Búsqueda / GRUPO ACIR / Seleccione

[Regresar](#)

Seleccione un medio para mostrar el calendario.

Seleccione

**Nota** La selección del medio no afecta el resultado de la búsqueda.

Medios pertenecientes al grupo incluidos en las Ordenes de Transmisión

XHDC-FM, XEDC-AM

[Descargar todos los materiales](#)

Actor	Folio	Descarga Formato	Ámbito del actor	Versión	Duración	Estatus
	RA00001-15	<a href="#">MP3</a>	NACIONAL	SOCIALMENTE BIEN	30 SEGS.	Descargado
C.I.	RA00002-15	<a href="#">MP3</a>	NACIONAL	INDEPENDIENTEMENTE BIEN	30 SEGS.	Descargado
	RA00023-15	<a href="#">MP3</a>	NACIONAL	NO MAS VIOLENCIA	30 SEGS.	Descargado

Además, podrán consultar, en la opción de Históricos, las órdenes de transmisión (Pantalla 5) o materiales asignados previamente (Pantalla 6).

### Pantalla 5

Vigentes      **Históricos**      Bitácora

○ Órdenes de transmisión      ● Materiales asignados

[Regresar](#)

Los datos con (\*) son requeridos.

\*Vigencia de la orden:   al

### Pantalla 6

Vigentes      **Históricos**      Bitácora

● Órdenes de transmisión      ○ Materiales asignados

Búsqueda / GRUPO ACIR

[Regresar](#)

Los datos marcados con (\*) son requeridos (Si el campo de "Folio" es ingresado no es necesario llenar los otros campos requeridos).

Puedes elegir una o más opciones

\*Folio:

\*Vigencia del material: del   al

Entidad Federativa:

Actor:

Duración:

Versión:

\* Medio:

Una vez que se especifican las opciones de búsqueda anteriores, se muestra el resultado de los datos históricos de órdenes de transmisión (Pantalla 7) o materiales (Pantalla 8).

### Pantalla 7

Vigentes	<b>Históricos</b>	Bitácora
<input type="radio"/> Órdenes de transmisión	<input checked="" type="radio"/> Materiales asignados	

[Regresar](#)

#### Vigencia de la orden:

01/01/2015 al 31/12/2015

No.	Inicio versión	Fin versión	Tipo de periodo	Periodo	Versión	Nombre del archivo
1	12/10/2015	16/10/2015	ELECTORAL	NO COINCIDENTE (14/09/2015 - 07/06/2016)	4.0	E_GTO_L_NC_121015_161015_T_GTO_2330_XHOPLA-TV_H_4_0.xlsx <a href="#">Descargar archivo</a>
2	05/10/2015	09/10/2015	ELECTORAL	NO COINCIDENTE (14/09/2015 - 07/06/2016)	3.1	E_GTO_L_NC_051015_091015_T_GTO_2330_XHOPLA-TV_H_3_1.xlsx <a href="#">Descargar archivo</a>
3	12/10/2015	16/10/2015	ELECTORAL	NO COINCIDENTE (14/09/2015 - 07/06/2016)	3.0	E_GTO_L_NC_121015_161015_T_GTO_2330_XHOPLA-TV_H_3_0.xlsx <a href="#">Descargar archivo</a>
4	10/10/2015	11/10/2015	ELECTORAL	NO COINCIDENTE (14/09/2015 - 07/06/2016)	2.0	E_GTO_L_NC_101015_111015_T_GTO_2330_XHOPLA-TV_H_2_0.xlsx <a href="#">Descargar archivo</a>
5	05/10/2015	09/10/2015	ELECTORAL	NO COINCIDENTE (14/09/2015 - 07/06/2016)	1.0	E_GTO_L_NC_051015_091015_T_GTO_2330_XHOPLA-TV_H_1_0.xlsx <a href="#">Descargar archivo</a>

### Pantalla 8

Vigentes	<b>Históricos</b>	Bitácora
<input checked="" type="radio"/> Órdenes de transmisión	<input type="radio"/> Materiales asignados	

[Regresar](#)

#### Materiales asignados

#### CrITERIOS de búsqueda

Vigencia del material: 01/01/2015 al 31/12/2015

Entidad Federativa: TODAS

Actor: TODOS

Duración: TODAS

Actor	Folio	Descarga / Formato	Ámbito del actor	Versión	Duración
	RV00027-15	<a href="#">MP4</a>	SAN LUIS POTOSI	PRUEBA PRI 4	30 SEGS.
	RV00022-15	<a href="#">MP4</a>	GUANAJUATO	QUEREMOS VOZ TU VOZ	30 SEGS.

Por último, se cuenta con una sección de Bitácora (Pantalla 9) que muestra las acciones realizadas en el Sistema Electrónico: si el acceso al sistema fue correcto, el estatus de descarga de la orden de transmisión o el estatus de descarga del material.

### Pantalla 9

Vigentes
Históricos
Bitácora

○ Bitácora del usuario
● Bitácora de usuarios del medio o grupo

Búsqueda / GRUPO ACIR / Seleccione

[Regresar](#)

23/10/2015

No.	Fecha y hora	Usuario	Movimiento	Periodo/Folio <sup>1</sup>	Hash code acuse	Acuse <sup>2</sup>	Estatus
1	23/10/2015 14:02:00	vanessaheor.ext	Acceso				Éxito
2	23/10/2015 13:57:02	vanessaheor.ext	Acceso				Éxito
3	23/10/2015 13:45:26	vanessaheor.ext	Acceso				Contraseña incorrecta
4	23/10/2015 13:35:38	vanessaheor.ext	Acceso				Contraseña incorrecta
5	23/10/2015 13:35:05	vanessaheor.ext	Acceso				Contraseña incorrecta
6	23/10/2015 13:34:49	vanessaheor.ext	Acceso				Contraseña incorrecta
7	23/10/2015 13:34:38	vanessaheor.ext	Acceso				Contraseña incorrecta

12/10/2015

No.	Fecha y hora	Usuario	Movimiento	Periodo/Folio <sup>1</sup>	Hash code acuse	Acuse <sup>2</sup>	Estatus
8	12/10/2015 11:27:50	vanessaheor.ext	Acceso				Contraseña incorrecta

06/10/2015

No.	Fecha y hora	Usuario	Movimiento	Periodo/Folio <sup>1</sup>	Hash code acuse	Acuse <sup>2</sup>	Estatus
9	06/10/2015 13:09:08	vanessaheor.ext	Descarga de materiales nuevos	RA00023-15			Descarga incompleta
10	06/10/2015 13:06:33	vanessaheor.ext	Descarga de materiales nuevos	8	+gBwAqY+6Qees1ycV5Abmh4OM7M	<a href="#">PDF</a>	Éxito
11	06/10/2015 13:05:25	vanessaheor.ext	Descarga de materiales nuevos	RA00001-15	nECb2MHCaiAEwJlJaDBVsshFNL0	<a href="#">PDF</a>	Éxito
12	06/10/2015 13:04:20	vanessaheor.ext	Acceso				Éxito
