



**2020-2021** **PIyCPEF**  
Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal

**Primer Informe parcial del Plan  
Integral y Calendario del Proceso  
Electoral Federal 2020-2021**

**Actividades correspondientes al  
periodo del 23/09/2020 al 09/10/2020**

## Índice de contenido

Introducción .....	2
1. Análisis cuantitativo.....	3
1.1. Actividades concluidas, totales y por UR. ....	3
1.1.1. Número de actividades concluidas en tiempo .....	4
1.1.2. Número de actividades concluidas fuera de tiempo .....	4
1.2. Actividades en ejecución, totales y por UR. ....	5
1.2.1. Número de actividades en tiempo .....	6
1.2.2. Número de actividades retrasadas.....	6
1.2.3 Número de actividades desfasadas.....	8
1.3. Actividades próximas a concluir, totales y por UR.....	9
1.4. Actividades por iniciar, totales y por UR.....	9
1.5. Inconvenientes, totales y por UR .....	9
2. Análisis cualitativo.....	10
3. Consideraciones finales .....	12
ANEXO 1 .....	12
ANEXO 2 .....	20

## **Primer Informe parcial del Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021. Actividades correspondientes al periodo del 23/09/2020 al 09/10/2020**

### **Introducción**

El 26 de agosto de 2020, previo al inicio del Proceso Electoral Federal 2020-2021, el Consejo General del Instituto Nacional Electora (INE), mediante Acuerdo INE/CG218/2020, aprobó el Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal (PlyCPEF) 2020-2021, a propuesta de la Junta General Ejecutiva (JGE), cuyo calendario se conforma de 617 actividades a cargo de las diferentes Unidades Responsables (UR) del Instituto.

En cumplimiento del punto Segundo del referido acuerdo, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), presentó a las y los integrantes de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, el pasado 23 de septiembre, la metodología para el Seguimiento al Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021, que permitirá llevar el control y seguimiento de las actividades; así como la presentación los informes correspondientes ante el Consejo General del Instituto.


En dicha metodología se establece que la DEOE elaborará informes mensuales con las actividades del PlyCPEF concluidas, en ejecución (en tiempo, retrasadas y desfasadas), actividades próximas a concluir y por iniciar en el periodo inmediato siguiente, para su presentación a los integrantes de la Comisión y, posteriormente, al Consejo General, con la información que reporten las UR sobre sus avances en la plataforma *Sharepoint* de manera semanal. La primera captura del avance de cada una de las actividades iniciadas se llevó a cabo con corte al 2 de octubre, en la herramienta informática diseñada para tal fin.

El informe que se presenta se elaboró con información reportada en la base de datos por las Unidades Responsables con corte al 9 de octubre.

## Actividades correspondientes al periodo del 23/09/2020 al 09/10/2020

### 1. Análisis cuantitativo

El PlyCPEF 2020-2021 se aprobó con un total de 617 actividades, cuyo avance general es el siguiente:

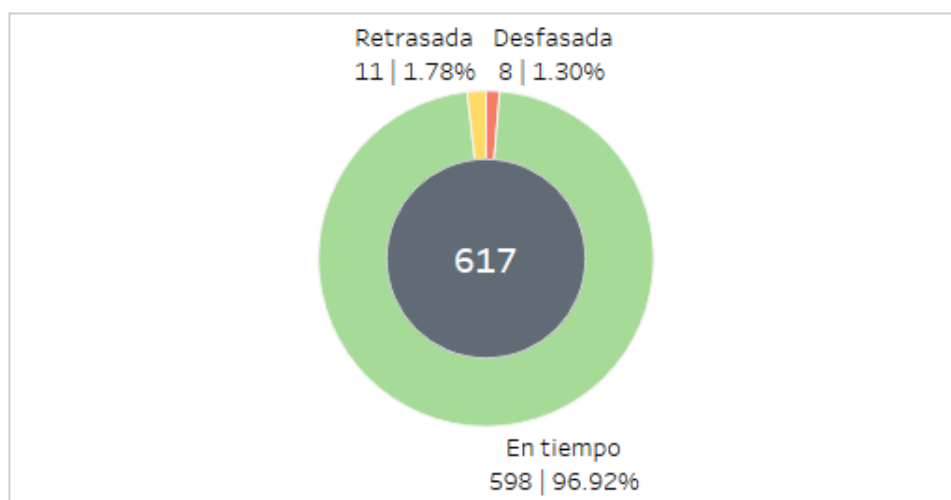

#### 1.1. Actividades concluidas, totales y por UR.


De las 617 actividades que integran el PlyCPEF 2020-2021, se han concluido 72 actividades, lo que representa 11.67 por ciento del total de actividades programadas. El desglose por UR se detalla en el Cuadro 1.

**Cuadro 1. Distribución del número de actividades concluidas, por UR**

Unidad Responsable	Total	CAI	DECEYEC	DEOE	DEPPP	DERFE	DESPEN	UTSI	UTYPDP
Actividades concluidas	72	2	6	18	19	3	7	16	1

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento (DPS) de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), con base en información proporcionada por las UR, al 9 de octubre de 2020.

**Gráfica 1. Distribución del número de actividades concluidas, por UR**

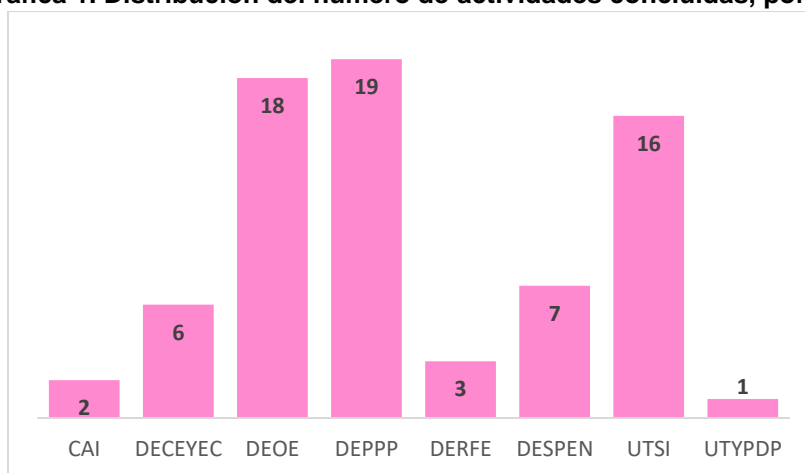

### 1.1.1. Número de actividades concluidas en tiempo

Las 72 actividades concluidas se cumplieron en los plazos establecidos. En el cuadro 2 se observa el número de actividades concluidas en tiempo por UR.

**Cuadro 2. Total de actividades concluidas en tiempo por UR**

Unidad Responsable	Total	CAI	DECEYEC	DEOE	DEPPP	DERFE	DESPEN	UTSI	UTYPDP
Actividades concluidas en tiempo	72	2	6	18	19	3	7	16	1

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento (DPS) de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), con base en información proporcionada por las UR, al 9 de octubre de 2020.

### 1.1.2. Número de actividades concluidas fuera de tiempo

De las 72 actividades concluidas, ninguna se reportó fuera de los tiempos establecidos. En el cuadro 3, se presentan el número de actividades concluidas fuera de tiempo por UR.

**Cuadro 3. Distribución del número de actividades concluidas fuera de tiempo, por UR**

Unidad Responsable	Total	CAI	DECEYEC	DEOE	DEPPP	DERFE	DESPEN	UTSI	UTYPDP
Actividades concluidas fuera de tiempo	0	0	0	0	0	0	0	0	0


### 1.2. Actividades en ejecución, totales y por UR.

De las 617 actividades que integran el PlyCPEF 2020-2021, se encuentran en ejecución 129 actividades, lo que representa 20.91 por ciento, respecto al total de actividades programadas. El desglose por UR se detalla en el Cuadro 4.

**Cuadro4. Distribución del número de actividades en ejecución, por UR**

Unidad Responsable	Total	CAI	CNCS	DEA	DECEYEC	DEOE	DEPPP	DERFE	DESPEN	DJ	UTCE	UTF	UTIGyND	UTSI	UTYPDF
Actividades en ejecución	129	9	2	3	6	27	17	17	4	4	10	13	1	16	0

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento (DPS) de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), con base en información proporcionada por las UR, al 9 de octubre de 2020.

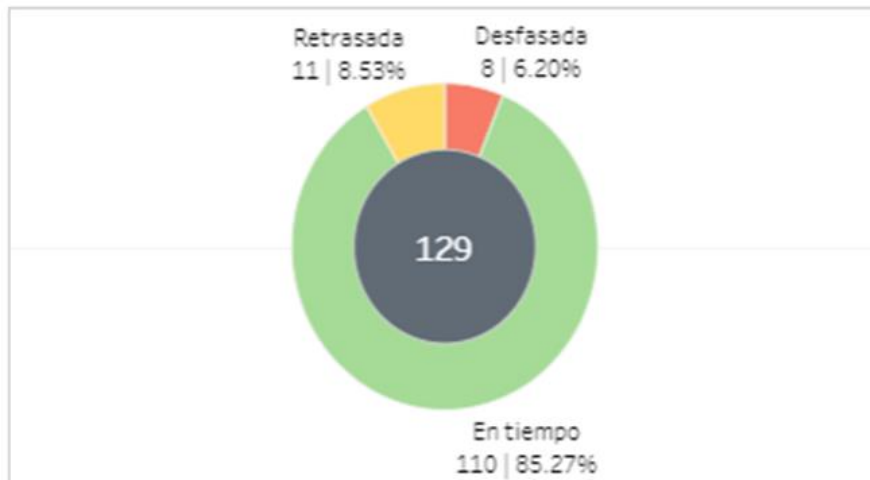


### 1.2.1. Número de actividades en tiempo

De las 129 actividades que se encuentra en ejecución, 110 se encuentran en desarrollo conforme a los tiempos establecidos. El número de actividades que se encuentran en ejecución y en tiempo se presenta el cuadro 5.

**Cuadro 5. Distribución del número de actividades que se desarrollan conforme a los tiempos establecidos, por UR**

Unidad Responsable	Total	CAI	CNCS	DEA	DECEYEC	DEOE	DEPPP	DERFE	DESPEN	DJ	UTCE	UTF	UTIGyND	UTSI	UTYPDF
Actividades en tiempo	110	4	1	3	6	24	16	17	3	4	10	6	1	15	0

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento (DPS) de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), con base en información proporcionada por las UR, al 9 de octubre de 2020.

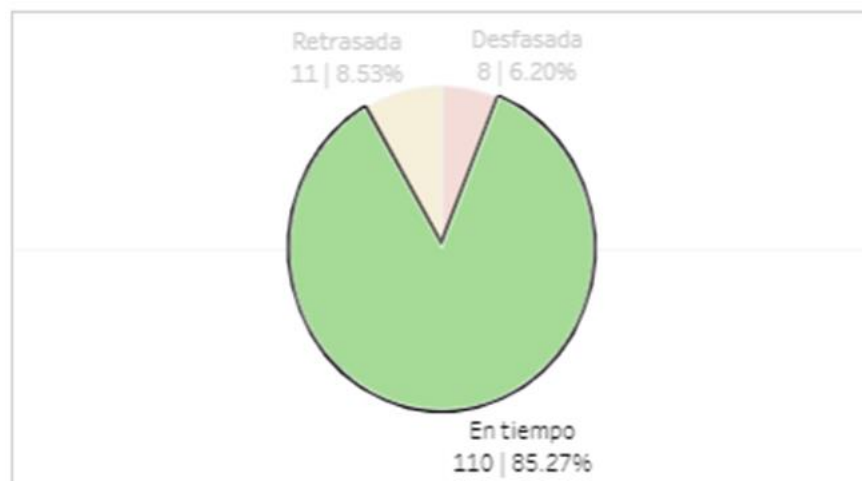

### 1.2.2. Número de actividades retrasadas


De las 129 actividades que se encuentra en ejecución, 11 se encuentran retrasadas conforme a los tiempos establecidos.

En el cuadro 6, se presentan el número de actividades reportadas en ejecución que se encuentran retrasadas.

**Cuadro 6. Distribución del número de actividades retrasadas, por UR**

Unidad Responsable	Total	CAI	DEOE	DEPPP	UTF	UTSI
Actividades retrasadas	11	4	3	1	2	1

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento (DPS) de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), con base en información proporcionada por las UR, al 9 de octubre de 2020

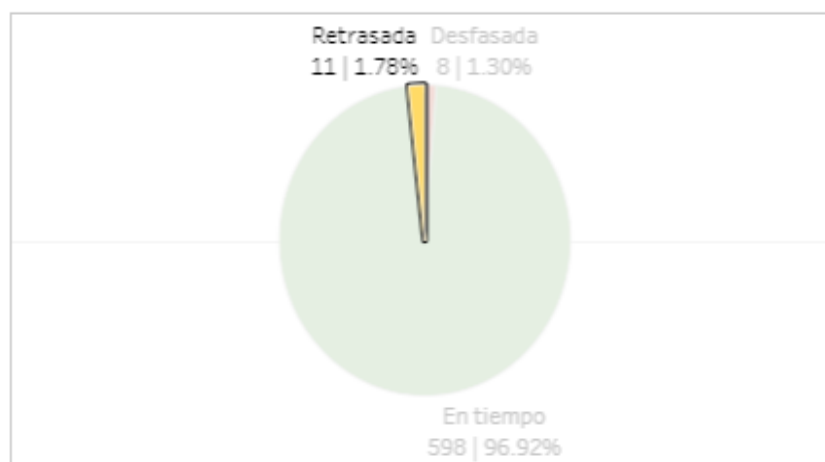

UR	Actividad	Avance favor..	Avance esp..	Avance real	
DEOE	Elaborar los lineamientos para la sesión especial de cómputos distritales del Proceso Electoral 2020-2021	SI	89.01%	75.00%	●
CAI	Dictaminar sobre las solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros	SI	22.48%	7.00%	●
	Notificar a los interesados la resolución a la solicitud de acreditación como visitante extranjero	SI	22.41%	7.00%	●
	Recibir las solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros	SI	22.71%	7.00%	●
CAI	Elaborar y entregar los gafetes de acreditación de los visitantes extranjeros	SI	21.71%	3.00%	●
UTF	Analizar, diseñar y liberar el Sistema Integral de Fiscalización 6.0 Campaña	SI	27.50%	6.00%	●
UTF	Elaborar y someter a consideración de la Comisión de Fiscalización el Proyecto de Acuerdo por el que se emiten..	SI	60.00%	40.00%	●
DEPPP	Notificar el Catálogo Nacional a las Emisoras de Radio y Televisión que integran el mismo para el Proceso Electoral..	SI	75.00%	67.00%	●
DEOE	Definir los requerimientos técnicos para el sistema informático del SIJE.	SI	32.23%	12.00%	●
DEOE	Dar seguimiento a la revisión de condiciones de espacios para implementar medidas sanitarias en los sitios donde..	SI	28.17%	4.00%	●
UTSI	Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema de Reclutamiento y Seguimiento a SE y CAE en l.f..	SI	64.71%	58.00%	●

Ver detalle en anexo 1.




### 1.2.3 Número de actividades desfasadas

De las 129 actividades que se encuentra en ejecución, 8 se encuentran desfasadas. En el cuadro 7, se presentan el número de actividades reportadas en ejecución que se encuentran desfasadas.

**Cuadro 7. Distribución del número de actividades desfasadas, por UR**

Unidad Responsable	Total	CAI	CNCS	DESPEN	UTF
Actividades desfasadas	8	1	1	1	5

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento (DPS) de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), con base en información proporcionada por las UR, al 9 de octubre de 2020.

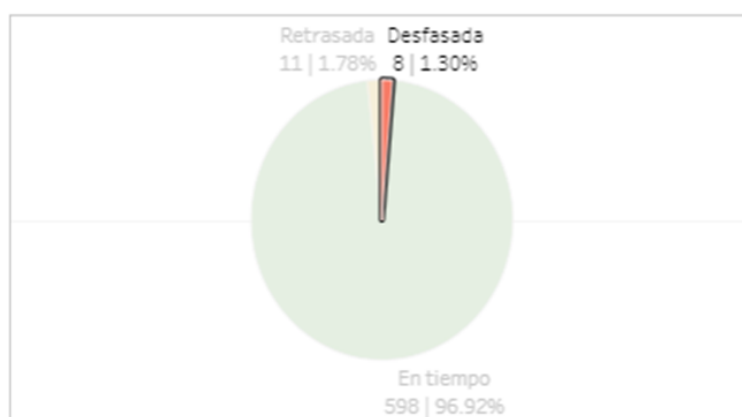

UR	Actividad	Avance favor..	Avance esp..	Avance real	
<b>CNCS</b>	Elaborar contenidos audiovisuales que acompañen sustantivamente con la estrategia de comunicación del l..	SI	77.41%	55.00%	●
<b>CAI</b>	Elaborar y someter a consideración del CG el Proyecto de Acuerdo relativo al Programa de atención a visitantes ex..	SI	72.00%	50.00%	●
<b>UTF</b>	Delimitar mediante acuerdo de la Comisión de Fiscalización los alcances de revisión de los Informes de ..	SI	88.64%	40.00%	●
	Elaborar el proyecto de acuerdo de homologación de los plazos para la fiscalización	SI	100.00%	40.00%	●
	Elaborar el proyecto de acuerdo en donde se determinan los límites de financiamiento privado que podrán recibir ..	SI	100.00%	40.00%	●
	Elaborar el proyecto de acuerdo en el que se determinan las reglas para la contabilidad, rendición de cuentas y fis..	SI	100.00%	40.00%	●
<b>DESPEN</b>	Realizar la insaculación para la selección de los distritos electorales y municipios a verificar durante los periodos ..	SI	100.00%	40.00%	●
<b>DESPEN</b>	Notificar a los 32 presidentes y presidentes de consejos locales de su designación para que instalen sus consejos ..	SI	100.00%	30.00%	●

Ver detalle en anexo 1.

### 1.3. Actividades próximas a concluir, totales y por UR

De las 129 actividades en ejecución, 24 se encuentran próximas a concluir. A continuación, en el cuadro 8, se desglosan las actividades próximas a concluir por UR.

**Cuadro 8. Distribución del número de actividades próximas a concluir, por UR**

Unidad Responsable	Total	DECEYEC	DEOE	DEPPP	UTSI
Actividades próximas a concluir	24	8	1	3	12

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento (DPS) de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), con base en información proporcionada por las UR, al 9 de octubre de 2020.

### 1.4. Actividades por iniciar, totales y por UR

De las 617 actividades que integran el PlyCPEF 2020-2021, se encuentran próximas a iniciar su ejecución 34, lo que representa 5.51 por ciento del total de actividades programadas. El cuadro 9, presenta las actividades próximas a iniciar por UR.

**Cuadro 9. Distribución del número de actividades por iniciar su ejecución, por UR**

Unidad Responsable	Total	CAI	DECEYEC	DEOE	DEPPP	DERFE	DESPEN	UTF	UTSI
Actividades próximas a concluir	34	1	1	6	11	1	3	4	7

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento (DPS) de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), con base en información proporcionada por las UR, al 9 de octubre de 2020.

### 1.5. Inconvenientes, totales y por UR

Cuatro UR manifestaron que el desarrollo de las actividades ha presentado inconvenientes, siendo estas: la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación (3), la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (3), la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (1) y la Unidad Técnica de Servicios de Informática (1). *Ver anexo 1.*

## 2. Análisis cualitativo

Con respecto a las actividades concluidas se destacan los trabajos de administración del desarrollo de soluciones tecnológicas en donde se realizaron trabajos para los sistemas de distribución de la documentación y materiales electorales, ubicación de casillas, app de simulacros y el sistema de registro para votar desde el extranjero, entre otros.

Respecto a la integración de órganos de recepción de votación se destaca la aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2020-2021 por parte del Consejo General, en la cual se concluyeron diversas actividades relacionadas con su socialización hacia los órganos desconcentrados del Instituto.

Con relación a la integración y funcionamiento de los Consejos Locales y Distritales, destaca la designación del Consejo General de las Vocales Ejecutivas y Vocales Ejecutivos Locales como Presidentas y Presidentes de los Consejos Locales durante el desarrollo de los Procesos Electorales Federal y Locales, en las elecciones ordinarias, extraordinarias y concurrentes, así como los procesos de participación ciudadana en los que intervenga el Instituto Nacional Electoral y los avances en actividades y los avances en los trabajos para la integración de consejeras y consejeros de dichos consejos.

Con relación al indicador de temporalidad utilizado para medir el comportamiento general de las actividades desde el inicio del Proceso Electoral Federal 2020-2021, se observa que 19 actividades transitan por desfases y/o retrasos, que corresponden a: Coordinación de Asuntos Internacionales (5), Coordinación Nacional de Comunicación Social (1), Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (1), Unidad Técnica de Fiscalización (7), Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (3), Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (1) y Unidad Técnica de Servicios de Informática (1).

Por otra parte y en cumplimiento de la metodología de seguimiento, en específico con el apartado de las estrategias de control de actividades se informa que se recibieron 19 solicitudes de modificación de actividades en cuanto a la fecha de término de sus actividades, dichos cambios corresponde a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (3), Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (1), Unidad Técnica de Fiscalización (4) y Unidad Técnica de Servicios de Informática (11), conforme el anexo 2 del presente informe.

De la solicitud de cambios se destaca la modificación del plazo para concluir la actividad del marco normativo para el registro de candidaturas a Diputaciones por ambos principios que deberán observar los Partidos Políticos y, en su caso, las Coaliciones ante los Consejos del Instituto, lo anterior en virtud de que deberá contemplar el análisis y procesamiento de las acciones afirmativas que deberán discutirse de forma conjunta en el seno de las Comisiones Unidas de Prerrogativas y Partidos Políticos y de Igualdad de Género y No Discriminación.

Por último, es importante señalar que las actividades que tienen previsto la presentación de acuerdos ante el Consejo General del Instituto cuentan con fechas de término programadas por las Unidades Responsables de acuerdo a sus estimaciones iniciales, no obstante, las fechas en las que se presentarán dichos acuerdos, deberán ser las fechas programadas por las y los consejeros para las sesiones de Consejo General, siendo al corte del presente informe las siguientes:

1. Octubre
  - a. Sesión ordinaria. Miércoles 28 de octubre.
2. Noviembre
  - a. Sesión extraordinaria. Viernes 6 de noviembre.
  - b. Sesión extraordinaria. Miércoles 18 de noviembre.
  - c. Sesión ordinaria. Jueves 26 de noviembre.
3. Diciembre
  - a. Sesión ordinaria. Martes 15 de diciembre

### 3. Consideraciones finales

En el lapso que corresponde a este informe (del 23/09/2020 al 09/10/2020), se analizaron **201** actividades, es decir el 32.58 por ciento de un total de **617** actividades a desarrollarse en el Proceso Electoral Federal 2020-2021.

De estas **201** actividades, **72** concluyeron conforme a los tiempos establecidos.

En **8** actividades, las Unidades Responsables de su ejecución indicaron que el desarrollo de las mismas no es totalmente favorable.

De las **129** actividades que se encuentran en ejecución, **110** se están llevando a cabo conforme a los plazos establecidos, **11** están retrasadas y **8** desfasadas.

Finalmente, para el siguiente periodo a informar (del 10/10/2020 al 31/10/2020), **24** actividades concluirán y **34** serán las que inicien su ejecución en ese periodo.

#### ANEXO 1

- Base de datos la plataforma Sharepoint con corte a la fecha del informe.

**Relación de actividades retrasadas por Unidad Responsable y justificación de avance**

No.	UR	Actividad	Inicio	Término	Avance real	Avance esperado	Avance favorable	Valoración de la UR
50	DEPPP	Notificar el Catálogo Nacional a las Emisoras de Radio y Televisión que integran el mismo para el Proceso Electoral Federal 2020-2021	01/09/2020	23/10/2020	67	74	SI	El 7/oct el CG ordenó la publicación del Catálogo. Se están elaborando los oficios de notificación y se tiene previsto concluir la actividad el 15/oct.
147	UTF	Analizar, diseñar y liberar el Sistema Integral de Fiscalización 6.0 Campaña	16/08/2020	04/03/2021	6	27	SI	Se efectuó el envío de requerimientos, se ha dado retroalimentación a los cronogramas de trabajo remitidos por la UTSI, así como, se remitió a la UTSI el Catálogo de Cuentas Contables 2021, y el archivo de evidencias asociadas a las cuentas contables incorporadas en dicho catálogo, mismos que serán el insumo para el registro de operaciones de Campaña del Proceso Electoral 2020-2021; no obstante, las pruebas correspondientes comenzaran una vez que concluyan los desarrollos y liberaciones productivas de Precampaña.
158	UTF	Elaborar y someter a consideración de la Comisión de Fiscalización el Proyecto de Acuerdo por el que se emiten los lineamientos para la realización de las visitas de verificación, monitoreo de anuncios espectaculares y demás propaganda colocada en la vía pública, diarios, revistas y otros medios impresos, así como en páginas de internet y redes sociales	22/09/2020	22/10/2020	40	58	SI	En proceso de elaboración de proyecto de acuerdo

No.	UR	Actividad	Inicio	Término	Avance real	Avance esperado	Avance favorable	Valoración de la UR
280	DEOE	Dar seguimiento a la revisión de condiciones de espacios para implementar medidas sanitarias en los sitios donde se proyectará instalar las casillas electorales	20/09/2020	30/11/2020	4	28	SI	Etapa de revisión de documento para las previsiones en materia de ubicación de casillas; pasará a visto bueno de la oficina de la Presidencia de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral. Se prevé su remisión a las entidades, entre el 12-14 de octubre. Se socializarán las actividades en la Reunión Nacional de Vocales Ejecutivos y Vocales Secretarios.
310	DEOE	Definir los requerimientos técnicos para el sistema informático del SIJE.	01/09/2020	31/12/2020	12	32	SI	Se elaboró un cronograma de trabajo para programar la elaboración y revisión de los requerimientos de cada módulo, asimismo se recopiló información sobre los partidos locales con registro para considerar los ajustes necesarios. Adicionalmente se verificaron los requerimientos que no pudieron implementarse en la versión utilizada en el PEL 2019-2020 para solicitarlos en la versión que operará en 2021.
326	UTSI	Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema de Reclutamiento y Seguimiento a SE y CAE en línea.	29/09/2020	16/10/2020	58	61	SI	Conforme al Plan
524	CAI	Elaborar y entregar los gafetes de acreditación de los visitantes extranjeros	05/08/2020	05/06/2021	3	22	SI	Si bien al momento no se cuentan con visitantes extranjeros acreditados, se tiene lista la herramienta para elaborar los gafetes de acreditación
527	CAI	Recibir las solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros	04/08/2020	26/05/2021	7	23	SI	El porcentaje de avance corresponde al tiempo transcurrido de la actividad. Si bien no se han recibido solicitudes de acreditación como visitante extranjero, esto no afecta el desarrollo de la actividad, ya que comúnmente al inicio del periodo se reciben pocas solicitudes
528	CAI	Notificar a los interesados la resolución a la solicitud de acreditación como visitante extranjero	04/08/2020	30/05/2021	7	22	SI	El porcentaje de avance corresponde al tiempo transcurrido de la actividad. Si bien no se han recibido solicitudes de acreditación como visitante extranjero, esto no afecta el desarrollo de la actividad, ya que comúnmente al inicio del periodo se reciben pocas solicitudes

No.	UR	Actividad	Inicio	Término	Avance real	Avance esperado	Avance favorable	Valoración de la UR
529	CAI	Dictaminar sobre las solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros	04/08/2020	29/05/2021	7	22	SI	El porcentaje de avance corresponde al tiempo transcurrido de la actividad. Si bien no se han recibido solicitudes de acreditación como visitante extranjero, esto no afecta el desarrollo de la actividad, ya que comúnmente al inicio del periodo se reciben pocas solicitudes
545	DEOE	Elaborar los lineamientos para la sesión especial de cómputos distritales del Proceso Electoral 2020-2021	01/05/2020	30/10/2020	75	89	SI	Actividad en proceso

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento (DPS) de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), con base en información proporcionada por las UR, al 9 de octubre de 2020.



### Relación de actividades desfasadas por Unidad Responsable y justificación de avance

No.	Actividad	UR	Inicio	Término	Avance real	Avance esperado	Avance favorable	Valoración de la UR
90	Elaborar contenidos audiovisuales que acompañen sustantivamente con la estrategia de comunicación del INE	CNCS	03/01/2020	31/12/2020	55	77	SI	El proyecto fue afectado en razón de la pandemia y las restricciones asociados a la realización de actividades presenciales en las instalaciones del Instituto. Esta situación obligó a retrasar la contratación necesaria para llevar a cabo producciones en el estudio de televisión. El proceso administrativo ya fue reanudado, pero todavía no se cuenta con un proveedor. Por otro lado, de conformidad con los acuerdos INE/JGE34/2020 e INE/JGE45/2020, la realización de los programas televisivos está sujeta, todavía, a definiciones en materia sanitaria por lo que toca a la asistencia a instalaciones. No obstante, aprovechando las capacidades propias de la Coordinación Nacional de Comunicación Social y pese a las restricciones que la propia contingencia sanitaria para la realización de actividades presenciales, se han producido contenidos audiovisuales que se encuentran en el canal de YouTube del INE y en Central Electoral, todos los cuales acompañan la estrategia y acciones de comunicación.
153	Delimitar mediante acuerdo de la Comisión de Fiscalización los alcances de revisión de los Informes de Precampaña, Apoyo Ciudadano y campaña	UTF	01/09/2020	15/10/2020	40	87	SI	En proceso de elaboración de proyecto de acuerdo. Se modificó la fecha de aprobación del acuerdo debido a la homologación de plazos de los procesos locales, se aprobará por la Comisión a más tardar el 21 de octubre de 2020.
154	Elaborar el proyecto de acuerdo de homologación de los plazos para la fiscalización	UTF	01/09/2020	30/09/2020	40	100	SI	En proceso de elaboración de proyecto de acuerdo. Se modificó la fecha de aprobación del acuerdo debido a la homologación de plazos de los procesos locales. El acuerdo se subirá a sesión del Consejo General el día 28 de octubre de 2020.

No.	Actividad	UR	Inicio	Término	Avance real	Avance esperado	Avance favorable	Valoración de la UR
155	Elaborar el proyecto de acuerdo en donde se determinan los límites de financiamiento privado que podrán recibir los partidos políticos nacionales por sus precandidatas y precandidatos, candidatas y candidatos; así como las aportaciones de las y los aspirantes a candidaturas independientes y candidaturas independientes	UTF	01/09/2020	30/09/2020	40	100	SI	En proceso de elaboración de proyecto de acuerdo. Se modificó la fecha de aprobación del acuerdo debido a la homologación de plazos de los procesos locales. El acuerdo se subirá a sesión del Consejo General el día 28 de octubre de 2020
156	Elaborar el proyecto de acuerdo en el que se determinan las reglas para la contabilidad, rendición de cuentas y fiscalización, así como los gastos que se consideran como de apoyo ciudadano y precampaña correspondientes a los Procesos Electorales Federal y Locales 2020-2021, así como los procesos extraordinarios que se pudieran derivar de dichos procesos.	UTF	01/09/2020	30/09/2020	40	100	SI	En proceso de elaboración de proyecto de acuerdo. Se modificó la fecha de aprobación del acuerdo debido a la homologación de plazos de los procesos locales. El acuerdo se subirá a sesión del Consejo General el día 28 de octubre de 2020.
157	Realizar la insaculación para la selección de los distritos electorales y municipios a verificar durante los periodos de precampañas, obtención del apoyo ciudadano y campaña	UTF	01/09/2020	30/09/2020	40	100	SI	Se modificó el plazo para la realización de la insaculación debido a la homologación de plazos de los procesos locales. La insaculación se llevará a cabo en el mes de octubre.

No.	Actividad	UR	Inicio	Término	Avance real	Avance esperado	Avance favorable	Valoración de la UR
489	Notificar a los 32 presidentas y presidentes de consejos locales de su designación para que instalen sus consejos a más tardar en el mes de septiembre.	DESPEN	07/09/2020	10/09/2020	30	100	SI	El 7 de septiembre el Consejo General del Instituto designó a los 32 Vocales Ejecutivos y Ejecutivas Locales como presidentes y presidentas de sus respectivos consejos, quienes deberán entrar en funciones a más tardar el 3 de noviembre. Se encuentra en proceso de notificación los nombramientos para dar cumplimiento al punto Segundo del Acuerdo INE/CG282/2020.
520	Elaborar y someter a consideración del CG el Proyecto de Acuerdo relativo al Programa de atención a visitantes extranjeros que acudan a presenciar el Proceso Electoral Federal y Concurrente 2020-2021	CAI	17/08/2020	31/10/2020	50	71	SI	El Proyecto de Acuerdo a sido remitido a la Dirección Jurídica para revisión y, en su caso, validación. Estamos pendientes de recibir respuesta.

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento (DPS) de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), con base en información proporcionada por las UR, al 9 de octubre de 2020.

### Relación de actividades que presentaron inconvenientes por Unidad Responsable y valoración

No.	Actividad	UR	Inicio	Término	Avance real	Avance esperado	Valoración de la UR
282	Llevar a cabo las gestiones del Sistema para el Seguimiento a la Ubicación de Casillas	DEOE	01/05/2020	31/08/2021	26	33	Se ha concluido el análisis y definición de requerimientos del Sistema y se está en etapa de pruebas de aceptación; se ha solicitado a UNICOM conocer el estatus de atención de las incidencias para estar en posibilidad de realizar el simulacro con órganos desconcentrados previo a la liberación del Sistema. Es importante señalar que en esta actividad se avanza por etapas, por lo que no puede medirse con avances iguales en cada día transcurrido.
358	Liberar el Sistema de Reclutamiento SE y CAE en línea para pruebas y simulacros	UTSI	26/09/2020	28/09/2020	100	100	Conforme el plan de trabajo actualizado.
497	Designar temporalmente a las presidentas y presidentes de consejos locales y distritales, cuando se dé el supuesto, por generarse una ausencia temporal o definitiva de la presidenta o presidente que originalmente fueron designados. Elaborar oficio para firma del Secretario Ejecutivo para la designación temporal de presidenta o presidente de consejo local o distrital en donde se presente la ausencia temporal o definitiva de quien originalmente fue designado.	DESPEN	07/09/2020	15/09/2021	0	9	El Consejo General designó a 297 Presidentas y Presidentes de Consejos Distritales Electorales, en virtud que: Juan Ramírez Ramos, Vocal Ejecutivo de la 01 Junta Distrital en el estado de Colima; Zoad Janine García González, Vocal Ejecutiva de la Junta Distrital 01 en el estado de Jalisco y Jessica Jazibe Hernández García, Vocal Ejecutiva de la Junta Distrital 08 en el estado de Oaxaca, fueron designados consejeros electorales en el Organismo Público Local Electoral de su entidad federativa, para ocupar dicho cargo a partir del jueves 1° de octubre de 2020, y por ello presentaron renuncia al Servicio Profesional Electoral.

No.	Actividad	UR	Inicio	Término	Avance real	Avance esperado	Valoración de la UR
499	Llevar a cabo la gestión del Sistema para el Seguimiento a las Sesiones de los Consejos Locales y Distritales	DEOE	01/05/2020	31/08/2021	26	33	Se ha concluido el análisis y definición de requerimientos del Sistema. Se han realizado pruebas al Sistema de Sesiones de Juntas y se han remitido a UNICOM los hallazgos pendientes de atender; asimismo, se ha solicitado contar con una nueva versión del Sistema de Sesiones de Consejo para validar los hallazgos reportados con anterioridad. En ambos casos se ha solicitado a UNICOM la atención de incidencias debido a que no es posible concluir flujos completos de negocio en los sistemas para llevar a cabo simulacros con órganos desconcentrados. Es importante señalar que en esta actividad se avanza por etapas, por lo que no puede medirse con avances iguales en cada día transcurrido.
559	Realizar actividades del simulacro para el ejercicio del voto de las personas con discapacidad y las personas trans.	UTIGyND	01/05/2021	31/05/2021	0		La actividad está programada para 2021.
560	Elaborar tutorial para la organización de los simulacros de votación para personas con discapacidad y personas trans.	UTIGyND	04/01/2021	26/02/2021	0		La actividad está programada para 2021.
561	Elaborar un tutorial sobre cómo denunciar la violencia política contra las mujeres por razón de género en español y en lenguas indígenas.	UTIGyND	01/03/2021	30/07/2021	0		La actividad está programada para 2021.
605	Gestionar los sistemas informáticos en materia de organización electoral	DEOE / UTSI	01/04/2020	31/07/2021	31	39	Se ha continuado con las pruebas de aceptación de los sistemas de sesiones de junta, sesiones de consejo, observadores electorales y ubicación de casillas. Derivado de las observaciones e incidencias reportadas a UNICOM, se han realizado pruebas de regresión y se han reportado nuevos hallazgos, así como hallazgos no atendidos al área técnica para su atención, previo a la liberación en producción. Se ha solicitado a UNICOM conocer el estatus de atención de hallazgos presentados durante el simulacro del Sistema de Observadoras/es Electorales para validación, previendo un nuevo simulacro para el 12 de octubre donde se hayan solventado la

No.	Actividad	UR	Inicio	Término	Avance real	Avance esperado	Valoración de la UR
							totalidad de incidencias y observaciones remitidas al área técnica.

---

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento (DPS) de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), con base en información proporcionada por las UR, al 9 de octubre de 2020.

## ANEXO 2

- Estrategias de Control de Actividades

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Cambio de Fecha	Justificación
104	Conteo Rápido	Coordinación y seguimiento de los trabajos del COTECORA	Elaborar y someter a consideración del CG el Proyecto de Acuerdo por el que se dispone la creación del Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos para los Procesos Electorales Federal y Gobernadores Locales 2020-2021.	DERFE	Cambio la fecha de término del 28/08/2020 al 31/10/2020	La fecha de inicio de labores de los integrantes del Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos para los Procesos Electorales Federal y Locales 2020-2021 se aplazará: anteriormente estaba establecida para el 1 de octubre ahora el inicio tendrá lugar el 1 de noviembre del presente año. Apegándose al Artículo 362, párrafo 1, del Reglamento de Elecciones.
150	Fiscalización de apoyo ciudadano, precampaña y campaña	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Dar soporte a la operación del Sistema Integral de Fiscalización 6.0 Precampaña	UTF	Cambio la fecha de inicio del 1/10/2020 al 10/11/2020	Considerando el acuerdo de homologación de los calendarios de precampaña y apoyo ciudadano aprobado en el mes de septiembre de 2020, las actividades relacionadas a brindar soporte a la operación del Sistema Integral de Fiscalización 6.0 Precampaña iniciaría el 10 de noviembre de 2020, junto con el inicio de las precampañas electorales.
162	Fiscalización de apoyo ciudadano, precampaña y campaña	Seguimiento a la fiscalización de los Procesos Electorales Federales y Locales 2020-2021	Elaborar y someter a consideración de la Comisión de Fiscalización el dictamen y proyecto de resolución relativo a los informes de ingresos y gastos que presentan los sujetos obligados relativos a la precampaña y apoyo ciudadano, y proponer en su caso, las sanciones que procedan conforme a la normatividad aplicable, para su posterior presentación al CG.	UTF	Cambio la fecha de inicio del 30/01/2020 al 30/01/2021	Se detectó una inconsistencia en la fecha de inicio, al considerarse el mes de enero de 2020, cuando las actividades relacionadas a la elaboración y sometimiento de los dictámenes de precampaña y apoyo ciudadano de la COF, sería el 30-01-2021.
182	Fiscalización de apoyo ciudadano, precampaña y campaña	Seguimiento a las Resoluciones de los Procedimientos Administrativos Sancionadores en materia de fiscalización	Presentar al Consejo General los Proyectos de Resolución de los Procedimientos Administrativos Sancionadores electorales en materia de fiscalización relacionados con el Proceso Electoral Federal 2020-2021	UTF	Cambio la fecha de inicio del 12/03/2020 al 12/03/2021	Se detectó una inconsistencia en la fecha de inicio, al considerarse el mes de marzo de 2020, cuando las actividades relacionadas al seguimiento de las resoluciones de los procedimientos sancionadores en materia de fiscalización comenzarían 12-03-2021.

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Cambio de Fecha	Justificación
183	Fiscalización de apoyo ciudadano, precampaña y campaña	Seguimiento a las Resoluciones de los Procedimientos Administrativos Sancionadores en materia de fiscalización	Poner a consideración del Consejo General la aprobación los Proyectos de Resolución de los Procedimientos Administrativos Sancionadores electorales en materia de fiscalización	UTF	Cambio la fecha de inicio del 19/03/2020 al 19/03/2021	Se detectó una inconsistencia en la fecha de inicio, al considerarse el mes de marzo de 2020, cuando las actividades relacionadas al seguimiento de las resoluciones de los procedimientos sancionadores en materia de fiscalización comenzarían 19-03-2021.
233	Gestión de TIC	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos	UTSI	Cambio fecha de inicio del 15/07/2020 al 02/01/2021	El sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos es de actualización continua, por lo que la fecha de inicio se actualizó al plan de trabajo, que está en proceso de formalización la última versión.
236	Gestión de TIC	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Dar soporte a la operación del Sistema Distribución de la Documentación y Materiales Electorales	UTSI	Cambio de fecha de inicio al 08/10/2020	Con base a los requerimientos establecidos por la Dirección de Estadística y Documentación Electoral mediante Atenta Nota INE/DEDE/N-0523/2020 y la respuesta de la Dirección de Sistemas de la UNICOM mediante Atenta Nota INE-DiS-0931-2020 en la que se establece el nuevo cronograma, para solventar los cambios a los requerimientos establecidos.
237	Gestión de TIC	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Dar soporte a la realización de pruebas del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos	UTSI	Cambio fecha de inicio 1/09/200 y de término 1/05/2021 a fecha de inicio 16/10/2020 y de término 15/04/2021	Se revisó con el área usuaria los requerimientos y fechas relevantes, con lo que se actualizó el plan de trabajo, el cual está en proceso de formalización su última versión.
238	Gestión de TIC	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Liberar el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos para pruebas y simulacros	UTSI	Cambio fecha de inicio 01/09/2020 y de término 15/05/2021 a fecha de inicio 27/10/2020 y de término 30/05/2021	Se revisó con el área usuaria los requerimientos y fechas relevantes, con lo que se actualizó el plan de trabajo, el cual está en proceso de formalización su última versión.
239	Gestión de TIC	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Dar soporte a la operación del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos	UTSI	Cambio fecha de inicio 15/09/2020 y de término 30/05/2021 a fecha de inicio 30/10/2020 y de término 30/06/2021	Se revisó con el área usuaria los requerimientos y fechas relevantes, con lo que se actualizó el plan de trabajo, el cual está en proceso de formalización su última versión.



No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Cambio de Fecha	Justificación
241	Gestión de TIC	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Liberar el Sistema Sesiones de Junta y de Consejo para pruebas y simulacros	UTSI	Cambio de fecha de inicio y de término 22/10/2020 y 27/10/2020	Con base a los requerimientos establecidos por la Dirección de Estadística y Documentación Electoral mediante Atenta Nota INE/DEDE/N-0503/2020 y la respuesta de la Dirección de Sistemas de la UNICOM mediante Atenta Nota INE-DIS-1031-2020 en la que se establece el nuevo cronograma, para solventar los cambios a los requerimientos establecidos.
242	Gestión de TIC	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Dar soporte a la operación del Sistema Sesiones de Junta y de Consejo	UTSI	Cambio de fecha de inicio y de término 27/10/2020 y 30/06/2021	Con base a los requerimientos establecidos por la Dirección de Estadística y Documentación Electoral mediante Atenta Nota INE/DEDE/N-0503/2020 y la respuesta de la Dirección de Sistemas de la UNICOM mediante Atenta Nota INE-DIS-1031-2020 en la que se establece el nuevo cronograma, para solventar los cambios a los requerimientos establecidos.
243	Gestión de TIC	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema Sesiones de Junta y de Consejo	UTSI	Cambio de fecha de inicio y de término del 1/10/2020 y 8/10/2020 al 22/10/2020 y 27/10/2020	Con base a los requerimientos establecidos por la Dirección de Estadística y Documentación Electoral mediante Atenta Nota INE/DEDE/N-0503/2020 y la respuesta de la Dirección de Sistemas de la UNICOM mediante Atenta Nota INE-DIS-1031-2020 en la que se establece el nuevo cronograma, para solventar los cambios a los requerimientos establecidos.
323	Integración de órganos de recepción de votación	Administración de la Operación de soluciones tecnológicas	Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema Evaluación de SE y CAE	UTSI	Cambio de fecha de inicio del 10/05/2020 al 10/05/2021	Al momento de incorporar la información por un error involuntario se capturó el año 2020 en vez de 2021.
324	Integración de órganos de recepción de votación	Administración de la Operación de soluciones tecnológicas	Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema Desempeño de Funcionarios de Casilla	UTSI	Cambio la fecha de inicio del 31/05/2020 al 31/05/2021	Al momento de incorporar la información por un error involuntario se capturó el año 2020 en vez de 2021.
351	Integración de órganos de recepción de votación	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Liberar el Sistema Primera Insaculación para pruebas y simulacros	UTSI	Cambio de fecha de inicio del 27/01/2020 al 27/01/2021	Al momento de incorporar la información por un error involuntario se capturó el año 2020 en vez de 2021.

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Cambio de Fecha	Justificación
581	Registro de candidaturas, plataformas electorales y coaliciones o acuerdos de participación	Inscripción y publicación	Difundir las plataformas electorales que presenten los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes	DEPPP	Solicitud de cambio al 01/02/2021	La solicitud de cambio para la fecha de inicio de esta actividad obedece a un error en la captura de esta. Con fundamento en los artículos 236, párrafo 2 de la LGIPE las plataformas electorales deberán presentarse dentro de los quince primeros días de enero del año de la elección, es decir, en enero de 2021.
584	Registro de candidaturas, plataformas electorales y coaliciones o acuerdos de participación	Revisión del cumplimiento de los requisitos de candidaturas, plataformas electorales y coaliciones o acuerdos de participación	Elaborar y someter a consideración del CG el Proyecto de Acuerdo del marco normativo que deberán observar los Partidos Políticos Nacionales que busquen formar Coaliciones y Acuerdos de participación para el PEF 2020-2021	DEPPP	Cambio de fecha de término del 15/10/2020 al 18/11/2020	Si bien la DEPPP ya cuenta con un proyecto de acuerdo, éste deberá armonizarse con los criterios de registro de candidaturas (actividad 585) que apruebe el Consejo General. En ese sentido, el análisis y procesamiento de las acciones afirmativas que vayan a incluirse serán discutidas de forma conjunta en el seno de las Comisiones Unidas de Prerrogativas y Partidos Políticos y de Igualdad de Género y No Discriminación en las próximas semanas.
585	Registro de candidaturas, plataformas electorales y coaliciones o acuerdos de participación	Revisión del cumplimiento de los requisitos de candidaturas, plataformas electorales y coaliciones o acuerdos de participación	Elaborar y someter a consideración del CG el Proyecto de Acuerdo relativo al marco normativo para el registro de candidaturas a Diputaciones por ambos principios que deberán observar los Partidos Políticos y, en su caso, las Coaliciones ante los Consejos del Instituto	DEPPP	Cambio de fecha de término del 15/10/2020 al 18/11/2020	Si bien la DEPPP ya cuenta con un proyecto de acuerdo, éste deberá contemplar el análisis y procesamiento de las acciones afirmativas que deberán discutirse de forma conjunta en el seno de las Comisiones Unidas de Prerrogativas y Partidos Políticos y de Igualdad de Género y No Discriminación en las próximas semanas.
