



Primer Informe parcial del Plan Integral y Calendario de la Consulta Popular

Actividades correspondientes al periodo del
06/04/2021 al 21/05/2021

Mayo, 2021

Índice de contenido

Introducción.....	3
1. Análisis cuantitativo.....	4
1.1. Actividades concluidas, totales y por UR.	5
1.1.1. Número de actividades concluidas en tiempo.....	6
1.1.2. Número de actividades concluidas fuera de tiempo	6
1.2. Actividades en ejecución, totales y por UR.	7
1.2.1. Número de actividades en tiempo	8
1.2.2. Número de actividades desfasadas	8
1.2.3. Número de actividades retrasadas.....	10
1.3. Actividades próximas por concluir, totales y por UR	12
1.4. Actividades por iniciar, totales y por UR	12
1.5. Inconvenientes, totales y por UR	12
2. Análisis cualitativo PlyCCP 2021.....	13
3. Consideraciones finales.....	15
ANEXO 1.....	16
ANEXO 2.....	17
Estrategias de Control de Actividades.....	17

Primer Informe parcial del Plan Integral y Calendario de la Consulta Popular 2021. Actividades correspondientes al periodo del 06/04/2021 al 21/05/2021

Introducción

El pasado 6 de abril de 2021, el Consejo General del INE emitió el Acuerdo INE/CG350/2021 por el que se aprueba el Plan Integral y Calendario de la Consulta Popular 2021 (PlyCCP 2021). Dicho Acuerdo responde a la necesidad de implementar un instrumento de planeación, monitoreo y seguimiento, conforme a la metodología del Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021, mismo que ha permitido al INE dar seguimiento a las actividades sustantivas de las distintas etapas del proceso electoral de mérito que desarrollan las Unidades Responsables y que son la base de la cadena de confianza de la organización electoral.

En esa misma fecha, se emitió el Acuerdo INE/CG351/2021, mediante el cual se aprobaron los Lineamientos del INE para la Organización de la Consulta Popular, los cuales establecen el procedimiento a través del cual el INE implementará la organización de la Consulta Popular. En tal sentido, la ejecución de las actividades listadas en el PlyCCP 2021 observan, en todo momento, lo referido a estos lineamientos.

El PlyCCP 2021 se aprobó integrando un total de 209 actividades, pero resulta necesario precisar que conforme a la metodología del mismo y derivado de las decisiones institucionales para la preparación y organización de la Consulta Popular, se desincorporaron 24 actividades y adicionalmente, se incorporaron 4 actividades bajo la responsabilidad de la UTSI, por lo que en atención a dichos ajustes, al cierre del presente informe actualmente se integra por un total de 189 actividades en las que participan seis direcciones ejecutivas y cuatro unidades técnicas. Del total de actividades, cuatro están previstas para desarrollarse de manera conjunta mientras 185 serán desarrolladas por las unidades en lo individual.


La información que se presenta en este Primer Informe contempla el periodo del 6 de abril de 2021, fecha en que se aprobó el PlyCCP 2021 y hasta el 21 de mayo de 2021. Para este periodo, se encuentran en proceso 44 actividades, de las cuales 3 están desfasadas y 5 retrasadas, al tiempo que 3 actividades se concluyeron conforme al calendario previsto. Asimismo, se presentaron un total de 97 solicitudes de cambios en las actividades por parte de las UR, de las cuales 4 fueron incorporaciones, 24 desincorporaciones, 68 cambios de fecha de inicio o término y 1 cambio de redacción.

Es importante mencionar que la Convocatoria de la Consulta Popular, entrará en vigor el jueves 15 de julio de 2021, pero que, tal y como lo señala el Artículo Primero Transitorio del Decreto por el que se expidió la Convocatoria de Consulta Popular, publicado el 28 de octubre de 2020, el INE podrá ejecutar las acciones preparatorias necesarias para realizar la jornada de consulta popular. Finalmente, debemos subrayar que las actividades previstas dentro del PlyCCP 2021, contemplan la implementación de distintos protocolos sanitarios que buscarán salvaguardar la salud de los funcionarios electorales, de los integrantes de las Mesas Receptoras de la Consulta Popular y de la ciudadanía que acudirán a ejercer su derecho de participación en dicha consulta.

Actividades correspondientes al periodo del 06/04/2021 al 21/05/2021

1. Análisis cuantitativo

El PlyCCP 2021 se integra actualmente por un total de 189 actividades, cuyo avance general es el siguiente:

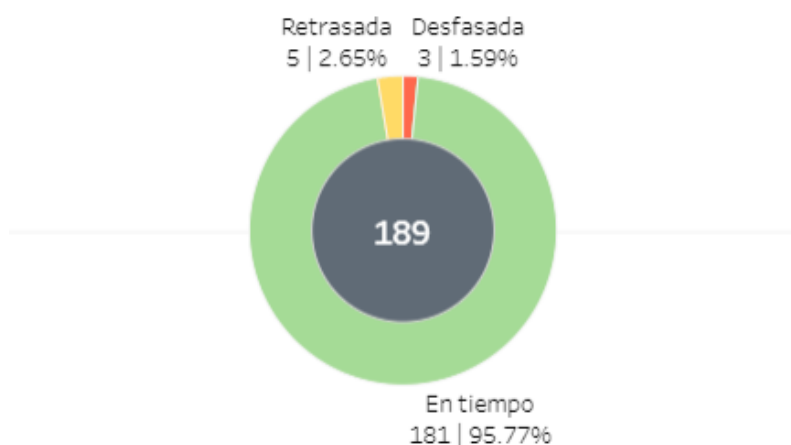

Fuente: Tablero PlyCCP, corte 21 de mayo de 2021.

1.1. Actividades concluidas, totales y por UR.

De las 189 actividades que integran el PlyCCP 2021, se ha concluido 3 actividades, lo que representa 1.59 por ciento del total de actividades programadas. Los entregables correspondientes a dichas actividades se encuentran alojados en la plataforma *Sharepoint* (ver anexo 1). El desglose por UR se detalla en el cuadro 1.

Cuadro 1. Distribución del número de actividades concluidas, por UR

Unidad Responsable	TOTAL	CAI	CNCS	DEA	DECEYEC	DEOE	DEPPP	DERFE	DJ	UTCE	UTSI
Actividades Concluidas	3	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0

1.1.1. Número de actividades concluidas en tiempo

Las actividades concluidas, se cumplieron en los plazos establecidos, como se observa en el cuadro 2.

Cuadro 2. Total de actividades concluidas en tiempo por UR

Unidad Responsable	TOTAL	CAI	CNCS	DEA	DECEYEC	DEOE	DEPPP	DERFE	DJ	UTCCE	UTSI
Concluidas en tiempo	3	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0

1.1.2. Número de actividades concluidas fuera de tiempo


Como se mencionó, las tres actividades concluidas se realizaron en tiempo, por lo que al cierre del presente informe, ninguna actividad se concluyó fuera de los tiempos establecidos.

1.2. Actividades en ejecución, totales y por UR.

De las 189 actividades que integran el PlyCCP 2021, se encuentran en ejecución 44, lo que representa el 23.28 por ciento del total de actividades programadas. El desglose por UR se detalla en el cuadro 3.

Cuadro 3. Distribución del número de actividades en ejecución, por UR

Unidad Responsable	TOTAL	CAI	CNCS	DECEYEC	DEA	DEOE	DEPPP	DERFE	DESPEN	DJ	UTCE	UTSI	DEOE/UTSI	DEOE/DEA
Actividades en Ejecución	44	0	0	8	1	14	0	2	0	0	6	9	2	2

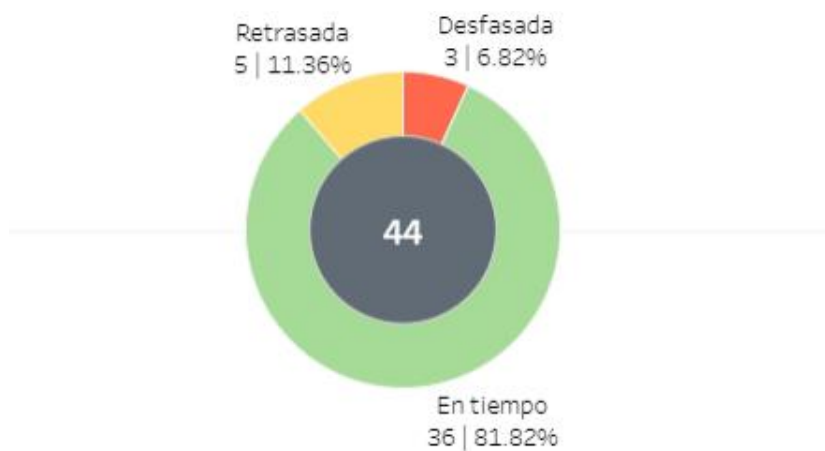

Fuente: Tablero PlyCCP, corte 21 de mayo de 2021.

1.2.1. Número de actividades en tiempo

De las 44 actividades que se encuentran en ejecución, 36 se desarrollan conforme a los tiempos establecidos y con el grado de avance previsto, como se puede ver en el cuadro 4.

Cuadro 4. Distribución del número de actividades que se desarrollan conforme a los tiempos establecidos, por UR

Unidad Responsable	TOTAL	CAI	CNCS	DECEYEC	DEA	DEOE	DEPPP	DERFE	DESPEN	DJ	UTCE	UTSI	DEOE/UTSI	DEOE/DEA
Actividades en Tiempo	36	0	0	5	1	14	0	2	0	0	6	4	2	2

1.2.2. Número de actividades desfasadas

De las 44 actividades que se encuentran en ejecución, 3 se encuentran desfasadas conforme a los tiempos establecidos.

En el cuadro 5, se presentan el número de actividades reportadas en ejecución que se encuentran desfasadas por UR y en el cuadro 6 se detalla la justificación del desfase.

Cuadro 5. Distribución del número de actividades desfasadas, por UR

Unidad Responsable	TOTAL	CAI	CNCS	DECEYEC	DEA	DEOE	DEPPP	DERFE	DESPEN	DJ	UTCE	UTSI	DEOE/UTSI	DEOE/DEA
Actividades Desfasadas	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0

Cuadro 6. Relación de actividades desfasadas por Unidad Responsable y justificación de avance

No.	UR	Actividad	Inicio	Término	Avance real (%)	Avance esperado (%)	Avance favorable.	Valoración de la UR
44	DECEyEC	Diseñar, elaborar y aprobar la Metodología para la Difusión en Radio, TV y medios impresos y digitales.	16/04/2021	14/05/2021	95	100	SI	Se realizaron ajustes al esquema originalmente planteado en virtud de que faltan definiciones sobre la Consulta Popular, por lo que se ha atrasado la aprobación de la "Metodología de Difusión y Promoción de la Participación Ciudadana de la Consulta Popular 2021".
104	UTSI	Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema Sesiones de Junta y de Consejo	01/05/2021	28/05/2021	20	74.07	SI	Se encuentra en el proceso de análisis de los requerimientos para tener el Plan de Trabajo detallado.
108	UTSI	Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema Ubicación de Mesas Receptoras de Consulta	01/05/2021	07/06/2021	20	54.05	SI	En la revisión de requerimientos para generar el Plan de Trabajo Detallado.

1.2.3. Número de actividades retrasadas

De las 44 actividades que se encuentran en ejecución, 5 se encuentran retrasadas conforme a los tiempos establecidos.

En el cuadro 7, se presentan el número de actividades reportadas en ejecución que se encuentran retrasadas por UR y en el cuadro 8 se detalla la justificación del retraso.

Cuadro 7. Distribución del número de actividades retrasadas, por UR

Unidad Responsable	TOTAL	CAI	CNCS	DECEYEC	DEA	DEOE	DEPPP	DERFE	DESPEN	DJ	UTCE	UTSI	DEOE/UTSI	DEOE/DEA
Actividades Retrasadas	5	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0

Cuadro 8. Relación de actividades retrasadas por Unidad Responsable y justificación de avance

No.	UR	Actividad	Inicio	Término	Avance real (%)	Avance esperado (%)	Avance favorable	Valoración de la UR
25	DECEYEC	Elaborar los contenidos de materiales didácticos y de apoyo a utilizar en la consulta popular	16/04/2021	30/06/2021	25	46.67	NO	Derivado de que aún no se aprueba la documentación electoral para la realización de la consulta, la elaboración de los materiales didácticos y de apoyo no ha avanzado conforme lo previsto pues es necesario incorporar las instrucciones de cómo llenar la documentación electoral en las mesas receptoras de votación.
27	DECEYEC	Elaborar los contenidos de material didáctico digital a utilizar para capacitar a Observadores/as Electorales	16/04/2021	30/06/2021	25	46.67	NO	El avance en la elaboración de contenidos de material didáctico digital a utilizar para capacitar a las y los Observadores Electorales se ha visto afectado por la indefinición del esquema para la realización de la consulta, derivado de la actualización del Lineamiento del INE para la organización de la Consulta Popular que aún se encuentra en elaboración.
52	UTSI	Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema de Reclutamiento y Seguimiento a Supervisores y supervisoras e instructores e instructoras asistentes de la Consulta Popular	16/05/2021	07/06/2021	1	22.73	-----	Se da de alta del Proyecto C090110, por lo que se ajustarán las fechas de las actividades.
112	UTSI	Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia	01/05/2021	17/06/2021	15	42.55	SI	Se encuentra en el análisis de requerimientos para generar el Plan de Trabajo detallado.
120	UTSI	Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema Distribución de la Documentación y Materiales Electorales	01/05/2021	10/06/2021	20	50	SI	En el análisis de requerimientos para generar el Plan de Trabajo detallado.

1.3. Actividades próximas por concluir, totales y por UR

En este apartado, se reportan 8 actividades que se encuentran próximas a concluir en el horizonte al 31 de mayo del 2021, como lo muestra el siguiente cuadro.

Cuadro 9. Distribución del número de actividades próximas a concluir, por UR

Unidad Responsable	TOTAL	DEOE	DERFE	DECEYEC	UTSI
Actividades próximas por concluir	8	1	2	3	2

1.4. Actividades por iniciar, totales y por UR

De las 189 actividades que integran el PlyCCP, 4 tienen programada su fecha de inicio entre el 22 y el 31 de mayo de 2021, como se muestra en el cuadro 10.

Cuadro 10. Distribución del número de actividades por iniciar su ejecución por UR

Unidad Responsable	TOTAL	DEPPP	UTSI
Actividades próximas por iniciar	4	1	3

1.5. Inconvenientes, totales y por UR

A la fecha de corte del presente informe, ninguna UR ha reportado inconvenientes para realizar las actividades previstas.

2. Análisis cualitativo PlyCCP 2021

Para el seguimiento del PlyCCP 2021 en el primer informe parcial que se reporta, es conveniente recapitular aquellos eventos que han dado pie a la ejecución de las acciones que llevará a cabo el INE para el desarrollo de dicha Consulta. La aprobación del PlyCCP 2021, así como de los Lineamientos operativos mediante los acuerdos INE/CG350/2021 e INE/CG351/2021 aprobados por el Consejo General el 6 de abril de 2021, constituyen el punto de partida del presente informe y por tanto, la fecha a partir de la cual comienza a detallarse el seguimiento a las actividades.

También es necesario recordar que, en esa misma fecha, mediante Oficio No. INE/SE/2135/2021, por instrucciones del Consejero Presidente, el Secretario Ejecutivo envió los datos de costo de organización de la consulta popular al Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Es importante, mencionar que a partir de que el INE fue notificado formalmente del Decreto del Congreso General mediante el cual se expidió la convocatoria de Consulta Popular, que fue publicada en el DOF el 28 de octubre de 2020, se han realizado actividades de planeación encaminadas a la organización de dicha consulta.

El CG mediante Acuerdo INE/CG554/2020 de fecha 28 de octubre de 2020, aprobó la propuesta de recursos adicionales al Anteproyecto de presupuesto del INE para la realización de la Consulta Popular, con el objeto de solicitar a la Cámara de Diputados, destinar recursos adicionales para la organización de la Consulta Popular 2021, en la aprobación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2021.

El 19 de noviembre se publicó en el DOF el decreto mediante el cual se reformó el Artículo Primero Transitorio del Decreto por el que se expidió la Convocatoria de Consulta Popular, publicado el 28 de octubre de 2020, en el cual se estableció que la Convocatoria de Consulta Popular que se expidió entrará en vigor el jueves 15 de julio de 2021, sin perjuicio que el INE ejecute las acciones preparatorias necesarias para realizar la jornada de consulta popular.

El 30 de noviembre de 2020, se publicó en el DOF, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, en el cual se determinó una reducción de 870 millones de pesos al presupuesto originalmente solicitado por el INE.

El 7 de diciembre de 2020, el CG del INE aprobó, mediante Acuerdo INE/CG634/2020, el Presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2021, que refleja la reducción realizada por la Cámara de Diputados.

El 26 de febrero de 2021, en sesión ordinaria el CG, mediante Acuerdo INE/CG113/2021, presentó las Medidas de Racionalidad y Disciplina Presupuestaria, las cuales se derivan de las obligaciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, a propuesta de la Junta y se aprueban los criterios específicos para la ejecución, control y seguimiento de las políticas y

Lineamientos de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria del INE para el Ejercicio Fiscal 2021.

El 6 de abril de 2021, en sesión extraordinaria el CG, mediante Acuerdo INE/CG352/2021, asignó los tiempos en radio y televisión para la difusión de la Consulta Popular, y aprobó los criterios de distribución de tiempos para autoridades electorales, así como el procedimiento que regula la suspensión de propaganda gubernamental.

Finalmente, el 13 de mayo de 2021, en sesión extraordinaria la JGE, mediante el Acuerdo INE/JGE81/2021, aprobó a la Unidad Técnica de Servicios de Informática, un nuevo proyecto denominado “C090110 Consulta Popular 2021 UTSI”, mismo que forma parte de la cartera institucional de proyectos para el Ejercicio Fiscal 2021.

3. Consideraciones finales

Del lapso que corresponde al presente informe (del 06/04/2021 al 21/05/2021), se analizaron en esta ocasión 47 actividades, es decir 24.87 por ciento de un total de 189 actividades a desarrollarse en el proceso de la Consulta Popular 2021. De estas 47 actividades, 3 fueron concluidas en tiempo y forma.

En estas 47 actividades han participado un total de ocho unidades responsables, lo que constituye un importante esfuerzo institucional en esta etapa inicial. De las 44 actividades en proceso, 3 se encuentran desfasadas y 5 retrasadas.

Es importante mencionar que de las 44 actividades que están en proceso, las 6 actividades iniciadas durante 2020 estuvieron a cargo de la UTCE y tuvieron como objetivo, en su caso, prever o resolver los procedimientos contenciosos que resultaran de la aprobación inmediata de la Consulta Popular.

Por otra parte, en este periodo se realizaron 97 cambios en las actividades del PlyCCP 2021, de los cuales 88 corresponden a la UTSI, 6 a la DEOE, 1 a la DEA y 2 de manera conjunta a la DEOE y a la DEA.

Finalmente, debe considerarse que para el periodo del 15 al 31 de mayo de 2021, se tiene prevista la conclusión de 8 actividades y programado el inicio de ejecución de 4 actividades.

ANEXO 1

Actividades concluidas durante el periodo y entregables

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Entregable	Valoración de la UR
1	Administración de los tiempos del Estado en radio y televisión en periodo ordinario	Asignación de los tiempos en materia electoral en radio y televisión y gestión de transmisiones	Elaborar y presentar al CG el Acuerdo por el cual se establecen los tiempos asignados en radio y televisión para la difusión de la Consulta Popular, los criterios de distribución de tiempos para autoridades electorales, así como el procedimiento que regule la suspensión de propaganda gubernamental.	DEPPP	Acuerdo	Acuerdo INE/CG352/2021 aprobado por el CG en sesión extraordinaria el 06/abr de 2021.
151	Encuestas de propaganda publicadas en medios impresos nacionales y locales	Revisión de medios impresos nacionales y locales para la detección de encuestas y propaganda	Definir la metodología y acciones de coordinación a fin de registrar, clasificar y validar las encuestas y propaganda electoral difundidas en los principales medios impresos nacionales y locales con motivo de la Consulta Popular para ponerlas a disposición de la Secretaría Ejecutiva y de la UTF, respectivamente.	CNCS	Metodología	La Coordinación Nacional de Comunicación Social cuenta con el "Plan de trabajo para el monitoreo de propaganda y encuestas difundidas con motivo de la consulta popular a realizar el 1º de agosto de 2021", y los Anexos respectivos para encuestas y para propaganda en medios impresos. El Plan de Trabajo y los mismos se han remitido a la Unidad Técnica de Fiscalización y de la Secretaría Ejecutiva, respectivamente.
153	Generación de documentación y materiales electorales	Diseño de documentación electoral	Elaborar los diseños, especificaciones técnicas y proyecto de acuerdo para la aprobación de la documentación y materiales electorales para la consulta popular.	DEOE	Diseños, especificaciones técnicas y Acuerdo	Se elaboró la carpeta con los diseños de los materiales para la Consulta Popular, así como lo relativo al proyecto de acuerdo; en este sentido, se propuso la producción de caja paquete, cinta de seguridad, etiqueta Braille para urna, el dado marcador de credenciales con las letras "CP" (Consulta Popular) y, de ser el caso, la producción de Líquido Indeleble. Los documentos se presentaron a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral el 5 de mayo.

Fuente: Elaborado por la Dirección del Secretariado, con base en información proporcionada por las UR, al 21 de mayo de 2021.

ANEXO 2

Estrategias de Control de Actividades

Actividades con solicitud de cambio de fecha y/o redacción

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Descripción del cambio	Justificación de la UR
8	Coordinación de presupuesto	Registro y control presupuestal de Órganos Delegacionales	Tramitar la ministración de recursos financieros a las JLE y JDE, solicitadas por las Unidades Responsables adscritas a oficinas centrales, relacionadas con actividades de la Consulta Popular 2020-2021	DEA	Al integrarse el PIYCCP no se determinó fecha por lo que la UR presentó solicitud para establecer fecha de inicio 19/04/2021 y de término 31/08/2021	Derivado de que a la fecha no existen solicitudes de ministración por parte de los Órganos Delegacionales para la Consulta Ciudadana 2020 2021
48	Integración de órganos de recepción de votación	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema de Reclutamiento en línea	UTSI	Cambio de fecha de inicio del 16/04/2021 a 16/05/2021 y de término de 06/05/2021 a 07/06/2021	Se ajustan las fechas debido a que se somete a autorización el Proyecto "C090110 Consulta Popular UTSI" el 13 de mayo, por lo que las contrataciones del personal modificaron sus fechas de ingreso.
49	Integración de órganos de recepción de votación	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Liberar el Sistema de Reclutamiento en línea para pruebas y simulacros	UTSI	Cambio de fechas de inicio de 07/05/2021 a 08/06/2021 y de término de 07/05/2021 a 08/06/2021	Se ajustan las fechas debido a que se somete a autorización el Proyecto "C090110 Consulta Popular UTSI" el 13 de mayo, por lo que las contrataciones del personal modificaron sus fechas de ingreso.
50	Integración de órganos de recepción de votación	Administración de la Operación de soluciones tecnológicas	Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema de Reclutamiento en línea	UTSI	Cambio de fecha de inicio de 08/05/2021 a 09/06/2021 y de término de 04/06/2021 a 11/06/2021	Se ajustan las fechas debido a que se somete a autorización el Proyecto "C090110 Consulta Popular UTSI" el 13 de mayo, por lo que las contrataciones del personal modificaron sus fechas de ingreso.

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Descripción del cambio	Justificación de la UR
52	Integración de órganos de recepción de votación	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema de Reclutamiento y Seguimiento a Supervisores y supervisoras e instructores e instructoras asistentes de la Consulta Popular	UTSI	Cambio de fecha de inicio de 16/04/2021 a 16/05/2021 y de término de 06/05/2021 a 07/06/2021	Se ajustan las fechas debido a que se somete a autorización el Proyecto "C090110 Consulta Popular UTSI" el 13 de mayo, por lo que las contrataciones del personal modificaron sus fechas de ingreso.
53	Integración de órganos de recepción de votación	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Liberar el Sistema de Reclutamiento y Seguimiento a Supervisores y supervisoras e instructores e instructoras asistentes de la Consulta Popular para pruebas y simulacros	UTSI	Cambio de fechas de inicio de 07/05/2021 a 08/06/2021 y de término de 07/05/2021 a 08/06/2021	Se ajustan las fechas debido a que se somete a autorización el Proyecto "C090110 Consulta Popular UTSI" el 13 de mayo, por lo que las contrataciones del personal modificaron sus fechas de ingreso.
54	Integración de órganos de recepción de votación	Administración de la Operación de soluciones tecnológicas	Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema de Reclutamiento y Seguimiento a Supervisores y supervisoras e instructores e instructoras asistentes de la Consulta Popular	UTSI	Cambio de fechas de inicio de 08/05/2021 a 09/06/2021 y de término de 04/06/2021 a 11/06/2021	Se ajustan las fechas debido a que se somete a autorización el Proyecto "C090110 Consulta Popular UTSI" el 13 de mayo, por lo que las contrataciones del personal modificaron sus fechas de ingreso.
56	Integración de órganos de recepción de votación	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema de Sustitución de Supervisores y supervisoras e instructores e instructoras asistentes de la Consulta Popular	UTSI	Cambio de fechas de inicio de 07/05/2021 a 28/05/2021 y de término de 24/05/2021 a 11/06/2021	Se ajustan las fechas debido a que se somete a autorización el Proyecto "C090110 Consulta Popular UTSI" el 13 de mayo, por lo que las contrataciones del personal modificaron sus fechas de ingreso.
57	Integración de órganos de recepción de votación	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Liberar el Sistema de Sustitución de Supervisores y supervisoras e instructores e instructoras asistentes de la Consulta Popular para pruebas y simulacros	UTSI	Cambio de fechas de inicio de 25/05/2021 a 14/06/2021 y de término de 25/05/2021 a 14/06/2021	Se ajustan las fechas debido a que se somete a autorización el Proyecto "C090110 Consulta Popular UTSI" el 13 de mayo, por lo que las contrataciones del personal modificaron sus fechas de ingreso.

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Descripción del cambio	Justificación de la UR
58	Integración de órganos de recepción de votación	Administración de la Operación de soluciones tecnológicas	Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema de Sustitución de Supervisores y supervisoras e instructores e instructoras asistentes de la Consulta Popular	UTSI	Cambio de fechas de inicio de 26/05/2021 a 15/06/2021 y de término de 11/06/2021 a 17/06/2021	Se ajustan las fechas debido a que se somete a autorización el Proyecto "C090110 Consulta Popular UTSI" el 13 de mayo, por lo que las contrataciones del personal modificaron sus fechas de ingreso.
59	Integración de órganos de recepción de votación	Administración de la Operación de soluciones tecnológicas	Dar soporte a la operación del Sistema de Sustitución de Supervisores y supervisoras e instructores e instructoras asistentes de la Consulta Popular	UTSI	Cambio de fecha de inicio de 14/06/2021 a 21/06/2021	Se ajustan las fechas debido a que se somete a autorización el Proyecto "C090110 Consulta Popular UTSI" el 13 de mayo, por lo que las contrataciones del personal modificaron sus fechas de ingreso.
72	Integración de órganos de recepción de votación	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Analizar, diseñar y desarrollar la App móvil para la segunda etapa de capacitación	UTSI	Cambio de fecha de término de 13/06/2021 a 17/06/2021	Se ajustan las fechas debido a que se somete a autorización el Proyecto "C090110 Consulta Popular UTSI" el 13 de mayo, por lo que las contrataciones del personal modificaron sus fechas de ingreso.
73	Integración de órganos de recepción de votación	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Liberar la App móvil para la segunda etapa de capacitación	UTSI	Cambio de fechas de inicio de 14/06/2021 a 18/06/2021 y de término de 14/06/2021 a 18/06/2021	Se ajustan las fechas debido a que se somete a autorización el Proyecto "C090110 Consulta Popular UTSI" el 13 de mayo, por lo que las contrataciones del personal modificaron sus fechas de ingreso.
74	Integración de órganos de recepción de votación	Administración de la Operación de soluciones tecnológicas	Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros de la App móvil para la segunda etapa de capacitación	UTSI	Cambio de fechas de inicio de 15/06/2021 a 19/06/2021 y de término de 18/06/2021 a 25/06/2021	Se ajustan las fechas debido a que se somete a autorización el Proyecto "C090110 Consulta Popular UTSI" el 13 de mayo, por lo que las contrataciones del personal modificaron sus fechas de ingreso.

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Descripción del cambio	Justificación de la UR
75	Integración de órganos de recepción de votación	Administración de la Operación de soluciones tecnológicas	Dar soporte a la operación de la App móvil para la segunda etapa de capacitación	UTSI	Cambio de fecha de inicio de 21/06/2021 a 26/06/2021	Se ajustan las fechas debido a que se somete a autorización el Proyecto "C090110 Consulta Popular UTSI" el 13 de mayo, por lo que las contrataciones del personal modificaron sus fechas de ingreso.
76	Integración de órganos de recepción de votación	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación	UTSI	Cambio de fechas de inicio de 25/05/2021 a 21/05/2021 y de término de 14/06/2021 a 13/06/2021	Se ajustan las fechas debido a que se somete a autorización el Proyecto "C090110 Consulta Popular UTSI" el 13 de mayo, por lo que las contrataciones del personal modificaron sus fechas de ingreso.
77	Integración de órganos de recepción de votación	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Liberar el Sistema Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación para pruebas y simulacros	UTSI	Cambio de fechas de inicio de 15/06/2021 a 14/06/2021 y de término de 15/06/2021 a 14/06/2021	Se ajustan las fechas debido a que se somete a autorización el Proyecto "C090110 Consulta Popular UTSI" el 13 de mayo, por lo que las contrataciones del personal modificaron sus fechas de ingreso.
78	Integración de órganos de recepción de votación	Administración de la Operación de soluciones tecnológicas	Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación	UTSI	Cambio de fechas de inicio de 16/06/2021 a 15/06/2021 y de término de 18/06/2021 a 17/06/2021	Se ajustan las fechas debido a que se somete a autorización el Proyecto "C090110 Consulta Popular UTSI" el 13 de mayo, por lo que las contrataciones del personal modificaron sus fechas de ingreso.
79	Integración de órganos de recepción de votación	Administración de la Operación de soluciones tecnológicas	Dar soporte a la operación del Sistema Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación	UTSI	Cambio de fecha de inicio de 21/06/2021 a 18/06/2021	Se ajustan las fechas debido a que se somete a autorización el Proyecto "C090110 Consulta Popular UTSI" el 13 de mayo, por lo que las contrataciones del personal modificaron sus fechas de ingreso.

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Descripción del cambio	Justificación de la UR
80	Integración de órganos de recepción de votación	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema Sustitución de funcionarios de Mesas Receptoras de Consulta	UTSI	Cambio de fechas de inicio de 25/05/2021 a 08/06/2021 y de término de 14/06/2021 a 21/06/2021	Se ajustan las fechas debido a que se somete a autorización el Proyecto "C090110 Consulta Popular UTSI" el 13 de mayo, por lo que las contrataciones del personal modificaron sus fechas de ingreso.
81	Integración de órganos de recepción de votación	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Liberar el Sistema Sustitución de funcionarios de Mesas Receptoras de Consulta para pruebas y simulacros	UTSI	Cambio de fechas de inicio de 15/06/2021 a 22/06/2021 y de término de 15/06/2021 a 22/06/2021	Se ajustan las fechas debido a que se somete a autorización el Proyecto "C090110 Consulta Popular UTSI" el 13 de mayo, por lo que las contrataciones del personal modificaron sus fechas de ingreso.
82*	Integración de órganos de recepción de votación	Administración de la Operación de soluciones tecnológicas	Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema Sustitución de funcionarios de Mesas Receptoras de Consulta	UTSI	Cambio de fechas de inicio de 16/06/2021 a 23/06/2021 y de término de 18/06/2021 a 25/06/2021	Se ajustan las fechas debido a que se somete a autorización el Proyecto "C090110 Consulta Popular UTSI" el 13 de mayo, por lo que las contrataciones del personal modificaron sus fechas de ingreso. Se detectó el error en el nombre de la actividad No. 82, el nombre se encuentra duplicado con el de la actividad No. 83.
83	Integración de órganos de recepción de votación	Administración de la Operación de soluciones tecnológicas	Dar soporte a la operación del Sistema Sustitución de funcionarios de Mesas Receptoras de Consulta	UTSI	Cambio de fecha de inicio de 21/06/2021 a 26/06/2021	Se ajustan las fechas debido a que se somete a autorización el Proyecto "C090110 Consulta Popular UTSI" el 13 de mayo, por lo que las contrataciones del personal modificaron sus fechas de ingreso.
92	Integración de órganos de recepción de votación	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Analizar, diseñar y desarrollar la App Simulacros	UTSI	Cambio de fecha de término de 26/06/2021 a 30/06/2021	Se ajustan las fechas debido a que se somete a autorización el Proyecto "C090110 Consulta Popular UTSI" el 13 de mayo, por lo que las contrataciones del personal modificaron sus fechas de ingreso.

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Descripción del cambio	Justificación de la UR
93	Integración de órganos de recepción de votación	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Liberar la App Simulacros para pruebas y simulacros	UTSI	Cambio de fechas de inicio de 27/06/2021 a 01/07/2021 y de término de 27/06/2021 a 01/07/2021	Se ajustan las fechas debido a que se somete a autorización el Proyecto "C090110 Consulta Popular UTSI" el 13 de mayo, por lo que las contrataciones del personal modificaron sus fechas de ingreso.
94	Integración de órganos de recepción de votación	Administración de la Operación de soluciones tecnológicas	Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros de la App Simulacros	UTSI	Cambio de fechas de inicio de 28/06/2021 a 02/07/2021 y de término de 29/06/2021 a 05/07/2021	Se ajustan las fechas debido a que se somete a autorización el Proyecto "C090110 Consulta Popular UTSI" el 13 de mayo, por lo que las contrataciones del personal modificaron sus fechas de ingreso.
95	Integración de órganos de recepción de votación	Administración de la Operación de soluciones tecnológicas	Dar soporte a la operación de la App Simulacros	UTSI	Cambio de fecha de inicio de 30/06/2021 a 06/07/2021	Se ajustan las fechas debido a que se somete a autorización el Proyecto "C090110 Consulta Popular UTSI" el 13 de mayo, por lo que las contrataciones del personal modificaron sus fechas de ingreso.
100	Gestión de TIC	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema de Observadores Electorales	UTSI	Cambio de fechas de inicio de 26/04/2021 a 16/05/2021 y de término de 11/06/2021 a 17/06/2021	Se ajustan las fechas debido a que se somete a autorización el Proyecto "C090110 Consulta Popular UTSI" el 13 de mayo, por lo que las contrataciones del personal modificaron sus fechas de ingreso.
101	Gestión de TIC	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Liberar el Sistema de Observadores Electorales para pruebas y simulacros	UTSI	Cambio de fechas de inicio de 14/06/2021 a 18/06/2021 y de término de 14/06/2021 a 18/06/2021	Se ajustan las fechas debido a que se somete a autorización el Proyecto "C090110 Consulta Popular UTSI" el 13 de mayo, por lo que las contrataciones del personal modificaron sus fechas de ingreso.

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Descripción del cambio	Justificación de la UR
102	Gestión de TIC	Administración de la Operación de soluciones tecnológicas	Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema de Observadores Electorales	UTSI	Cambio de fecha de inicio de 15/06/2021 a 19/06/2021	Se ajustan las fechas debido a que se somete a autorización el Proyecto "C090110 Consulta Popular UTSI" el 13 de mayo, por lo que las contrataciones del personal modificaron sus fechas de ingreso.
104	Gestión de TIC	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema Sesiones de Junta y de Consejo	UTSI	Cambio de fechas de inicio de 16/04/2021 a 01/05/2021 y de término de 14/05/2021 a 28/05/2021	Se ajustan las fechas debido a que se somete a autorización el Proyecto "C090110 Consulta Popular UTSI" el 13 de mayo, por lo que las contrataciones del personal modificaron sus fechas de ingreso.
105	Gestión de TIC	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Liberar el Sistema Sesiones de Junta y de Consejo para pruebas y simulacros	UTSI	Cambio de fechas de inicio de 17/05/2021 a 29/05/2021 y de término de 17/05/2021 a 29/05/2021	Se ajustan las fechas debido a que se somete a autorización el Proyecto "C090110 Consulta Popular UTSI" el 13 de mayo, por lo que las contrataciones del personal modificaron sus fechas de ingreso.
106	Gestión de TIC	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema Sesiones de Junta y de Consejo	UTSI	Cambio de fecha de inicio de 18/05/2021 a 29/05/2021	Se ajustan las fechas debido a que se somete a autorización el Proyecto "C090110 Consulta Popular UTSI" el 13 de mayo, por lo que las contrataciones del personal modificaron sus fechas de ingreso.
108	Gestión de TIC	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema Ubicación de Mesas Receptoras de Consulta	UTSI	Cambio de fechas de inicio de 26/04/2021 a 01/05/2021 y de término de 11/06/2021 a 07/06/2021	Se ajustan las fechas debido a que se somete a autorización el Proyecto "C090110 Consulta Popular UTSI" el 13 de mayo, por lo que las contrataciones del personal modificaron sus fechas de ingreso.

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Descripción del cambio	Justificación de la UR
109	Gestión de TIC	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Liberar el Sistema Ubicación de Mesas Receptoras de Consulta para pruebas y simulacros	UTSI	Cambio de fechas de inicio de 14/06/2021 a 08/06/2021 y de término de 14/06/2021 a 08/06/2021	Se ajustan las fechas debido a que se somete a autorización el Proyecto "C090110 Consulta Popular UTSI" el 13 de mayo, por lo que las contrataciones del personal modificaron sus fechas de ingreso.
110	Gestión de TIC	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema Ubicación de Mesas Receptoras de Consulta	UTSI	Cambio de fecha de inicio de 15/06/2021 a 09/06/2021 y de término de 25/06/2021 a 13/06/2021	Se ajustan las fechas debido a que se somete a autorización el Proyecto "C090110 Consulta Popular UTSI" el 13 de mayo, por lo que las contrataciones del personal modificaron sus fechas de ingreso.
111	Gestión de TIC	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Dar soporte a la operación del Sistema Ubicación de Mesas Receptoras de Consulta	UTSI	Cambio de fecha de inicio de 28/06/2021 a 14/06/2021	Se ajustan las fechas debido a que se somete a autorización el Proyecto "C090110 Consulta Popular UTSI" el 13 de mayo, por lo que las contrataciones del personal modificaron sus fechas de ingreso.
112	Gestión de TIC	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia	UTSI	Cambio de fechas de inicio de 16/04/2021 a 01/05/2021 y de término de 03/06/2021 a 17/06/2021	Se ajustan las fechas debido a que se somete a autorización el Proyecto "C090110 Consulta Popular UTSI" el 13 de mayo, por lo que las contrataciones del personal modificaron sus fechas de ingreso.
113	Gestión de TIC	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Liberar el Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia para pruebas y simulacros	UTSI	Cambio de fechas de inicio de 04/06/2021 a 18/06/2021 y de término de 04/06/2021 a 18/06/2021	Se ajustan las fechas debido a que se somete a autorización el Proyecto "C090110 Consulta Popular UTSI" el 13 de mayo, por lo que las contrataciones del personal modificaron sus fechas de ingreso.

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Descripción del cambio	Justificación de la UR
114	Gestión de TIC	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia	UTSI	Cambio de fechas de inicio de 07/06/2021 a 19/06/2021 y de término de 18/06/2021 a 25/06/2021	Se ajustan las fechas debido a que se somete a autorización el Proyecto "C090110 Consulta Popular UTSI" el 13 de mayo, por lo que las contrataciones del personal modificaron sus fechas de ingreso.
115	Gestión de TIC	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Dar soporte a la operación del Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia	UTSI	Cambio de fecha de inicio de 21/06/2021 a 28/06/2021	Se ajustan las fechas debido a que se somete a autorización el Proyecto "C090110 Consulta Popular UTSI" el 13 de mayo, por lo que las contrataciones del personal modificaron sus fechas de ingreso.
116	Gestión de TIC	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Analizar, diseñar y desarrollar la App Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE)	UTSI	Cambio de fechas de inicio de 10/05/2021 a 17/05/2021 y de término de 01/07/2021 a 08/07/2021	Se ajustan las fechas debido a que se somete a autorización el Proyecto "C090110 Consulta Popular UTSI" el 13 de mayo, por lo que las contrataciones del personal modificaron sus fechas de ingreso.
117	Gestión de TIC	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Liberar la App Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) para pruebas y simulacros	UTSI	Cambio de fechas de inicio de 02/07/2021 a 09/07/2021 y de término de 02/07/2021 a 09/07/2021	Se ajustan las fechas debido a que se somete a autorización el Proyecto "C090110 Consulta Popular UTSI" el 13 de mayo, por lo que las contrataciones del personal modificaron sus fechas de ingreso.
118	Gestión de TIC	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros de la App Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE)	UTSI	Cambio de fecha de inicio de 05/07/2021 a 10/07/2021	Se ajustan las fechas debido a que se somete a autorización el Proyecto "C090110 Consulta Popular UTSI" el 13 de mayo, por lo que las contrataciones del personal modificaron sus fechas de ingreso.

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Descripción del cambio	Justificación de la UR
120	Gestión de TIC	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema Distribución de la Documentación y Materiales Electorales	UTSI	Cambio de fechas de inicio de 16/04/2021 a 01/05/2021 y de término de 27/05/2021 a 10/06/2021	Se ajustan las fechas debido a que se somete a autorización el Proyecto "C090110 Consulta Popular UTSI" el 13 de mayo, por lo que las contrataciones del personal modificaron sus fechas de ingreso.
121	Gestión de TIC	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Liberar el Sistema Distribución de la Documentación y Materiales Electorales para pruebas y simulacros	UTSI	Cambio de fechas de inicio de 28/05/2021 a 11/06/2021 y de término de 28/05/2021 a 11/06/2021	Se ajustan las fechas debido a que se somete a autorización el Proyecto "C090110 Consulta Popular UTSI" el 13 de mayo, por lo que las contrataciones del personal modificaron sus fechas de ingreso.
122	Gestión de TIC	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema Distribución de la Documentación y Materiales Electorales	UTSI	Cambio de fechas de inicio de 31/05/2021 a 12/06/2021 y de término de 11/06/2021 a 15/06/2021	Se ajustan las fechas debido a que se somete a autorización el Proyecto "C090110 Consulta Popular UTSI" el 13 de mayo, por lo que las contrataciones del personal modificaron sus fechas de ingreso.
123	Gestión de TIC	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Dar soporte a la operación del Sistema Distribución de la Documentación y Materiales Electorales	UTSI	Cambio de fechas de inicio de 14/06/2021 a 16/06/2021	Se ajustan las fechas debido a que se somete a autorización el Proyecto "C090110 Consulta Popular UTSI" el 13 de mayo, por lo que las contrataciones del personal modificaron sus fechas de ingreso.
124	Gestión de TIC	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema SIJE	UTSI	Cambio de fechas de inicio de 17/05/2021 a 01/06/2021 y de término de 25/06/2021 a 08/07/2021	Se ajustan las fechas debido a que se somete a autorización el Proyecto "C090110 Consulta Popular UTSI" el 13 de mayo, por lo que las contrataciones del personal modificaron sus fechas de ingreso.

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Descripción del cambio	Justificación de la UR
125	Gestión de TIC	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Liberar el Sistema SIJE para pruebas y simulacros	UTSI	Cambio de fechas de inicio de 28/06/2021 a 09/07/2021 y de término de 28/06/2021 a 09/07/2021	Se ajustan las fechas debido a que se somete a autorización el Proyecto "C090110 Consulta Popular UTSI" el 13 de mayo, por lo que las contrataciones del personal modificaron sus fechas de ingreso.
126	Gestión de TIC	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema SIJE	UTSI	Cambio de fechas de inicio de 29/06/2021 a 10/07/2021	Se ajustan las fechas debido a que se somete a autorización el Proyecto "C090110 Consulta Popular UTSI" el 13 de mayo, por lo que las contrataciones del personal modificaron sus fechas de ingreso.
128	Gestión de TIC	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Analizar, diseñar y desarrollar la App SIJE	UTSI	Cambio de fechas de inicio de 17/05/2021 a 01/06/2021 y de término de 25/06/2021 a 08/07/2021	Se ajustan las fechas debido a que se somete a autorización el Proyecto "C090110 Consulta Popular UTSI" el 13 de mayo, por lo que las contrataciones del personal modificaron sus fechas de ingreso.
129	Gestión de TIC	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Liberar la App SIJE para pruebas y simulacros	UTSI	Cambio de fechas de inicio de 28/06/2021 a 09/07/2021 y de término de 28/06/2021 a 09/07/2021	Se ajustan las fechas debido a que se somete a autorización el Proyecto "C090110 Consulta Popular UTSI" el 13 de mayo, por lo que las contrataciones del personal modificaron sus fechas de ingreso.
130	Gestión de TIC	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros de la App SIJE	UTSI	Cambio de fechas de inicio de 29/06/2021 a 10/07/2021	Se ajustan las fechas debido a que se somete a autorización el Proyecto "C090110 Consulta Popular UTSI" el 13 de mayo, por lo que las contrataciones del personal modificaron sus fechas de ingreso.

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Descripción del cambio	Justificación de la UR
132	Gestión de TIC	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema de Cómputos Distritales y de Circunscripción	UTSI	Cambio de fechas de inicio de 07/06/2021 a 14/06/2021 y de término de 14/07/2021 a 21/07/2021	Se ajustan las fechas debido a que se somete a autorización el Proyecto "C090110 Consulta Popular UTSI" el 13 de mayo, por lo que las contrataciones del personal modificaron sus fechas de ingreso.
133	Gestión de TIC	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Liberar el Sistema de Cómputos Distritales y de Circunscripción para pruebas y simulacros	UTSI	Cambio de fechas de inicio de 15/07/2021 a 22/07/2021 y de término de 15/07/2021 a 22/07/2021	Se ajustan las fechas debido a que se somete a autorización el Proyecto "C090110 Consulta Popular UTSI" el 13 de mayo, por lo que las contrataciones del personal modificaron sus fechas de ingreso.
134	Gestión de TIC	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema de Cómputos Distritales y de Circunscripción	UTSI	Cambio de fechas de inicio de 16/07/2021 a 23/07/2021	Se ajustan las fechas debido a que se somete a autorización el Proyecto "C090110 Consulta Popular UTSI" el 13 de mayo, por lo que las contrataciones del personal modificaron sus fechas de ingreso.
136	Gestión de TIC	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema Generador de Bases de Datos	UTSI	Cambio de fechas de inicio de 24/05/2021 a 07/06/2021 y de término de 04/06/2021 a 18/06/2021	Se ajustan las fechas debido a que se somete a autorización el Proyecto "C090110 Consulta Popular UTSI" el 13 de mayo, por lo que las contrataciones del personal modificaron sus fechas de ingreso.
137	Gestión de TIC	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Liberar el Sistema Generador de Bases de Datos para pruebas y simulacros	UTSI	Cambio de fechas de inicio de 07/06/2021 a 19/06/2021 y de término de 07/06/2021 a 19/06/2021	Se ajustan las fechas debido a que se somete a autorización el Proyecto "C090110 Consulta Popular UTSI" el 13 de mayo, por lo que las contrataciones del personal modificaron sus fechas de ingreso.

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Descripción del cambio	Justificación de la UR
138	Gestión de TIC	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema Generador de Bases de Datos	UTSI	Cambio de fechas de inicio de 08/06/2021 a 20/06/2021 y de término de 18/06/2021 a 25/06/2021	Se ajustan las fechas debido a que se somete a autorización el Proyecto "C090110 Consulta Popular UTSI" el 13 de mayo, por lo que las contrataciones del personal modificaron sus fechas de ingreso.
139	Gestión de TIC	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Dar soporte a la operación del Sistema Generador de Bases de Datos	UTSI	Cambio de fechas de inicio de 21/06/2021 a 28/06/2021	Se ajustan las fechas debido a que se somete a autorización el Proyecto "C090110 Consulta Popular UTSI" el 13 de mayo, por lo que las contrataciones del personal modificaron sus fechas de ingreso.
154	Generación de documentación y materiales electorales	Adquisición de la documentación electoral	Preparar y ejecutar del procedimiento administrativo para la adquisición de la documentación y materiales electorales para la consulta popular.	DEOE/DEA	Cambio de fecha de término de 15/05/2021 a 15/07/2021	En virtud que el Instituto no recibirá recursos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el desarrollo de la Consulta Popular el proyecto no ha sido aprobado aún por los Órganos Colegiados del Instituto. Por lo tanto, aún no se cuenta con presupuesto para realizar las gestiones administrativas para la adquisición de la documentación y materiales electorales. Asimismo, está pendiente la aprobación de la documentación y materiales electorales a utilizarse en la Consulta Popular por parte del Consejo General. Es por ello que se requiere aplazar la fecha de término de esta actividad.

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Descripción del cambio	Justificación de la UR
155	Generación de documentación y materiales electorales	Distribución	Preparar y ejecutar el procedimiento administrativo para la contratación del servicio de transportes para la consulta popular	DEOE/DEA	Cambio de fecha de término de 15/06/2021 a 15/07/2021	En virtud que el Instituto no recibirá recursos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el desarrollo de la Consulta Popular, el proyecto no ha sido aprobado aún por los Órganos Colegiados del Instituto. Por lo tanto, aún no se cuenta con presupuesto para realizar las gestiones administrativas para la adquisición de la documentación y materiales electorales. Asimismo, está pendiente la aprobación de la documentación y materiales electorales a utilizarse en la Consulta Popular por parte del Consejo General. Es por ello que se requiere aplazar la fecha de término de esta actividad.
197	Asistencia Electoral	Programa de Asistencia Electoral	Elaborar los objetivos, metas y líneas de acción de los proyectos que conforman las actividades del programa de Asistencia Electoral para su incorporación a la ECAE con alineación a la Consulta Popular	DEOE	Al integrarse el PIYCCP no se determinó fecha por lo que la UR presentó solicitud para establecer fecha de inicio 01/05/2021 y de término 10/06/2021	Para la aprobación de esta actividad, se requería la definición de la DECEyEC respecto a las fechas de aprobación de la ECAE o equivalente para Consulta Popular, por lo que una vez teniendo esta definición la actividad comenzó su curso.

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Descripción del cambio	Justificación de la UR
199	Implementación y operación del Sistema de Información de la Consulta Popular (SICP) 2021	Definición de procedimientos para la implementación del Proyecto SICP 2021	Elaborar el Programa de Operación del SICP 2021 y el Proyecto de Acuerdo correspondiente, para someterlo a la aprobación de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral	DEOE	<p>PRIMER CAMBIO: Cambio de fecha de inicio de 01/03/2021 a 01/05/2021 y de término de 31/03/2021 a 31/05/2021</p> <p>SEGUNDO CAMBIO Cambio de fecha de término de 31/05/2021 a 15/06/2021</p>	<p>PRIMER CAMBIO: Se modifica la fecha de inicio y término acorde a lo establecido en el artículo 39 de los Lineamientos para la organización de la Consulta Popular, del 1 de agosto de 2021. SEGUNDO CAMBIO: En virtud que el Instituto no recibirá recursos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el desarrollo de la Consulta Popular, e l proyecto no ha sido aprobado aún por los Órganos Colegiados del Instituto. Por ello aún no se define el presupuesto que se tendrá y el área no está en posibilidad de precisar la cantidad de recursos materiales y humanos que se podrán utilizar para el desarrollo de la actividad</p>
200	Implementación y operación del Sistema de Información de la Consulta Popular (SICP) 2022	Elaboración de requerimientos para el sistema informático del SICP 2021	Definir los requerimientos técnicos para el sistema informático del SICP 2021	DEOE	Cambio de fecha de inicio de 15/03/2021 a 01/05/2021 y de término de 30/04/2021 a 15/06/2021	Se modifica la fecha de inicio y término porque la definición de requerimientos parte de la aprobación del Programa de operación, en donde se aprueba la información que contendrá el SICP.

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Descripción del cambio	Justificación de la UR
207	Implementación y operación del Sistema de Información de la Consulta Popular (SICP) 2029	Elaboración de materiales de capacitación para el personal involucrado	Elaborar el Instructivo de Operación del SICP 2021	DEOE	Cambio de fecha de término de 30/05/2021 a 30/06/2021	En virtud que el Instituto no recibirá recursos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el desarrollo de la Consulta Popular, e l proyecto no ha sido aprobado aún por los Órganos Colegiados del Instituto. Por ello aún no se define el presupuesto que se tendrá y el área no está en posibilidad de precisar la cantidad de recursos materiales y humanos que se podrán utilizar para el desarrollo de la actividad.
208	Implementación y operación del Sistema de Información de la Consulta Popular (SICP) 2030	Elaboración de materiales de capacitación para el personal involucrado	Elaborar material de capacitación para Supervisores y supervisoras e instructores e instructoras asistentes de la Consulta Popular	DEOE	Cambio de fecha de término de 30/05/2021 a 30/06/2021	En virtud que el Instituto no recibirá recursos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el desarrollo de la Consulta Popular, e l proyecto no ha sido aprobado aún por los Órganos Colegiados del Instituto. Por ello aún no se define el presupuesto que se tendrá y el área no está en posibilidad de precisar la cantidad de recursos materiales y humanos que se podrán utilizar para el desarrollo de la actividad.

* La actividad número 82, "Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema Sustitución de funcionarios de Mesas Receptoras de Consulta" de la UTSI, tuvo dos cambios, uno de fecha y otro de redacción.

Actividades con solicitud de desincorporación

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Descripción del cambio	Justificación de la UR
60	Gestión de TIC	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema de Administración de Dispositivos Móviles	UTSI	Desincorporación de actividad	El sistema ya no se consideró para operar en la Consulta Popular, conforme los nuevos escenarios de operación y preparación de sistemas.
61	Gestión de TIC	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Liberar el Sistema de Administración de Dispositivos Móviles para pruebas y simulacros	UTSI	Desincorporación de actividad	El sistema ya no se consideró para operar en la Consulta Popular, conforme los nuevos escenarios de operación y preparación de sistemas.
62	Gestión de TIC	Administración de la Operación de soluciones tecnológicas	Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema de Administración de Dispositivos Móviles	UTSI	Desincorporación de actividad	El sistema ya no se consideró para operar en la Consulta Popular, conforme los nuevos escenarios de operación y preparación de sistemas.
63	Gestión de TIC	Administración de la Operación de soluciones tecnológicas	Dar soporte a la operación del Sistema de Administración de Dispositivos Móviles	UTSI	Desincorporación de actividad	A solicitud de DECEyEC el sistema ya no se consideró para operar en la Consulta Popular, conforme los nuevos escenarios de operación y preparación de sistemas.
64	Integración de órganos de recepción de votación	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema de Administración de Materiales para Capacitación Electoral	UTSI	Desincorporación de actividad	A solicitud de DECEyEC el sistema ya no se consideró para operar en la Consulta Popular, conforme los nuevos escenarios de operación y preparación de sistemas.
65	Integración de órganos de recepción de votación	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Liberar el Sistema de Administración de Materiales para Capacitación Electoral para pruebas y simulacros	UTSI	Desincorporación de actividad	A solicitud de DECEyEC el sistema ya no se consideró para operar en la Consulta Popular, conforme los nuevos escenarios de operación y preparación de sistemas.

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Descripción del cambio	Justificación de la UR
66	Integración de órganos de recepción de votación	Administración de la Operación de soluciones tecnológicas	Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema de Administración de Materiales para Capacitación Electoral	UTSI	Desincorporación de actividad	A solicitud de DECEyEC el sistema ya no se consideró para operar en la Consulta Popular, conforme los nuevos escenarios de operación y preparación de sistemas.
67	Integración de órganos de recepción de votación	Administración de la Operación de soluciones tecnológicas	Dar soporte a la operación del Sistema de Administración de Materiales para Capacitación Electoral	UTSI	Desincorporación de actividad	El sistema ya no se consideró para operar en la Consulta Popular, conforme los nuevos escenarios de operación y preparación de sistemas.
68	Integración de órganos de recepción de votación	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Analizar, diseñar y desarrollar la App Supervisores Electorales	UTSI	Desincorporación de actividad	El sistema ya no se consideró para operar en la Consulta Popular, conforme los nuevos escenarios de operación y preparación de sistemas.
69	Integración de órganos de recepción de votación	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Liberar la App Supervisores Electorales para pruebas y simulacros	UTSI	Desincorporación de actividad	El sistema ya no se consideró para operar en la Consulta Popular, conforme los nuevos escenarios de operación y preparación de sistemas.
70	Integración de órganos de recepción de votación	Administración de la Operación de soluciones tecnológicas	Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros de la App Supervisores Electorales	UTSI	Desincorporación de actividad	El sistema ya no se consideró para operar en la Consulta Popular, conforme los nuevos escenarios de operación y preparación de sistemas.
71	Integración de órganos de recepción de votación	Administración de la Operación de soluciones tecnológicas	Dar soporte a la operación de la App Supervisores Electorales	UTSI	Desincorporación de actividad	El sistema ya no se consideró para operar en la Consulta Popular, conforme los nuevos escenarios de operación y preparación de sistemas.
84	Integración de órganos de recepción de votación	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema de Control de calidad de la Segunda Etapa de Capacitación	UTSI	Desincorporación de actividad	El sistema ya no se consideró para operar en la Consulta Popular, conforme los nuevos escenarios de operación y preparación de sistemas.

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Descripción del cambio	Justificación de la UR
85	Integración de órganos de recepción de votación	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Liberar el Sistema de Control de calidad de la Segunda Etapa de Capacitación para pruebas y simulacros	UTSI	Desincorporación de actividad	El sistema ya no se consideró para operar en la Consulta Popular, conforme los nuevos escenarios de operación y preparación de sistemas.
86	Integración de órganos de recepción de votación	Administración de la Operación de soluciones tecnológicas	Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema de Control de calidad de la Segunda Etapa de Capacitación	UTSI	Desincorporación de actividad	El sistema ya no se consideró para operar en la Consulta Popular, conforme los nuevos escenarios de operación y preparación de sistemas.
87	Integración de órganos de recepción de votación	Administración de la Operación de soluciones tecnológicas	Dar soporte a la operación del Sistema de Control de calidad de la Segunda Etapa de Capacitación	UTSI	Desincorporación de actividad	El sistema ya no se consideró para operar en la Consulta Popular, conforme los nuevos escenarios de operación y preparación de sistemas.
88	Integración de órganos de recepción de votación	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema Desempeño de Funcionarios de Mesas Receptoras de Consulta	UTSI	Desincorporación de actividad	El sistema ya no se consideró para operar en la Consulta Popular, conforme los nuevos escenarios de operación y preparación de sistemas.
89	Integración de órganos de recepción de votación	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Liberar el Sistema Desempeño de Funcionarios de Mesas Receptoras de Consulta para pruebas y simulacros	UTSI	Desincorporación de actividad	El sistema ya no se consideró para operar en la Consulta Popular, conforme los nuevos escenarios de operación y preparación de sistemas.
90	Integración de órganos de recepción de votación	Administración de la Operación de soluciones tecnológicas	Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema Desempeño de Funcionarios de Mesas Receptoras de Consulta	UTSI	Desincorporación de actividad	El sistema ya no se consideró para operar en la Consulta Popular, conforme los nuevos escenarios de operación y preparación de sistemas.
91	Integración de órganos de recepción de votación	Administración de la Operación de soluciones tecnológicas	Dar soporte a la operación del Sistema Desempeño de Funcionarios de Mesas Receptoras de Consulta	UTSI	Desincorporación de actividad	El sistema ya no se consideró para operar en la Consulta Popular, conforme los nuevos escenarios de operación y preparación de sistemas.

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Descripción del cambio	Justificación de la UR
96	Gestión de TIC	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Analizar, diseñar y desarrollar la APP INE	UTSI	Desincorporación de actividad	El sistema ya no se consideró para operar en la Consulta Popular, conforme los nuevos escenarios de operación y preparación de sistemas.
97	Gestión de TIC	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Liberar la APP INE para pruebas y simulacros	UTSI	Desincorporación de actividad	El sistema ya no se consideró para operar en la Consulta Popular, conforme los nuevos escenarios de operación y preparación de sistemas.
98	Gestión de TIC	Administración de la Operación de soluciones tecnológicas	Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros de la APP INE	UTSI	Desincorporación de actividad	El sistema ya no se consideró para operar en la Consulta Popular, conforme los nuevos escenarios de operación y preparación de sistemas.
99	Gestión de TIC	Administración de la Operación de soluciones tecnológicas	Dar soporte a la operación de la APP INE	UTSI	Desincorporación de actividad	El sistema ya no se consideró para operar en la Consulta Popular, conforme los nuevos escenarios de operación y preparación de sistemas.

Actividades con solicitud de incorporación

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Descripción del cambio	Justificación de la UR
210	Gestión de TIC	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema de Resultados y Validez de los Cómputos	UTSI	Incorporación de actividad	A solicitud de DEOE se incorpora el sistema para operar en la Consulta Popular, conforme los nuevos escenarios de operación.
211	Gestión de TIC	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Liberar el Sistema de Resultados y Validez de los Cómputos para pruebas y simulacros	UTSI	Incorporación de actividad	A solicitud de DEOE se incorpora el sistema para operar en la Consulta Popular, conforme los nuevos escenarios de operación.
212	Gestión de TIC	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema de Resultados y Validez de los Cómputos	UTSI	Incorporación de actividad	A solicitud de DEOE se incorpora el sistema para operar en la Consulta Popular, conforme los nuevos escenarios de operación.
213	Gestión de TIC	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Dar soporte a la operación del Sistema de Resultados y Validez de los Cómputos	UTSI	Incorporación de actividad	A solicitud de DEOE se incorpora el sistema para operar en la Consulta Popular, conforme los nuevos escenarios de operación.

Fuente: Elaborado por la Dirección del Secretariado, con base en información proporcionada por las UR, al 21 de mayo de 2021.
