Informe final sobre el avance en la implementación y puesta en producción de los sistemas para los Procesos Electorales Locales 2022-2023

UTSI

Control de versiones

Versión	Descripción	Fecha
v1.0	Informe final sobre el avance en la implementación y puesta en producción de los sistemas para los Procesos Electorales Locales 2022-2023.	20/07/2023
v1.1	Informe final sobre el avance en la implementación y puesta en producción de los sistemas para los Procesos Electorales Locales 2022-2023, actualizado al 16 de agosto de 2023, detallando lo siguiente: Página 4: Actualización del alcance del informe. Páginas 5-6, 18: Actualización de estatus de los sistemas que cerraron operación después de la fecha de corte.	17/08/2023

Nota: El número de versión corresponde a los ajustes o actualizaciones realizadas al informe, un documento por periodo reportado, siendo éste progresivo y se reinicia en el siguiente informe.

Generales **4**

Objetivo **4**

Alcance **4**

Estado final de los sistemas reportados para los Procesos Electorales Locales 2022 – 2023. 5

Resumen de los informes presentados durante los Procesos Electorales Locales 2022 - 2023 ..... **9**

Periodo comprendido entre el 1 de septiembre al 9 de octubre de 2022. 9

Periodo comprendido entre el 10 de octubre al 6 de noviembre de 2022. 10

Periodo comprendido entre el 7 de noviembre al 4 de diciembre de 2022. 11

Periodo comprendido entre el 5 de diciembre de 2022 al 8 de enero de 2023. 12

Periodo comprendido entre el 9 de enero al 5 de febrero de 2023. 13

Periodo comprendido entre el 6 de febrero al 5 de marzo de 2023. 14

Periodo comprendido entre el 6 de marzo al 4 de abril de 2023. 15

Periodo comprendido entre el 5 de abril al 14 de mayo de 2023. 16

Periodo comprendido entre el 15 de mayo al 4 de junio de 2023. 17

Periodo comprendido entre el 5 de junio al 16 de julio de 2023. 18

Generales

Objetivo

Informar, de forma resumida, el estado de avance que se tuvo en la implementación de los sistemas informáticos de las Unidades Responsables (UR) requirentes, y las UR que se encuentran a cargo del desarrollo, actualización e implementación de dichos sistemas.

Alcance

Se realiza un resumen de lo que fue reportado a lo largo de los Procesos Electorales Locales 2022 - 2023, e integra información del periodo del **1 de septiembre de 2022 al 16 de julio de 2023**.

Este informe fue presentado el 25 de julio de 2023 en el marco del Grupo de Trabajo en materia de Sistemas de la Comisión de Temporal de Seguimiento a los Procesos Electorales Locales 2022-2023 (COTSPEL), y se realiza una actualización del informe final al día 16 de agosto de 2023, en términos generales las actualizaciones versan sobre:

- Actualización de estatus de los sistemas que cerraron operación después de la fecha de corte.

Estado final de los sistemas reportados para los Procesos Electorales Locales 2022 – 2023.

En la siguiente gráfica se muestra el estatus final de los sistemas implementados:

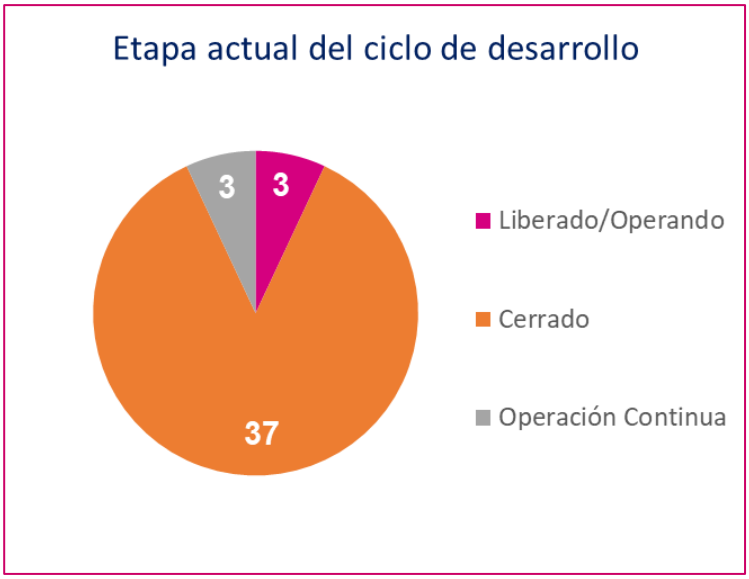

Imagen 1. Estatus final de los sistemas para el Proceso Electoral Local 2022 - 2023

Nota: Al día 16 de agosto de 2023, cerraron 2 sistemas después de la fecha de corte: Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla, Documentos y Materiales Electorales OPL.

Desglose por Unidad Responsable:

Unidad Responsable	Sistemas					
	Total	Liberado/ Operando	En pruebas	En actualización	Sin iniciar	Cerrados (sólo consulta)
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)	**20**	2				18
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE)	**10**	2				8
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPyPP)	**2**	1				1
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE)	**5**					5
Unidad Técnica de Fiscalización (UTF)	**4**					4
Unidad Técnica de Servicios de Informática (UTSI)	**2**	1				1
Totales	**43**	**6**	**0**	**0**	**0**	**37**

Tabla 1. Desglose de sistemas informáticos por UR

Nota: Al día 16 de agosto de 2023, cerraron 2 sistemas después de la fecha de corte: Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla, Documentos y Materiales Electorales OPL.

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica.

Gráfica 1. Estado actual del avance de los sistemas de DECEyEC

Nota: Al día 16 de agosto de 2023, se encuentra cerrado el sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla.

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral.

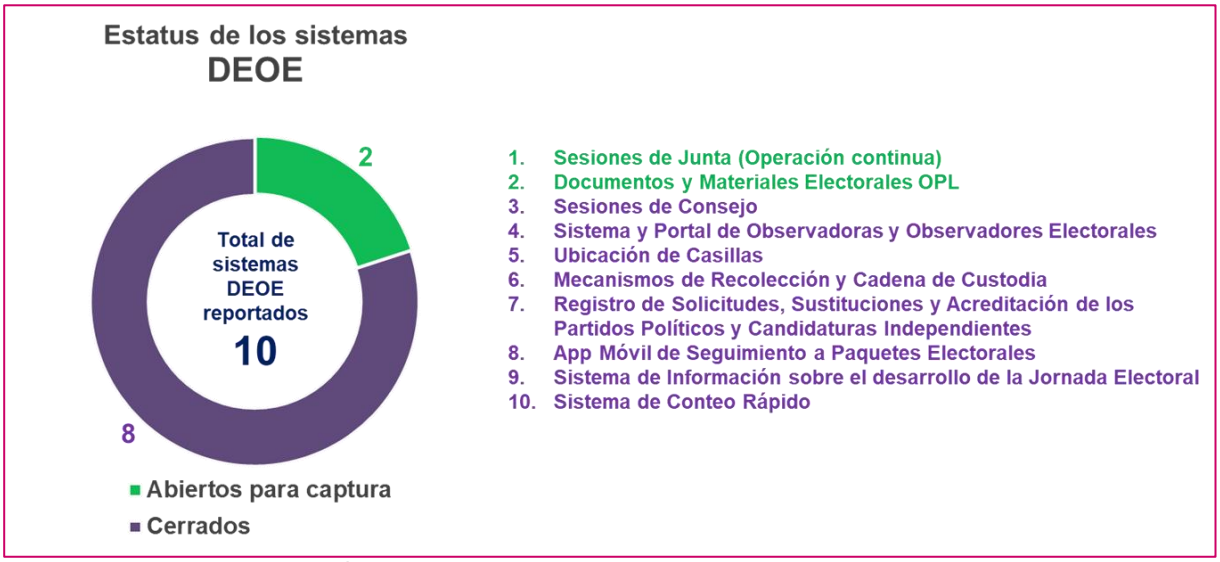

Gráfica 2. Estado actual del avance de los sistemas de DEOE

Nota: Al día 16 de agosto de 2023, se encuentra cerrado el sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL.

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos.

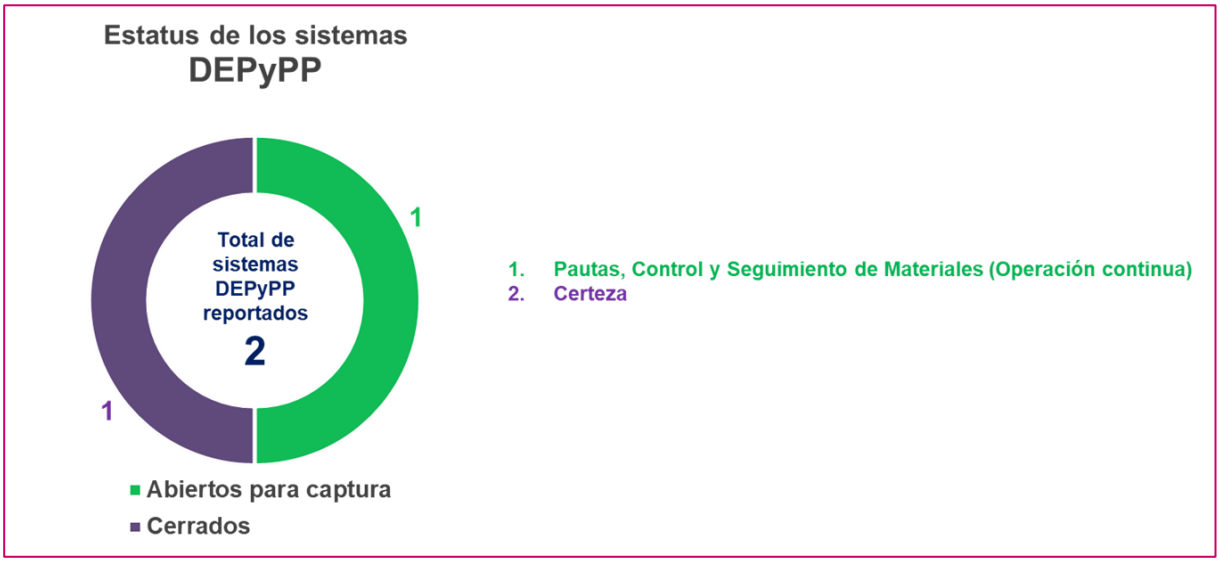

Gráfica 3. Estado actual del avance de los sistemas de DEPyPP

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores.

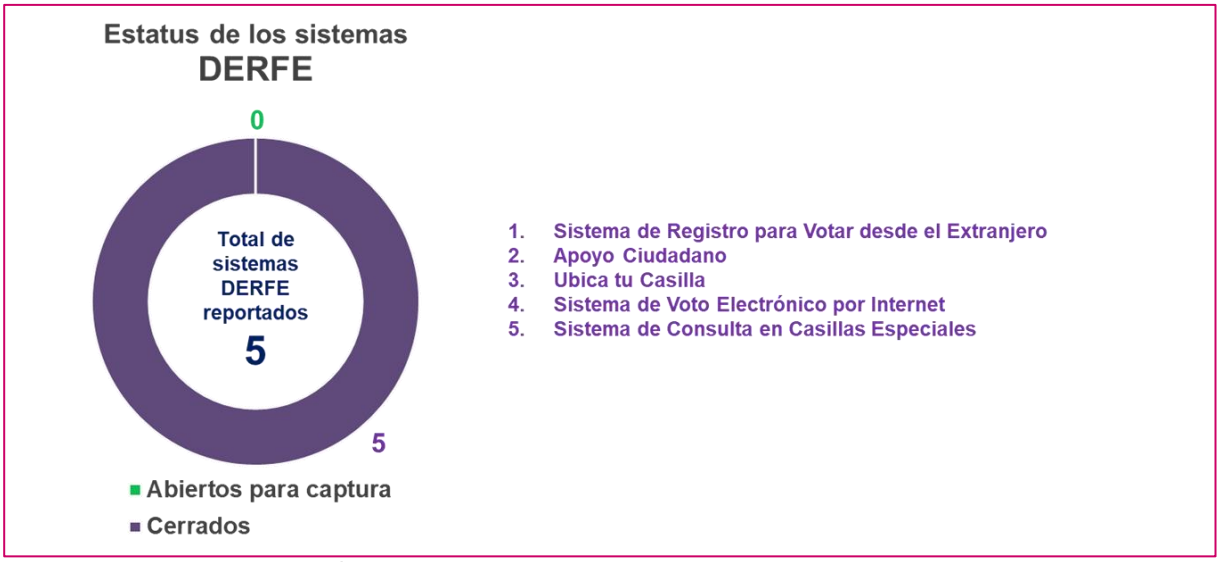

Gráfica 4. Estado actual del avance de los sistemas de DERFE

Unidad Técnica de Fiscalización.

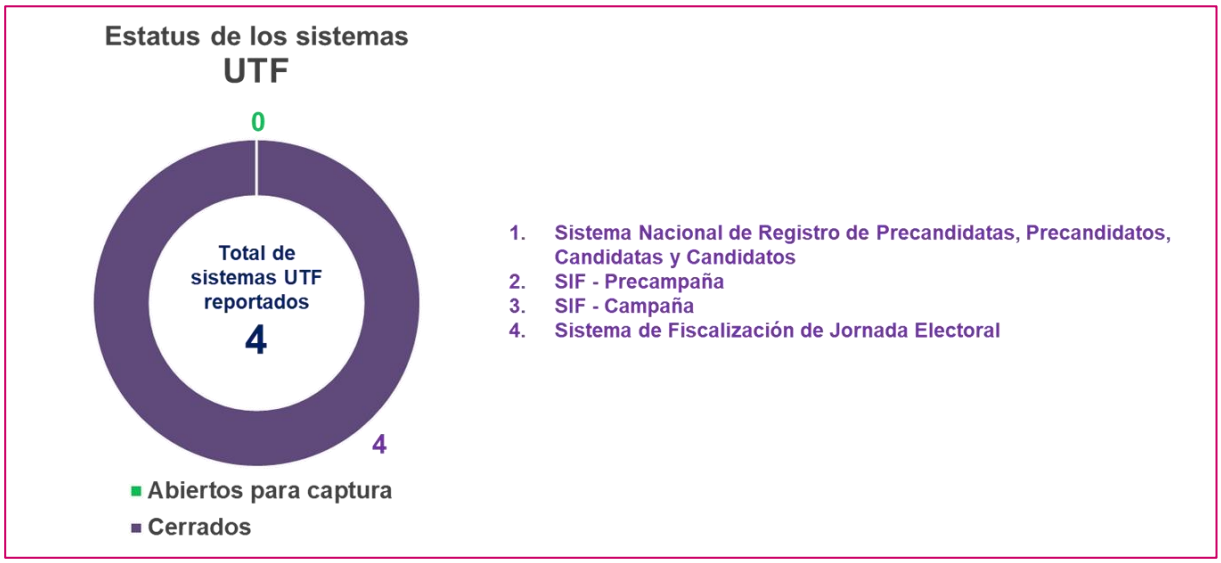

Gráfica 5. Estado actual del avance de los sistemas de UTF

Unidad Técnica de Servicios de Informática (UTSI).

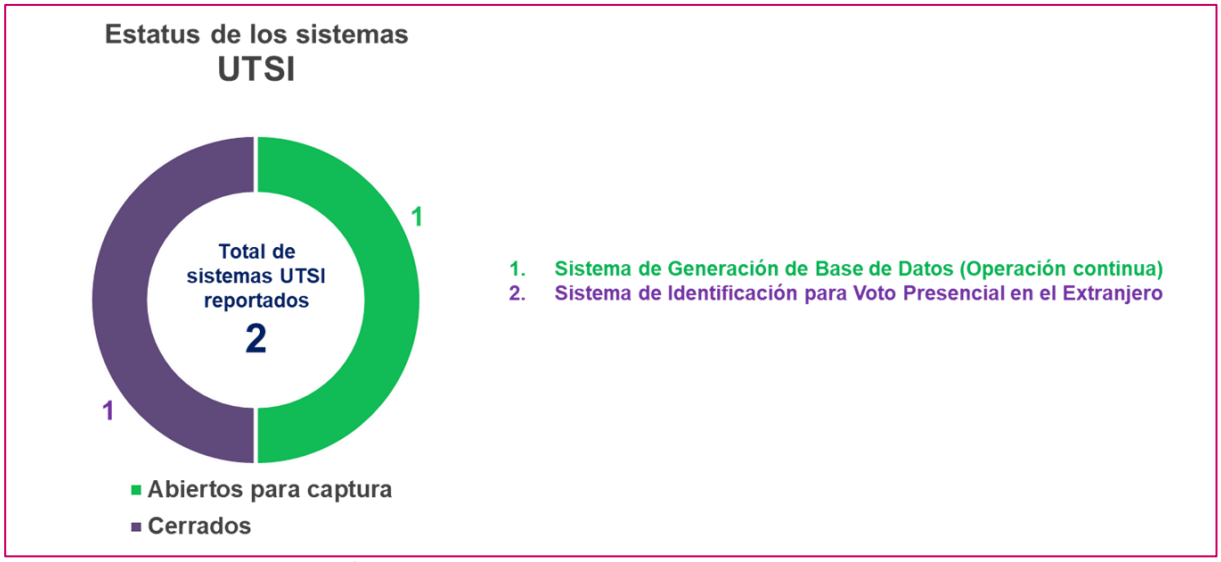

Gráfica 6. Estado actual del avance de los sistemas de UTSI

Resumen de los informes presentados durante los Procesos Electorales Locales 2022 - 2023

Periodo comprendido entre el 1 de septiembre al 9 de octubre de 2022.

Entre las actividades reportadas destacaron las siguientes:

Se reportó el avance en la implementación y puesta en producción de 43 sistemas informáticos a cargo del INE para los Procesos Electorales Locales 2022 - 2023. Para este informe se reportaron nueve sistemas en operación, seis entraron en operación en el periodo y tres son de operación continua; además 17 sistemas se encontraban en actualización, 15 sin iniciar su desarrollo y dos se encontraban en pruebas.

Imagen 1. Estatus de los sistemas para el Proceso Electoral Local 2022 – 2023, primer informe

El informe dio cuenta del cumplimiento de los requerimientos de cada sistema, las fechas críticas, así como, el soporte brindado a los sistemas en operación (8 solicitudes atendidas por CAU), el avance de los sistemas que se encontraban en preparación para su puesta en producción y una incidencia reportada por el área requirente. Los sistemas con mayores accesos por los usuarios, durante el periodo reportado, fueron:

- Sesiones de Junta
- Sistema de Registro para Votar desde el Extranjero
- Documento y Materiales OPL
- Sistema de Generación de Base de Datos

Periodo comprendido entre el 10 de octubre al 6 de noviembre de 2022.

Entre las actividades reportadas destacaron las siguientes:

Se reportó el avance en la implementación y puesta en producción de 43 sistemas informáticos a cargo del INE para los Procesos Electorales Locales 2022 - 2023. Para este informe se reportaron 14 sistemas en operación, cinco entraron en operación en el periodo y tres son de operación continua; además 15 sistemas se encontraban en actualización, 13 sin iniciar su desarrollo y uno se encontraba en pruebas.

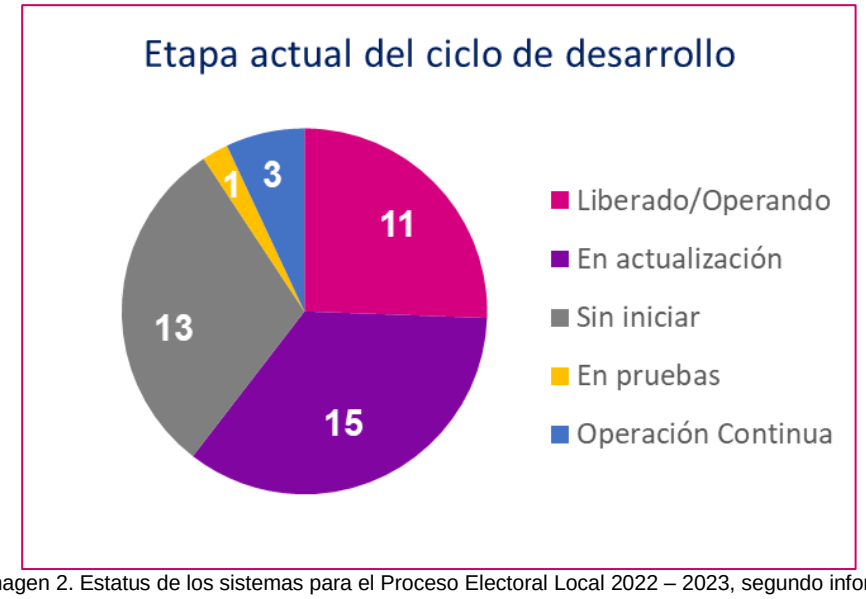

Imagen 2. Estatus de los sistemas para el Proceso Electoral Local 2022 – 2023, segundo informe

El informe dio cuenta del cumplimiento de los requerimientos de cada sistema, las fechas críticas, así como, el soporte brindado a los sistemas en operación (61 solicitudes atendidas por CAU), el avance de los sistemas que se encontraban en preparación para su puesta en producción y 12 incidencias reportadas por el área requirente. Los sistemas con mayores accesos por los usuarios, durante el periodo reportado, fueron:

- Reclutamiento en Línea
- Sesiones de Junta
- Sistema de Registro para Votar desde el Extranjero
- Sistema de Generación de Base de Datos

Periodo comprendido entre el 7 de noviembre al 4 de diciembre de 2022.

Entre las actividades reportadas destacaron las siguientes:

Se reportó el avance en la implementación y puesta en producción de 43 sistemas informáticos a cargo del INE para los Procesos Electorales Locales 2022 - 2023. Para este informe se reportaron 14 sistemas en operación, ningún sistema entró en operación en el periodo y tres son de operación continua; además 14 sistemas se encontraban en actualización, 13 sin iniciar su desarrollo y dos se encontraban en pruebas.

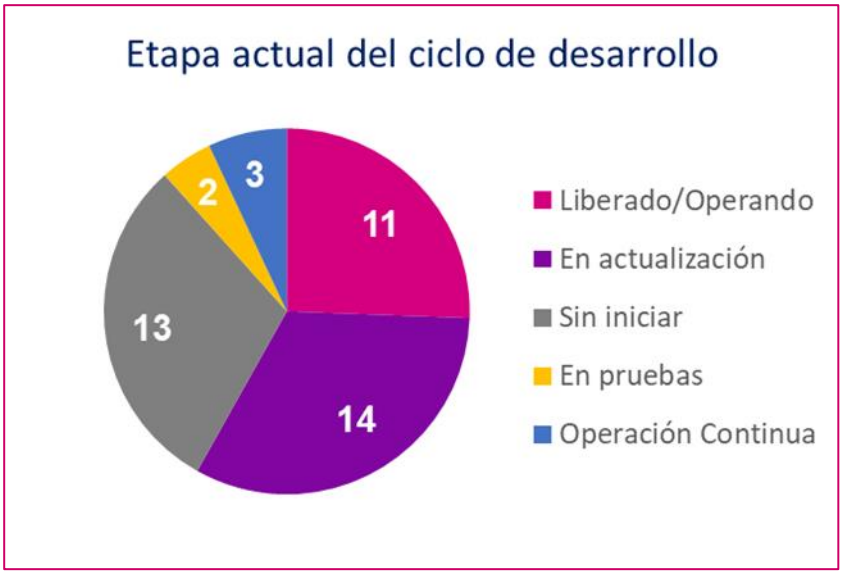

Imagen 3. Estatus de los sistemas para el Proceso Electoral Local 2022 – 2023, tercer informe

El informe dio cuenta del cumplimiento de los requerimientos de cada sistema, las fechas críticas, así como, el soporte brindado a los sistemas en operación (222 solicitudes atendidas por CAU), el avance de los sistemas que se encontraban en preparación para su puesta en producción y 20 incidencias reportadas por el área requirente. Los sistemas con mayores accesos por los usuarios, durante el periodo reportado, fueron:

- Reclutamiento en Línea
- Sesiones de Junta
- Observadoras y Observadores Electorales
- Sistema de Registro para Votar desde el Extranjero

Periodo comprendido entre el 5 de diciembre de 2022 al 8 de enero de 2023.

Entre las actividades reportadas destacaron las siguientes:

Se reportó el avance en la implementación y puesta en producción de 43 sistemas informáticos a cargo del INE para los Procesos Electorales Locales 2022 - 2023. Para este informe se reportaron 18 sistemas en operación, cuatro sistemas entraron en operación en el periodo y tres son de operación continua; además 12 sistemas se encontraban en actualización y 13 sin iniciar su desarrollo.

Imagen 4. Estatus de los sistemas para el Proceso Electoral Local 2022 – 2023, cuarto informe

El informe dio cuenta del cumplimiento de los requerimientos de cada sistema, las fechas críticas, así como, el soporte brindado a los sistemas en operación (176 solicitudes atendidas por CAU), el avance de los sistemas que se encontraban en preparación para su puesta en producción y 34 incidencias reportadas por el área requirente. Los sistemas con mayores accesos por los usuarios, durante el periodo reportado, fueron:

- Reclutamiento en Línea
- Sesiones de Junta
- Observadoras y Observadores Electorales
- Ubicación de Casillas

Periodo comprendido entre el 9 de enero al 5 de febrero de 2023.

Entre las actividades reportadas destacaron las siguientes:

Se reportó el avance en la implementación y puesta en producción de 43 sistemas informáticos a cargo del INE para los Procesos Electorales Locales 2022 - 2023. Para este informe se reportaron 20 sistemas en operación, dos sistemas entraron en operación en el periodo y tres son de operación continua; además 15 sistemas se encontraban en actualización, tres sin iniciar su desarrollo y cinco se encontraban en pruebas.

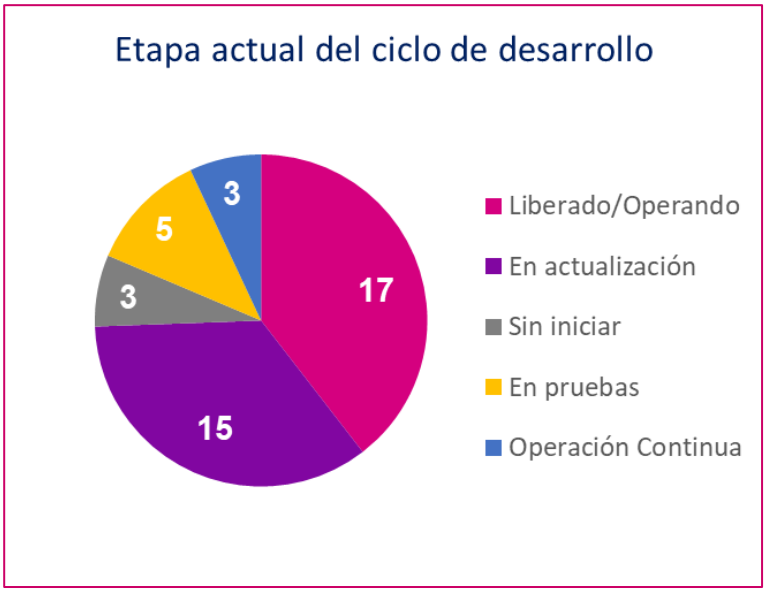

Imagen 5. Estatus de los sistemas para el Proceso Electoral Local 2022 – 2023, quinto informe

El informe dio cuenta del cumplimiento de los requerimientos de cada sistema, las fechas críticas, así como, el soporte brindado a los sistemas en operación (173 solicitudes atendidas por CAU), el avance de los sistemas que se encontraban en preparación para su puesta en producción y 36 incidencias reportadas por el área requirente. Los sistemas con mayores accesos por los usuarios, durante el periodo reportado, fueron:

- SIF - Precampaña
- Observadoras y Observadores Electorales
- Sesiones de Junta
- Ubicación de Casillas

Periodo comprendido entre el 6 de febrero al 5 de marzo de 2023.

Entre las actividades reportadas destacaron las siguientes:

Se reportó el avance en la implementación y puesta en producción de 43 sistemas informáticos a cargo del INE para los Procesos Electorales Locales 2022 - 2023. Para este informe se reportaron 25 sistemas en operación, cinco sistemas entraron en operación en el periodo y tres son de operación continua; además 14 sistemas se encontraban en actualización, tres sin iniciar su desarrollo y uno se encontraba cerrado sólo para consulta.

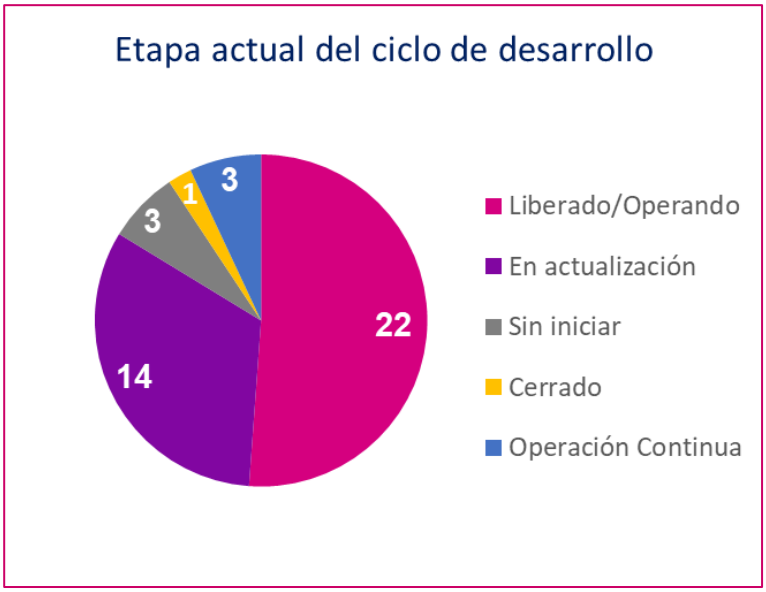

Imagen 6. Estatus de los sistemas para el Proceso Electoral Local 2022 – 2023, sexto informe

El informe dio cuenta del cumplimiento de los requerimientos de cada sistema, las fechas críticas, así como, el soporte brindado a los sistemas en operación (365 solicitudes atendidas por CAU), el avance de los sistemas que se encontraban en preparación para su puesta en producción y seis incidencias reportadas por el área requirente. Los sistemas con mayores accesos por los usuarios, durante el periodo reportado, fueron:

- Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación
- SIF - Precampaña
- Observadoras y Observadores Electorales
- Sesiones de Junta

Periodo comprendido entre el 6 de marzo al 4 de abril de 2023.

Entre las actividades reportadas destacaron las siguientes:

Se reportó el avance en la implementación y puesta en producción de 43 sistemas informáticos a cargo del INE para los Procesos Electorales Locales 2022 - 2023. Para este informe se reportaron 23 sistemas en operación, un sistema entró en operación en el periodo y tres son de operación continua; además ocho sistemas se encontraban en actualización, dos sin iniciar su desarrollo, seis sistemas se encontraban en pruebas y cuatro se encontraban cerrados sólo para consulta.

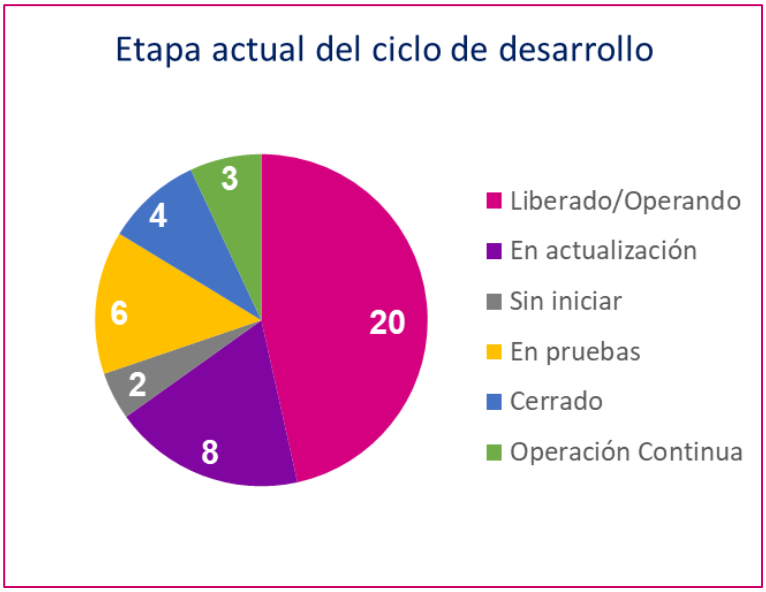

Imagen 7. Estatus de los sistemas para el Proceso Electoral Local 2022 – 2023, séptimo informe

El informe dio cuenta del cumplimiento de los requerimientos de cada sistema, las fechas críticas, así como, el soporte brindado a los sistemas en operación (316 solicitudes atendidas por CAU), el avance de los sistemas que se encontraban en preparación para su puesta en producción y dos incidencias reportadas por el área requirente. Los sistemas con mayores accesos por los usuarios, durante el periodo reportado, fueron:

- Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación
- Observadoras y Observadores Electorales
- Sesiones de Junta
- Ubicación de Casillas

Periodo comprendido entre el 5 de abril al 14 de mayo de 2023.

Entre las actividades reportadas destacaron las siguientes:

Se reportó el avance en la implementación y puesta en producción de 43 sistemas informáticos a cargo del INE para los Procesos Electorales Locales 2022 - 2023. Para este informe se reportaron 28 sistemas en operación, seis sistemas entraron en operación en el periodo y tres son de operación continua; además un sistema se encontraba en actualización, nueve sistemas se encontraban en pruebas y cinco se encontraban cerrados sólo para consulta.

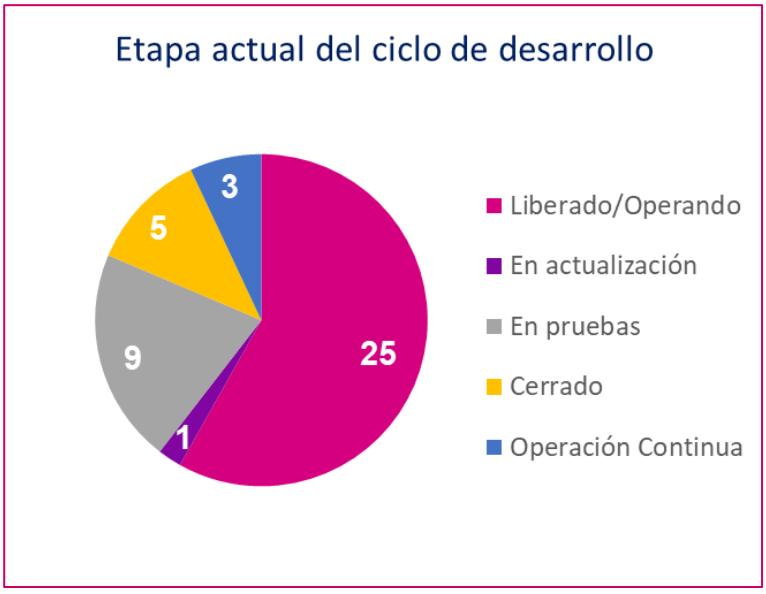

Imagen 8. Estatus de los sistemas para el Proceso Electoral Local 2022 – 2023, octavo informe

El informe dio cuenta del cumplimiento de los requerimientos de cada sistema, las fechas críticas, así como, el soporte brindado a los sistemas en operación (740 solicitudes atendidas por CAU), el avance de los sistemas que se encontraban en preparación para su puesta en producción y tres incidencias reportadas por el área requirente. Los sistemas con mayores accesos por los usuarios, durante el periodo reportado, fueron:

- Observadoras y Observadores Electorales
- SIF - Campaña
- Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación
- Sustitución de Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla

Periodo comprendido entre el 15 de mayo al 4 de junio de 2023.

Entre las actividades reportadas destacaron las siguientes:

Se reportó el avance en la implementación y puesta en producción de 43 sistemas informáticos a cargo del INE para los Procesos Electorales Locales 2022 - 2023. Para este informe se reportaron 18 sistemas en operación, nueve sistemas entraron en operación en el periodo y tres son de operación continua; además un sistema se encontraba en pruebas y 24 se encontraban cerrados sólo para consulta.

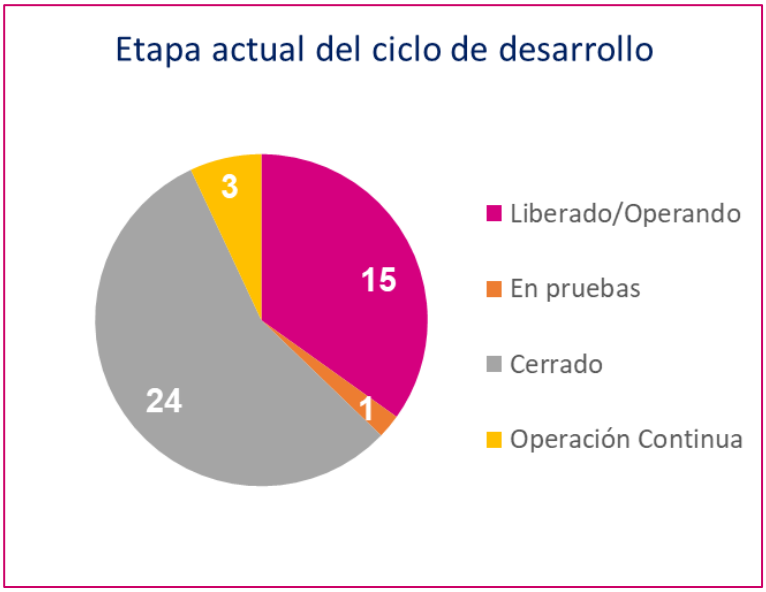

Imagen 9. Estatus de los sistemas para el Proceso Electoral Local 2022 – 2023, noveno informe

El informe dio cuenta del cumplimiento de los requerimientos de cada sistema, las fechas críticas, así como, el soporte brindado a los sistemas en operación (366 solicitudes atendidas por CAU), el avance de los sistemas que se encontraban en preparación para su puesta en producción y 10 incidencias reportadas por el área requirente. Los sistemas con mayores accesos por los usuarios, durante el periodo reportado, fueron:

- Observadoras y Observadores Electorales
- Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de Representantes de PP y CI
- SIF - Campaña
- Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación

Periodo comprendido entre el 5 de junio al 16 de julio de 2023.

Entre las actividades reportadas destacaron las siguientes:

Se reportó el avance en la implementación y puesta en producción de 43 sistemas informáticos a cargo del INE para los Procesos Electorales Locales 2022 - 2023. Para este informe se reportaron seis sistemas en operación, un sistema entró en operación en el periodo y tres son de operación continua; además 37 sistemas se encuentran cerrados sólo para consulta.

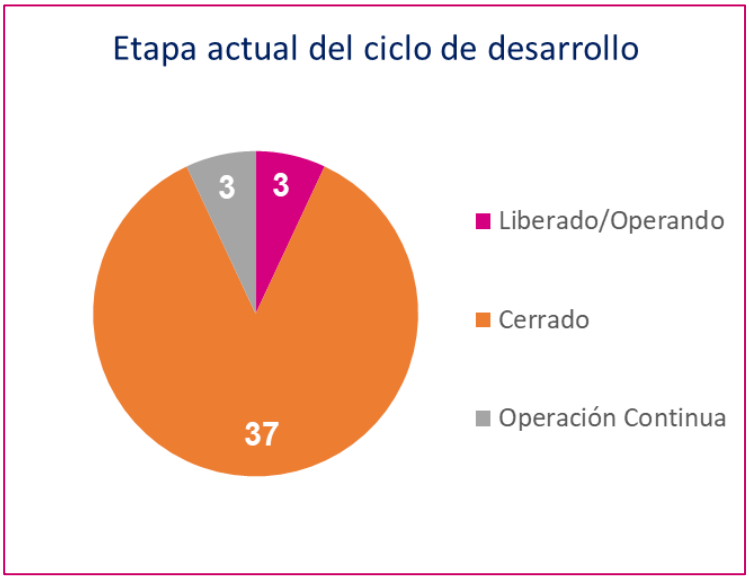

Imagen 10. Estatus de los sistemas para el Proceso Electoral Local 2022 – 2023, décimo informe

Nota: Al día 16 de agosto de 2023, cerraron 2 sistemas después de la fecha de corte: Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla, Documentos y Materiales Electorales OPL.

El informe dio cuenta del cumplimiento de los requerimientos de cada sistema, las fechas críticas, así como, el soporte brindado a los sistemas en operación (459 solicitudes atendidas por CAU), y no se presentaron incidencias reportadas por el área requirente. Los sistemas con mayores accesos por los usuarios, durante el periodo reportado, fueron:

- SIF - Campaña
- Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral
- Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla
- Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores
