



Segundo Informe parcial del Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

**Actividades correspondientes al
periodo del 10/10/2020 al 06/11/2020**

Índice de contenido

Introducción	2
1. Análisis cuantitativo	3
1.1. Actividades concluidas, totales y por UR	3
1.1.1. Número de actividades concluidas en tiempo	4
1.1.2. Número de actividades concluidas fuera de tiempo	5
1.2. Actividades en ejecución, totales y por UR	5
1.2.1. Número de actividades en tiempo	6
1.2.2. Número de actividades retrasadas	7
1.2.3 Número de actividades desfasadas	8
1.3. Actividades próximas a concluir, totales y por UR	9
1.4. Actividades por iniciar, totales y por UR	9
1.5. Inconvenientes, totales y por UR	10
2. Análisis cualitativo	10
3. Consideraciones finales	14
ANEXO 1.....	11
ANEXO 2.....	21
ANEXO 3.....	41

Segundo Informe parcial del Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021. Actividades correspondientes al periodo del 10/10/2020 al 06/11/2020

Introducción

Se hace referencia a que el primer informe parcial fue presentado en Sesión Ordinaria del Consejo General (CG) el 28 de octubre de 2020, mismo que se elaboró con información del avance de actividades correspondientes del periodo del 23 de septiembre al 9 de octubre de 2020.

Este segundo informe parcial que se presenta se elaboró con información reportada por las Unidades Responsables (UR) mediante el aplicativo de captura y recopilada en la base de datos del periodo del 10 de octubre al 06 de noviembre de 2020.


El Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021 (PIYCPEF 20-21) aprobado por el CG en sesión del 26 de agosto de 2020, se conformó por 617 actividades, pero es importante señalar que derivado del seguimiento de las actividades del PEF 2020-2021, se realizó un análisis de los acuerdos emitidos por el CG y que guardan relación con el proceso electoral, lo cual permitió la detección de actividades adicionales ordenadas en dichos acuerdos y esto permitió dar origen a la incorporación de **5** actividades para su seguimiento correspondiente por las distintas UR.

Lo anterior, permite llevar un control de las actividades en la etapa de preparación de la Jornada Electoral, por lo que el presente informe da cuenta del seguimiento y reporte de 622 actividades.

Actividades correspondientes al periodo del 10/10/2020 al 06/11/2020

1. Análisis cuantitativo

El PiyCPEF 2020-2021 se integra con un total de 622 actividades, cuyo avance general es el siguiente:

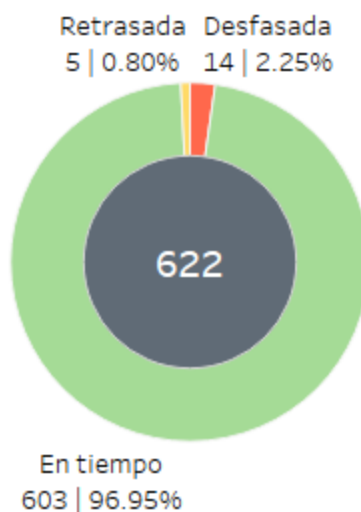

1.1. Actividades concluidas, totales y por UR.


De las 622 actividades que integran el PiyCPEF 2020-2021, se han concluido 103 actividades, lo que representa 16.56 por ciento del total de actividades programadas. El desglose por UR se detalla en el Cuadro 1.

Cuadro 1. Distribución del número de actividades concluidas, por UR y por periodo

Unidad Responsable	Total	CAI	DECEYEC	DEOE	DEPPP	DERFE	DESPEN	UTF	UTSI	UTYPDP
Total concluidas	103	3	7	24	33	4	8	6	17	1
Primer informe parcial	71	2	6	17	19	3	7	0	16	1
Segundo informe parcial	32	1	1	7	14	1	1	6	1	0

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento (DPS) de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), con base en información proporcionada por las UR, al 06 de noviembre de 2020.

Gráfica 1. Distribución del número de actividades concluidas, por UR

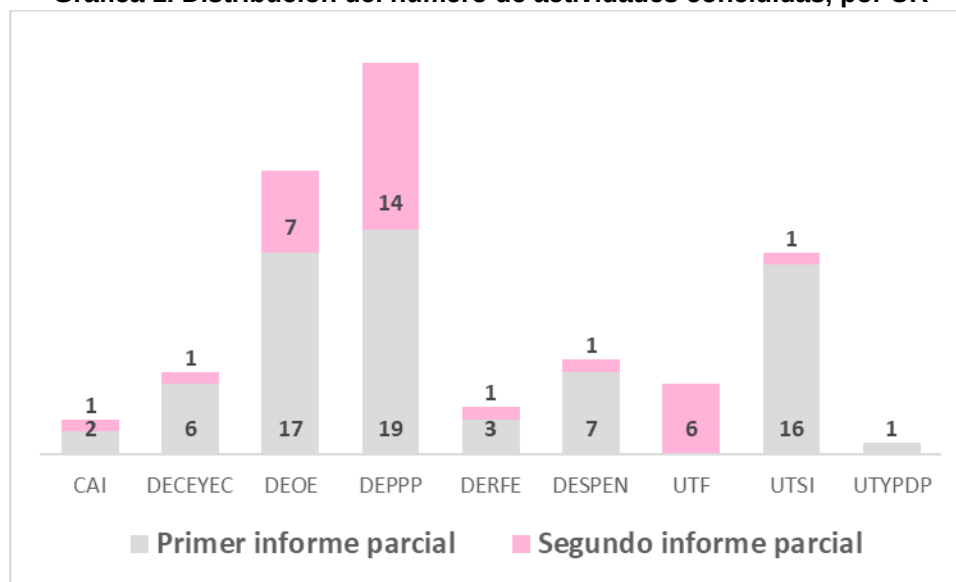

Ver detalle en anexo 1.

Dentro del periodo que se reporta en el presente informe concluyeron 32 actividades, de las cuales ya se encuentran alojados los entregables correspondientes dentro de la plataforma Sharepoint.

1.1.1. Número de actividades concluidas en tiempo

Las 103 actividades concluidas, 101 se cumplieron en los plazos establecidos. En el cuadro 2 se observa el número de actividades concluidas en tiempo por UR.

Cuadro 2. Total de actividades concluidas en tiempo por UR

Unidad Responsable	Total	CAI	DECEYEC	DEOE	DEPPP	DERFE	DESPEN	UTF	UTSI	UTYPDP
Actividades concluidas en tiempo	101	3	7	22	33	4	8	6	17	1

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento (DPS) de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), con base en información proporcionada por las UR, al 06 de noviembre de 2020.

1.1.2. Número de actividades concluidas fuera de tiempo

De las 103 actividades concluidas, se identificaron dos que concluyeron fuera de los periodos establecidos. En el cuadro 3, se presentan el detalle por el que se presentó la situación.

Cuadro 3. Distribución del número de actividades concluidas fuera de tiempo, por UR

Unidad responsable	Actividad	Inicio	Término	Valoración de la UR
DEOE	202. Aprobar el Acuerdo por el CG, del líquido indeleble que se utilizará para impregnar el dedo pulgar derecho de los electores durante la Jornada Electoral	02/09/2020	16/10/2020	El CG del INE aprobó el acuerdo del líquido indeleble a utilizar en la jornada electoral del 6 de junio de 2021, en la sesión ordinaria del 28/10/2020.
DEOE	490. Dar seguimiento a las reuniones de trabajo con las y los integrantes del CG del INE para conocer las observaciones formuladas por los representantes de los Partidos Políticos y los consejeros del Poder Legislativo del CG del INE	05/10/2020	09/10/2020	El acuerdo INE/CG512/2020 fue aprobado por el CG, el 28/10/2020.

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento (DPS) de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), con base en información proporcionada por las UR, al 06 de noviembre de 2020.


1.2. Actividades en ejecución, totales y por UR.

De las 622 actividades que integran el PlyCPEF 2020-2021, se encuentran en ejecución 154 actividades, lo que representa 24.76 por ciento, respecto al total de actividades programadas. El desglose por UR se detalla en el Cuadro 4.

Cuadro 4. Distribución del número de actividades en ejecución, por UR

Unidad Responsable	Total	CAI	CNCS	DEA	DECEYEC	DEOE	DEPPP	DERFE	DESPEN	DJ	UTCE	UTF	UTIGYND	UTSI	SE
Actividades en ejecución	154	9	2	3	15	34	14	18	3	4	10	9	1	31	1

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento (DPS) de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), con base en información proporcionada por las UR, al 06 de noviembre de 2020.

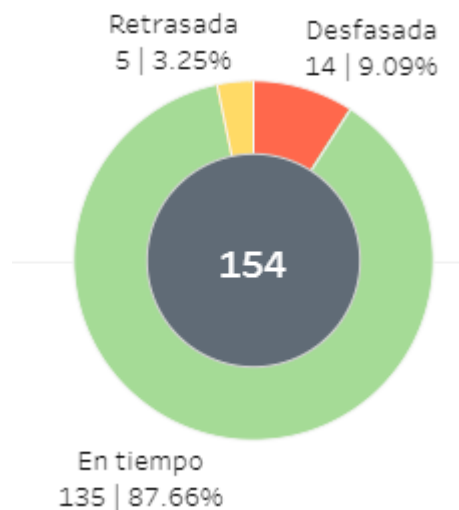


1.2.1. Número de actividades en tiempo

De las 154 actividades que se encuentran en ejecución, 135 se encuentran en desarrollo conforme a los tiempos establecidos. El número de actividades que se encuentran en ejecución y en tiempo se presenta el cuadro 5.

Cuadro 5. Distribución del número de actividades que se desarrollan conforme a los tiempos establecidos, por UR

Unidad Responsable	Total	CAI	CNCS	DEA	DECEYEC	DEOE	DEPPP	DERFE	DJ	UTCE	UTF	UTIGYND	UTSI	SE
Actividades en tiempo	135	8	1	3	12	31	14	18	4	10	6	1	26	1

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento (DPS) de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), con base en información proporcionada por las UR, al 06 de noviembre de 2020.

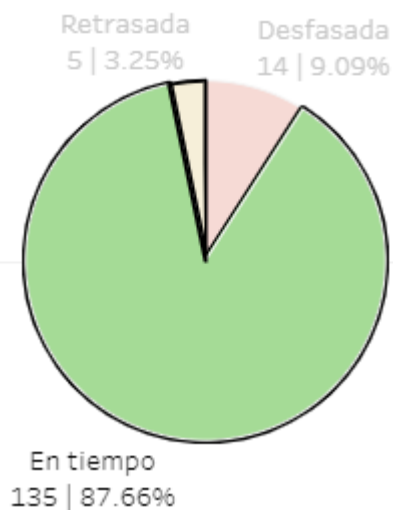

1.2.2. Número de actividades retrasadas


De las 154 actividades que se encuentran en ejecución, 5 se encuentran retrasadas conforme a los tiempos establecidos.

En el cuadro 6, se presentan el número de actividades reportadas en ejecución que se encuentran retrasadas.

Cuadro 6. Distribución del número de actividades retrasadas, por UR

Unidad Responsable	Total	CAI	DECEYEC	DESPEN
Actividades retrasadas	5	1	3	1

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento (DPS) de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), con base en información proporcionada por las UR, al 06 de noviembre de 2020.

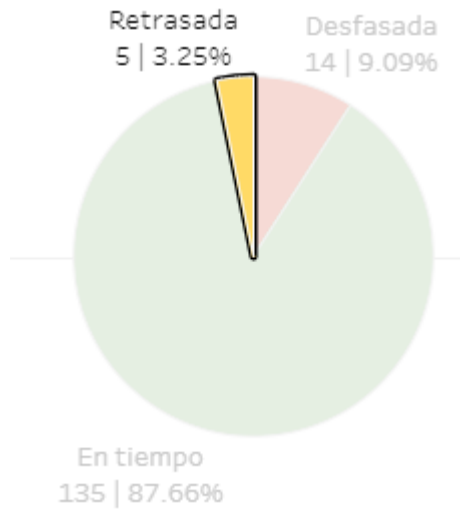

Ver detalle en anexo 2.


1.2.3 Número de actividades desfasadas

De las 154 actividades que se encuentran en desarrollo, 14 se ejecutan con desfase, de las cuales, 10 ha finalizado el periodo de ejecución establecido y están próximas a concluir. En el cuadro 7, se presentan el número de actividades reportadas en ejecución que se encuentran desfasadas.

Cuadro 7. Distribución del número de actividades desfasadas, por UR

Unidad Responsable	Total	CNCS	DEOE	DESPEN	UTF	UTSI
Actividades desfasadas	14	1	3	2	3	5

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento (DPS) de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), con base en información proporcionada por las UR, al 06 de noviembre de 2020.

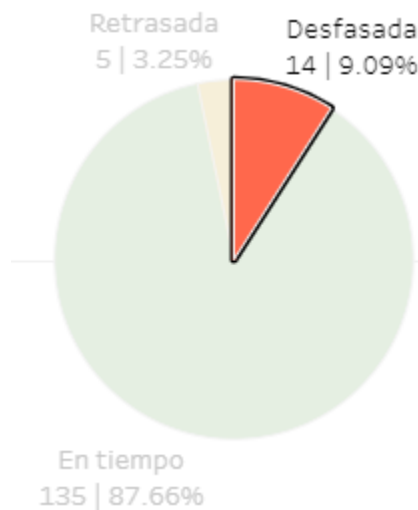

Ver detalle en anexo 2.

1.3. Actividades próximas a concluir, totales y por UR

De las 154 actividades en ejecución, 14 se encuentran próximas a concluir. A continuación, en el cuadro 8, se desglosan las actividades próximas a concluir por UR en el horizonte al 26 de noviembre de 2020.

Cuadro 8. Distribución del número de actividades próximas a concluir, por UR

Unidad Responsable	Total	DECEYEC	DEPPP	DERFE	UTF
Actividades próximas a concluir	14	2	7	1	4

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento (DPS) de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), con base en información proporcionada por las UR, al 06 de noviembre de 2020.

1.4. Actividades por iniciar, totales y por UR

De las 622 actividades que integran el PlyCPEF 2020-2021, 13 se encuentran próximas a iniciar su ejecución en el horizonte al 26 de noviembre de 2020, lo que representa 2.09 por ciento del total de actividades programadas. El cuadro 9, presenta las actividades próximas a iniciar por UR.

Cuadro 9. Distribución del número de actividades por iniciar su ejecución, por UR

Unidad Responsable	Total	DECEYEC	DEOE	DEPPP	DERFE	UTF	UTSI
Actividades próximas por iniciar	13	3	1	6	1	1	1

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento (DPS) de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), con base en información proporcionada por las UR, al 06 de noviembre de 2020.

1.5. Inconvenientes, totales y por UR

Tres UR manifestaron que el desarrollo de las actividades ha presentado inconvenientes (8 actividades), siendo éstas: la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (en 3 actividades), la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (en 4 actividades), y la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (en una actividad).

Ver anexo 2.

2. Análisis cualitativo

Se destaca que en el periodo que se reporta, el CG aprobó por unanimidad los límites al financiamiento privado que podrán recibir los partidos políticos nacionales y candidaturas independientes, así como el límite individual de las aportaciones de simpatizantes durante el proceso electoral 2021. Se determinó que el límite de las aportaciones en dinero y especie que cada partido político podrá recibir por parte de militantes asciende a 105,019,042.54 pesos, mientras que para el caso de simpatizantes es de 42,963,332.50 pesos.

En tanto, el límite de aportaciones del conjunto de los precandidatos y candidatos en dinero o en especie será de 42,963,332.50 pesos. El límite individual de aportaciones de simpatizantes, en dinero o en especie, que cada partido político nacional podrá recibir en este ejercicio será de 2,148,166.62 pesos.

Por otra parte, se aprobaron los modelos de la boleta y de las actas de casilla, así como los diseños de la documentación electoral con emblemas que serán utilizados durante la Jornada Electoral el próximo 6 de junio de 2021. El diseño final de la boleta electoral se aprobará una vez que los partidos políticos de reciente creación registren su logotipo final ante el INE y que se lleve a cabo un estudio técnico sobre la igualdad, proporcionalidad y simetría, que tendrán los emblemas de los partidos en la boleta.

Otro tema relevante durante el periodo del presente informe tiene que ver con la aprobación de la realización del conteo rápido para la elección de diputaciones federales por el principio de mayoría relativa, con el objetivo de que la ciudadanía pueda conocer las tendencias de los resultados de la votación el mismo día de la Jornada Electoral.

También se realizó la instalación de los 32 Consejos Locales para el PEF 2020-2021, conformados por un Consejero o Consejera Presidente que es el o la Vocal Ejecutiva de cada entidad, seis consejeros electorales y representantes de los partidos políticos nacionales. El o la Vocal Secretario de la Junta Local, es quien funge como Secretario del Consejo Local.

En el mismo sentido se estableció el procedimiento, el modelo de convocatoria, requisitos y el formato de la solicitud de inscripción para integrar las propuestas de aspirantes para ocupar las vacantes de los cargos de Consejeras y Consejeros

Electoral de los Consejos Distritales para los Procesos Electorales Federales 2020-2021 y 2023-2024.

Respecto a las y los ciudadanos interesados en postularse a candidaturas independientes a una diputación federal por el principio de mayoría relativa en el PEF 2020-2021, se aprobó la convocatoria para que la entrega de manifestación de intención deberán hacerla del 30 de octubre al 1º de diciembre del 2020 y tendrán 60 días para recabar el apoyo ciudadano necesario. Asimismo, se fijó como tope el monto de 143 mil 211 pesos para los actos tendientes a recabar el apoyo.

Además, respecto Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) para el PEF 20-21, se aprobó el proceso técnico operativo, en donde se señala que operará a partir de las 20:00 horas del día 6 de junio y hasta el cierre, a las 20:00 horas del 7 de junio de 2021, o con antelación si se logra el 100% del registro de las Actas PREP esperadas.

Respecto a las actividades para contar con un monitoreo y análisis del contenido de las transmisiones en los programas de radio y televisión que difundan noticias se aprobó por unanimidad la Metodología para las transmisiones sobre las precampañas y campañas federales, así como los requerimientos técnicos que deberá atender el Instituto y la institución de Educación Superior participante en la realización del monitoreo y análisis del contenido de las transmisiones. El objetivo es proporcionar información cierta, oportuna, completa, plural e imparcial que permita conocer el tratamiento que brindan los programas que difunden noticias con la finalidad de contribuir al fortalecimiento de un voto informado y razonado.

Se definió que la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional será la institución que produzca el líquido indeleble que se usará para el PEF 20-21 y que la certificación de sus características y calidad, esté a cargo del Departamento de Sistemas Biológicos de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Se definieron las reglas para la contabilidad, rendición de cuentas y fiscalización a las que estarán obligados las y los candidatos, así como los gastos que habrán de considerarse en la etapa de apoyo ciudadano y precampaña. Se destaca la obligatoriedad de que, en los eventos y los utilitarios que entreguen durante este periodo, se deberán tomar todas las medidas de seguridad sanitaria ante el contexto sanitario que prevalece por la pandemia de COVID-19.

Se ordenó la instalación de 47 Oficinas Municipales distribuidas en 19 entidades federativas y 37 distritos electorales federales para extender la estructura desconcentrada del Instituto y atender oportunamente la operación y logística de la organización del PEF 20-21.

Con relación al indicador de temporalidad utilizado para medir el comportamiento general de las actividades del Proceso Electoral Federal 2020-2021, se observa que 19 actividades transitan por desfases y/o retrasos, que corresponden a: Coordinación de Asuntos Internacionales (1), Coordinación Nacional de Comunicación Social (1), Unidad Técnica de Fiscalización (3), Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (3), y Unidad Técnica de Servicios de Informática (5), Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (3) y Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (3).

Por otra parte, y en cumplimiento de la metodología de seguimiento, en específico con el apartado de las estrategias de control de actividades se informa que se recibieron 36 solicitudes de modificación de actividades, conforme el anexo 3 del presente informe.

Por último, es importante señalar que las actividades que tienen previsto la presentación de acuerdos ante el CG cuentan con fechas de término programadas por las UR de acuerdo a sus estimaciones iniciales, no obstante, las fechas en las que se presentarán dichos acuerdos, deberán ser las fechas programadas por las y los consejeros para las sesiones, siendo al corte del presente informe las siguientes:

1. Noviembre
 - a. Sesión extraordinaria. Miércoles 18 de noviembre.
 - b. Sesión ordinaria. Jueves 26 de noviembre.
2. Diciembre
 - a. Sesión ordinaria. Martes 15 de diciembre.
3. Enero
 - a. Sesión ordinaria. Miércoles 27 de enero de 2021.

3. Consideraciones finales

En el lapso que corresponde a este informe (del 10/10/2020 al 06/11/2020), se analizaron 258 actividades, es decir 41.48 por ciento de un total de 622 actividades a desarrollarse en el Proceso Electoral Federal 2020-2021.

De estas 258 actividades, a la fecha de corte han concluido 103 concluyeron conforme a los tiempos establecidos y 32 actividades concluyeron dentro del periodo que se reporta.

En 8 actividades, las UR de su ejecución indicaron que el desarrollo de las mismas no es totalmente favorable.

De las 154 actividades que se encuentran en ejecución, 135 se están llevando a cabo conforme a los plazos establecidos, 5 están retrasadas y 14 desfasadas.

Finalmente, para el siguiente periodo a informar (del 07/11/2020 al 26/11/2020), 14 actividades concluirán y 13 serán las que inicien su ejecución en ese periodo.

ANEXO 1

- **Actividades concluidas durante el periodo y entregables.**

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Entregable	Valoración de la UR
1	Acreditación de Representantes de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes Generales y ante Mesas Directivas de Casillas	Modelo de Operación	Elaborar el Proyecto de Acuerdo sobre el modelo de operación del Sistema de registro de solicitudes, sustituciones y acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes	DEOE	Acuerdo	El Acuerdo se aprobó el 30 de septiembre de 2020 por el CG, por lo que se tiene por concluida la actividad.
2	Acreditación de Representantes de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes Generales y ante Mesas Directivas de Casillas	Modelo de Operación	Elaborar y someter a consideración de la Comisión el Proyecto de Acuerdo sobre el modelo de operación del Sistema de registro de solicitudes, sustituciones y acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes	DEOE	Acuerdo	El acuerdo fue aprobado por el CG el pasado 30 de septiembre de 2020, identificado con el número INE/CG298/2020.

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Entregable	Valoración de la UR
4	Administración de los tiempos del Estado en radio y televisión en proceso electoral	Fortalecimiento de la equidad en la contienda	Elaborar y someter a consideración del CRT el cronograma para determinar escenarios a los que se apegarán los concesionarios de televisión restringida vía satélite para el Proceso Electoral Federal 2020-2021, así como las normas básicas para la negociación entre concesionarios de televisión restringida vía satélite y los de televisión radiodifundida.	DEPP P	Acuerdo CRT	El proyecto se circuló el 22/oct para ser discutido y, en su caso aprobado, por el CRT el lunes 26/oct
16	Administración de los tiempos del Estado en radio y televisión en proceso electoral	Seguimiento a las transmisiones en radio y televisión en proceso electoral	Elaborar y someter a consideración del CG el Proyecto de Acuerdo para aprobar la metodología y catálogo de noticiarios	DEPP P	Acuerdo CG	INE/CG547/2020 aprobado en Sesión Ordinaria del 28/oct
18	Administración de los tiempos del Estado en radio y televisión en proceso electoral	Seguimiento a las transmisiones en radio y televisión en proceso electoral	Realizar la Convocatoria dirigida a Instituciones Públicas de Educación Superior para la realización del Monitoreo de Noticiarios	DEPP P	Convocatoria	29/oct se publicó la convocatoria
43	Administración de los tiempos del Estado en radio y televisión ordinario	Asignación de los tiempos en materia electoral en radio y televisión y gestión de transmisiones	Elaborar el modelo de pauta de Autoridades Electorales	DEPP P	Archivo de Excel	Concluida

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Entregable	Valoración de la UR
45	Administración de los tiempos del Estado en radio y televisión ordinario	Asignación de los tiempos en materia electoral en radio y televisión y gestión de transmisiones	Elaborar y someter a consideración de la JGE el Acuerdo por el que se aprueban las pautas para la transmisión en Radio y Televisión de los mensajes de las Autoridades Electorales	DEPP P	Acuerdo JGE	El proyecto se circuló el 21/oct para ser discutido y, en su caso aprobado, por la JGE el 26/oct
49	Administración de los tiempos del Estado en radio y televisión ordinario	Asignación de los tiempos en materia electoral en radio y televisión y gestión de transmisiones	Notificar a las autoridades que mandate el Acuerdo del Catálogo, así como notificar dicho documento a las Juntas Locales para la publicación del Catálogo en los periódicos estatales	DEPP P	Oficio	Concluida antes de lo previsto.
50	Administración de los tiempos del Estado en radio y televisión ordinario	Asignación de los tiempos en materia electoral en radio y televisión y gestión de transmisiones	Notificar el Catálogo Nacional a las Emisoras de Radio y Televisión que integran el mismo para el Proceso Electoral Federal 2020-2021	DEPP P	Oficio	Concluida antes de lo previsto.
51	Administración de los tiempos del Estado en radio y televisión ordinario	Asignación de los tiempos en materia electoral en radio y televisión y gestión de transmisiones	Publicar los mapas de cobertura en el Portal INE	DEPP P	Vínculo del portal con mapas actualizados	Se actualizó el Portal INE con vínculos de los mapas de cobertura

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Entregable	Valoración de la UR
60	Administración de los tiempos del Estado en radio y televisión ordinario	Dictaminación de materiales de radio y televisión	Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema de Pautas, Control y Seguimiento de Materiales	DEPP P	Sistema y Documentos técnica derivada del SIGETIC	Se concluyó en el tiempo previsto.
64	Administración de los tiempos del Estado en radio y televisión ordinario	Dictaminación de materiales de radio y televisión	Liberar el Sistema de Pautas, Control y Seguimiento de Materiales	DEPP P	Sistema y Documentos técnica derivada del SIGETIC	Se concluyó en la fecha prevista.
104	Conteo Rápido	Coordinación y seguimiento de los trabajos del COTECORA	Elaborar y someter a consideración del CG el Proyecto de Acuerdo por el que se dispone la creación del Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos para los Procesos Electorales Federal y Gobernadores Locales 2020-2021.	DERF E	Acuerdo de CG	En sesión extraordinaria del 6 de noviembre de 2020, se aprobó el Acuerdo del CG del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la creación e integración del Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos para los Procesos Electorales Federal y Locales 2020-2021
153	Fiscalización de apoyo ciudadano, pre campaña y campaña	Planeación de la fiscalización	Delimitar mediante acuerdo de la Comisión de Fiscalización los alcances de revisión de los Informes de Precampaña, Apoyo Ciudadano y campaña	UTF	Acuerdo	Se aprobó el acuerdo por la COF el día 21 de octubre de 2020.

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Entregable	Valoración de la UR
154	Fiscalización de apoyo ciudadano, pre campaña y campaña	Planeación de la fiscalización	Elaborar el proyecto de acuerdo de homologación de los plazos para la fiscalización	UTF	Acuerdo	Se aprobó el acuerdo en la sesión del CG el día 28 de octubre de 2020.
155	Fiscalización de apoyo ciudadano, pre campaña y campaña	Planeación de la fiscalización	Elaborar el proyecto de acuerdo en donde se determinan los límites de financiamiento privado que podrán recibir los partidos políticos nacionales por sus precandidatas y precandidatos, candidatas y candidatos; así como las aportaciones de las y los aspirantes a candidaturas independientes y candidaturas independientes	UTF	Acuerdo	El acuerdo se aprobó en sesión del CG del 6 de noviembre de 2020.

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Entregable	Valoración de la UR
156	Fiscalización de apoyo ciudadano, pre campaña y campaña	Planeación de la fiscalización	Elaborar el proyecto de acuerdo en el que se determinan las reglas para la contabilidad, rendición de cuentas y fiscalización, así como los gastos que se consideran como de apoyo ciudadano y precampaña correspondientes a los Procesos Electorales Federal y Locales 2020-2021, así como los procesos extraordinarios que se pudieran derivar de dichos procesos.	UTF	Acuerdo	Se aprobó el acuerdo en sesión del CG el día 28 de octubre de 2020.

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Entregable	Valoración de la UR
158	Fiscalización de apoyo ciudadano, pre campaña y campaña	Planeación de la fiscalización	Elaborar y someter a consideración de la Comisión de Fiscalización el Proyecto de Acuerdo por el que se emiten los lineamientos para la realización de las visitas de verificación, monitoreo de anuncios espectaculares y demás propaganda colocada en la vía pública, diarios revistas y otros medios impresos, así como en páginas de internet y redes sociales	UTF	Acuerdo	El acuerdo ya fue a aprobado por la COF el pasado 21 de octubre de 2020
160	Fiscalización de apoyo ciudadano, pre campaña y campaña	Planeación de la fiscalización	Elaborar el acuerdo del procedimiento a seguir ante el incumplimiento de presentación del informe de ingresos y gastos de los sujetos obligados durante los periodos de precampaña y apoyo ciudadano que aspiren a un cargo de elección popular federal o local.	UTF	Acuerdo	Se aprobó el acuerdo por la COF el día 21 de octubre.

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Entregable	Valoración de la UR
194	Generación de documentación y materiales electorales	Diseño de la documentación electoral	Presentar los diseños de la documentación electoral federal ante el CG para su aprobación	DEOE	Acuerdo e informe	El 29 de octubre la Comisión de Capacitación y Organización Electoral aprobó los diseños de la documentación electoral federal, así como el Informe respectivo y Acuerdo. En el mes de noviembre serán presentados ante el CG.
197	Generación de documentación y materiales electorales	Distribución	Elaborar el Programa Nacional de Distribución	DEOE	Programa	Se concluyó el Programa Nacional de Distribución y los Calendarios de los envíos no custodiados y custodiados para la distribución de la documentación y materiales electorales del Proceso Electoral Federal 2020-2021.
202	Generación de documentación y materiales electorales	Producción y certificación del líquido indeleble	Aprobar el Acuerdo por el CG, del líquido indeleble que se utilizará para impregnar el dedo pulgar derecho de los electores durante la Jornada Electoral	DEOE	Acuerdo	El CG del INE aprobó el acuerdo del líquido indeleble a utilizar en la jornada electoral del 6 de junio de 2021, en la sesión ordinaria del 28 de octubre de 2020.

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Entregable	Valoración de la UR
275	Gestión del financiamiento público y franquicias de contendientes electorales	Determinación del financiamiento público	Elaborar y someter a consideración del CG el Proyecto de Acuerdo por el que se fijan los topes máximos de gastos de precampaña y campaña por precandidato y candidato para el Proceso Electoral Federal 2020-2021	DEPP P	Acuerdo CG	Aprobado en Sesión Ordinaria de 28/oct
317	Instalación y operación de Oficinas Municipales	Aprobación del Acuerdo, por parte de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral	Elaborar el Proyecto de Acuerdo de oficinas municipales para la presentación a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral y su posterior presentación a la Junta General Ejecutiva, para la propuesta al CG del Instituto. Los anexos son el estudio técnico y la determinación del costo de instalación y funcionamiento.	DEOE	Acuerdo y anexos	El Acuerdo se aprobó el 28 de octubre de 2020 por el CG, por lo que se tiene por concluida la actividad.
326	Integración de órganos de recepción de votación	Administración de la Operación de soluciones tecnológicas	Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema de Reclutamiento y Seguimiento a SE y CAE en línea.	UTSI	Informe	Conforme al Plan

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Entregable	Valoración de la UR
489	Integración y funcionamiento de los Consejos Locales y Distritales	Designación de consejeras y consejeros de consejos locales del INE	Notificar a los 32 presidentas y presidentes de consejos locales de su designación para que instalen sus consejos a más tardar en el mes de septiembre.	DESP EN	Oficios de notificación	El 7 de septiembre el CG del Instituto designó a los 32 Vocales Ejecutivos y Ejecutivas Locales como presidentes y presidentas de sus respectivos consejos, quienes deberán entrar en funciones a más tardar el 3 de noviembre. Mediante oficio INE/DESPEN/1762/2020 de fecha 8 de octubre, se notificó a los 32 Vocales Ejecutivos y Ejecutivas sus nombramientos como presidentes y presidentas de sus respectivos Consejos.
491	Integración y funcionamiento de los Consejos Locales y Distritales	Designación de consejeras y consejeros de consejos locales del INE	Elaborar y someter a consideración del CG proyecto de acuerdo para la designación de las y los integrantes de los Consejos Locales	DEOE	Acuerdo del CG	Se elaboró el proyecto de acuerdo del CG, y el 22 de octubre de 2020 se presentó ante la Comisión de Capacitación y Organización Electoral.
514	Observación Electoral	Diseñar, producir y distribuir materiales de capacitación electoral	Revisar y validar el material didáctico para la capacitación a observadores electorales	DECE YEC / JLE	Oficios	Se recibieron por parte de las 32 JLE las propuestas elaboradas por los OPL de la Guía temática para capacitar a las y los Observadores Electorales en versión digital para su revisión, y se emitieron los oficios

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Entregable	Valoración de la UR
						correspondientes con las observaciones derivadas de las revisiones.
520	Operación del esquema de atención e información para visitantes extranjeros	Aprobación del Programa de atención a visitantes extranjeros	Elaborar y someter a consideración del CG el Proyecto de Acuerdo relativo al Programa de atención a visitantes extranjeros que acudan a presenciar el Proceso Electoral Federal y Concurrente 2020-2021	CAI	Acuerdo	El Acuerdo de Programa de trabajo fue aprobado por el CG en su sesión ordinaria del 28 de octubre.
583	Registro de candidaturas, plataformas electorales y coaliciones o acuerdos de participación	Revisión del cumplimiento de los requisitos de candidaturas, plataformas electorales y coaliciones o acuerdos de participación	Elaborar el manual para capacitar al personal adscrito al área y en Órganos Desconcentrados para recabar y organizar la documentación correspondiente a las acreditaciones y sustituciones de los Representantes de Partidos Políticos, que se registren ante los diversos órganos del Instituto	DEPP P	Manual	Se envió el manual a las JDE el 20/oct

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Entregable	Valoración de la UR
586	Registro de candidaturas, plataformas electorales y coaliciones o acuerdos de participación	Revisión del cumplimiento de los requisitos de candidaturas, plataformas electorales y coaliciones o acuerdos de participación	Elaborar el manual para capacitar al personal adscrito al área y en Órganos Desconcentrados para el registro de candidaturas independientes al cargo de Diputación Federal	DEPP P	Manual	29/oct se envió a las Juntas Distritales
587	Registro de candidaturas, plataformas electorales y coaliciones o acuerdos de participación	Revisión del cumplimiento de los requisitos de candidaturas, plataformas electorales y coaliciones o acuerdos de participación	Elaborar y someter a consideración del CG el Proyecto de Acuerdo por el que se emite la convocatoria dirigida a las ciudadanas y los ciudadanos interesados en postularse para alguna candidatura independiente	DEPP P	Acuerdo CG	El proyecto se circuló el 22/oct para ser discutido y, en su caso aprobado, por la CPPP el lunes 26/oct y por el CG el 28/oct

ANEXO 2

- Base de datos en la plataforma Sharepoint con corte a la fecha del informe.

Relación de actividades retrasadas por Unidad Responsable y justificación de avance

No.	UR	Actividad	Inicio	Término	Avance real	Avance esperado	Avance favorable	Valoración de la UR
41 6	DECEYEC	Verificar la fase de reclutamiento, selección, contratación y capacitación de SE y CAE por los Consejeros Electorales Distritales	19/10/2020	05/02/2021	0.00	16.51	NO	El día 3 de noviembre se instalaron los Consejos Electorales Distritales.
41 7	DECEYEC	Verificar la fase de reclutamiento, selección, contratación y capacitación de SE y CAE por los Consejeros Electorales Locales	19/10/2020	05/02/2021	0.00	16.51	NO	El día 3 de noviembre se instalaron los Consejos Electorales Locales.
45 9	DECEYEC	Reproducir el examen de conocimientos habilidades y actitudes (DECEyEC)	03/11/2020	20/11/2020	0.00	17.65	NO	La reproducción de las distintas versiones del examen se realizará en el periodo del 12 al 30 de noviembre, en virtud de que dicha actividad se llevará a cabo en el Centro Nacional de Impresión de la DERFE y el acceso a las instalaciones de dicho centro se autorizó hasta esa fecha en virtud de que actualmente se encuentran en uso por otras actividades.
49 7	DESPEN	Designar temporalmente a las presidentas y presidentes de consejos locales y distritales, cuando se dé el supuesto, por generarse una ausencia temporal o definitiva de la presidenta o presidente que originalmente fueron designados. Elaborar oficio para firma del Secretario Ejecutivo para la designación temporal de presidenta o presidente de	07/09/2020	15/09/2021	0.00	16.09	NO	Cuando se dé el supuesto. (Si bien es cierto se generaron 3 vacantes en el cargo de Vocal Ejecutivo Distrital las personas que ocupaban ese cargo no fueron designadas presidentas o presidentes de consejo, y esta actividad se reportará cuando sean designados, aunado a que los consejos distritales se instalarán el 1° de diciembre).

No. UR	Actividad	Inicio	Término	Avance real	Avance esperado	Avance favorable	Valoración de la UR
	consejo local o distrital en donde se presente la ausencia temporal o definitiva de quien originalmente fue designado.						
52 4	CAI Elaborar y entregar los gafetes de acreditación de los visitantes extranjeros	05/08/2020	05/06/2021	9.00	30.59	SI	Estamos en posibilidad de entregar los gafetes de acreditación a los 9 visitantes extranjeros acreditados. El avance reportado corresponde tanto al tiempo de ejecución como al desarrollo de la actividad, considerando que, en los 11 procesos previos, la mayor parte de los gafetes se entregaron en la última semana.

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento (DPS) de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), con base en información proporcionada por las UR, al 06 de noviembre de 2020.

Relación de actividades desfasadas por Unidad Responsable y justificación de avance

No.	Actividad	UR	Inicio	Término	Avance real	Avance esperado	Avance favorable	Valoración de la UR
90	Elaborar contenidos audiovisuales que acompañen sustantivamente con la estrategia de comunicación del INE	CNCS	03/01/2020	31/12/2020	68.00	84.85	SI	El proyecto fue afectado en razón de la pandemia y las restricciones asociadas a la realización de actividades presenciales en las instalaciones del Instituto. Esta situación obligó a retrasar la contratación para la realización de producciones en el estudio de televisión. El proceso administrativo ya fue reanudado y se atienden las definiciones administrativas, pero todavía no se cuenta con un proveedor. A su vez, de conformidad con los acuerdos INE/JGE34/2020 e INE/JGE45/2020, la realización de los programas televisivos está sujeta, todavía, a definiciones en materia sanitaria por lo que toca a la asistencia a instalaciones. No obstante, aprovechando las capacidades propias de la Coordinación Nacional de Comunicación Social y pese a las restricciones que la propia contingencia sanitaria para la realización de actividades presenciales. Pese a ello, se han producido contenidos audiovisuales que se encuentran en el canal de YouTube del INE y en Central Electoral, todos los cuales acompañan la estrategia y acciones de comunicación. De manera particular, se produjeron materiales enfocados a explicar acuerdos aprobados en CG, como los lineamientos para los partidos en materia de violencia política de género, consulta ciudadana, calendario para candidaturas independientes, criterios de fiscalización y lineamientos para evitar la violencia política contra las mujeres. Se efectuó el envío de requerimientos, se ha dado retroalimentación a los cronogramas de trabajo remitidos por la UTSI, así como, se remitió a la UTSI el Catálogo de Cuentas Contables 2021, y el archivo de evidencias asociadas a las cuentas contables incorporadas en dicho catálogo, mismos que serán el insumo para el registro de operaciones de Campaña del Proceso Electoral 2020-2021; no obstante, las pruebas correspondientes comenzaran una vez que concluyan los desarrollos y liberaciones productivas de Precampaña
147	Analizar, diseñar y liberar el Sistema Integral de Fiscalización 6.0 Campaña	UTF	16/08/2020	04/03/2021	6.00	41.00	SI	

No.	Actividad	UR	Inicio	Término	Avance real	Avance esperado	Avance favorable	Valoración de la UR
157	Realizar la insaculación para la selección de los distritos electorales y municipios a verificar durante los periodos de precampañas, obtención del apoyo ciudadano y campaña	UTF	01/09/2020	22/10/2020	90.00	100	SI	Se modificó el plazo para la realización de la insaculación debido a la homologación de plazos de los procesos locales; la insaculación se llevará a cabo en el mes de noviembre.
159	Entregar a la Comisión de Fiscalización la metodología para seleccionar uno o varios distritos, estados o municipios según corresponda, para la realización de visitas de verificación a los partidos políticos, candidatos, precandidatos, aspirantes y candidatos independientes	UTF	22/09/2020	22/10/2020	90.00	100	SI	Se modificó el plazo para la realización de la insaculación debido a la homologación de plazos de los procesos locales; la insaculación se llevará a cabo en el mes de noviembre.
241	Liberar el Sistema Sesiones de Junta y de Consejo para pruebas y simulacros	UTSI	22/10/2020	27/10/2020	95.00	100	SI	Actividad en proceso, actualizado al 6/11/2020
243	Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema Sesiones de Junta y de Consejo	UTSI	22/10/2020	27/10/2020	95.00	100	SI	Actividad en proceso, actualizada al 06/11/2020
282	Llevar a cabo las gestiones del Sistema para el Seguimiento a la Ubicación de Casillas	DEOE	01/05/2020	31/08/2020	33.00	100	NO	Se ha recibido por parte de la UNICOM la respuesta al documento de requerimientos solicitados por la DEOE, plan de trabajo de desarrollo del sistema y documento de dudas, mismos que están siendo revisados por la DEOE.

No.	Actividad	UR	Inicio	Término	Avance real	Avance esperado	Avance favorable	Valoración de la UR
330	Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita	UTSI	22/10/2020	23/10/2020	95.00	100	SI	Se acordó con el área usuaria realizar las pruebas el 27 y 28 de octubre. No obstante, se espera la respuesta por parte de la DERFE respecto a la información del ordenamiento que se establecerá a partir de la referencia geográfica (colindancia) de las manzanas y/o localidades al interior de cada sección electoral. actualizado al 6/11/2020
354	Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita	UTSI	02/07/2020	30/10/2020	99.00	100	SI	En desarrollo conforme al Plan, actualizado al 6/11/2020
362	Liberar el Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita para pruebas y simulacros	UTSI	20/10/2020	21/10/2020	99.00	100	SI	En espera de la respuesta por parte de la DERFE respecto a la información del ordenamiento que se establecerá a partir de la referencia geográfica (colindancia) de las manzanas y/o localidades al interior de cada sección electoral.
495	Elaborar y someter a consideración del CG los 300 nombramientos del funcionariado que será designado como presidentas y presidentes de Consejos distritales en octubre.	DESPEN	01/10/2020	31/10/2020	99.00	100	SI	El 30 de septiembre de 2020, se aprobó el Acuerdo del CG del Instituto Nacional Electoral por el que se designan a las Vocales Ejecutivas y Vocales Ejecutivos Distritales como Presidentas y Presidentes de los Consejos Distritales durante el desarrollo de los Procesos Electorales Federal y Locales, en las elecciones ordinarias, extraordinarias y concurrentes, así como los procesos de participación ciudadana en los que intervenga el Instituto Nacional Electoral, acuerdo identificado como INE/CG304/2020. El 6 de noviembre de 2020 el CG aprobó la designación de los tres presidentes de los Consejos Distritales 02 de Colima, con cabecera en Colima, 01 de Jalisco, con cabecera en Tequila y 04 de Quintana Roo, con cabecera en Cancún.

No.	Actividad	UR	Inicio	Término	Avance real	Avance esperado	Avance favorable	Valoración de la UR
496	Notificar a los 300 presidentes y presidentas de consejos distritales de su designación para que instalen sus consejos a más tardar el 30 de noviembre	DESPEN	01/10/2020	31/10/2020	99.00	100	SI	El pasado 30 de septiembre el CG del Instituto, mediante Acuerdo INE/CG/304/2020 aprobó la designación de 297 Presidentas y Presidentes de sus respectivos Consejos Distritales. Se entregaron a los integrantes de la Comisión del Servicio los 297 nombramientos para las firmas correspondientes y poder notificar a los funcionarios para efecto de que a más tardar el 1° de diciembre asuman las funciones inherentes a la designación, conforme al punto Segundo del citado acuerdo. Actualmente la DESPEN está en proceso de designación de la persona que fungirá como presidente/a de Consejo Distrital en el 04 Distrito en el estado de Coahuila, que quedó vacante derivado de la rotación funcional, aprobado por la Junta General Ejecutiva el pasado 26 de octubre de 2020, otorgado a la funcionaria que ocupaba dicho cargo. Con motivo del lamentable fallecimiento del funcionario que originalmente fue designado mediante Acuerdo INE/CG/304/2020 como Presidente de Consejo del Distrito 09 en el estado de Chihuahua, se realizarán las gestiones conducentes para designar al presidente/a de dicho Consejo Distrital antes del 1° de diciembre, fecha límite en que se deberán instalar los Consejos Distritales.
499	Llevar a cabo la gestión del Sistema para el Seguimiento a las Sesiones de los Consejos Locales y Distritales	DEOE	01/05/2020	31/08/2020	33.00	100	NO	Se remitieron a la UNICOM las observaciones resultantes de las pruebas de aceptación de la nueva versión del Sistema de Sesiones de Junta para su atención. Asimismo, se están realizando pruebas de aceptación a la nueva versión del Sistema de Sesiones de Consejo. Por otro lado, se ha habilitado la versión anterior de dichos sistemas y están operando en ambiente productivo para recuperar la información de las sesiones de Junta y Consejo respectivamente.
517	Llevar a cabo la gestión del sistema para el seguimiento a la acreditación de observadoras/es electorales.	DEOE	01/05/2020	31/08/2020	95.00	100	NO	La Dirección de Operación Regional y la Dirección de Estadística y Documentación Electoral, ambas de la DEOE, han trabajado de forma colaborativa sobre la reingeniería del Sistema de Observadores Electorales con la UTSI. El 16 de noviembre se liberará la primera versión del sistema y el resto se pondrá en producción en un segundo momento. Se están llevando a cabo pruebas de aceptación respecto a la corrección de incidencias que ha remitido UTSI. Se determinará la fecha de liberación en

No.	Actividad	UR	Inicio	Término	Avance real	Avance esperado	Avance favorable	Valoración de la UR
-----	-----------	----	--------	---------	-------------	-----------------	------------------	---------------------

producción de la segunda versión, una vez que se tenga un entregable que cumpla con los criterios y requerimientos solicitados por la DEOE en apego a la normatividad vigente.

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento (DPS) de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), con base en información proporcionada por las UR, al 06 de noviembre de 2020.

Relación de actividades que la Unidad Responsable valoró con desarrollo no favorable

No.	Actividad	UR	Inicio	Término	Avance real	Avance esperado	Valoración de la UR
282	Llevar a cabo las gestiones del Sistema para el Seguimiento a la Ubicación de Casillas	DEOE	01/05/2020	31/08/2021	33.00	38.81	Se ha recibido por parte de la UNICOM la respuesta al documento de requerimientos solicitados por la DEOE, plan de trabajo de desarrollo del sistema y documento de dudas, mismos que están siendo revisados por la DEOE.
416	Verificar la fase de reclutamiento, selección, contratación y capacitación de SE y CAE por los Consejeros Electorales Distritales	DECEYEC	19/10/2020	05/02/2021	0.00	16.51	El día 3 de noviembre se instalaron los Consejos Electorales Distritales.
417	Verificar la fase de reclutamiento, selección, contratación y capacitación de SE y CAE por los Consejeros Electorales Locales	DECEYEC	19/10/2020	05/02/2021	0.00	16.51	El día 3 de noviembre se instalaron los Consejos Electorales Locales.
459	Reproducir el examen de conocimientos habilidades y actitudes (DECEyEC)	DECEYEC	03/11/2020	20/11/2020	0.00	17.65	La reproducción de las distintas versiones del examen se realizará en el periodo del 12 al 30 de noviembre, en virtud de que dicha actividad se llevará a cabo en el Centro Nacional de Impresión de la DERFE y el acceso a las instalaciones de dicho centro se autorizó hasta esa fecha en virtud de que actualmente se encuentran en uso por otras actividades.
497	Designar temporalmente a las presidentas y presidentes de consejos locales y distritales, cuando se dé el supuesto, por generarse una ausencia temporal o definitiva de la presidenta o presidente que originalmente fueron designados. Elaborar oficio para firma del Secretario Ejecutivo para la designación temporal de presidenta o presidente de consejo local o distrital en donde se presente la ausencia temporal o definitiva de quien	DESPEN	07/09/2020	15/09/2021	0.00	16.09	Cuando se dé el supuesto. (Si bien es cierto se generaron 3 vacantes en el cargo de Vocal Ejecutivo Distrital las personas que ocupaban ese cargo no fueron designadas presidentas o presidentes de consejo, y esta actividad se reportará cuando sean designados, aunado a que los consejos distritales se instalarán el 1° de diciembre).

No.	Actividad	UR	Inicio	Término	Avance real	Avance esperado	Valoración de la UR
	originalmente fue designado.						
499	Llevar a cabo la gestión del Sistema para el Seguimiento a las Sesiones de los Consejos Locales y Distritales	DEOE	01/05/2020	31/08/2021	33.00	38.81	Se remitieron a la UNICOM las observaciones resultantes de las pruebas de aceptación de la nueva versión del Sistema de Sesiones de Junta para su atención. Asimismo, se están realizando pruebas de aceptación a la nueva versión del Sistema de Sesiones de Consejo. Por otro lado, se ha habilitado la versión anterior de dichos sistemas y están operando en ambiente productivo para recuperar la información de las sesiones de Junta y Consejo respectivamente.
517	Llevar a cabo la gestión del sistema para el seguimiento a la acreditación de observadoras/es electorales.	DEOE	01/05/2020	31/08/2020	95.00	100	La Dirección de Operación Regional y la Dirección de Estadística y Documentación Electoral, ambas de la DEOE, han trabajado de forma colaborativa sobre la reingeniería del Sistema de Observadores Electorales con la UTSI. El 16 de noviembre se liberará la primera versión del sistema y el resto se pondrá en producción en un segundo momento. Se están llevando a cabo pruebas de aceptación respecto a la corrección de incidencias que ha remitido UTSI. Se determinará la fecha de liberación en producción de la segunda versión, una vez que se tenga un entregable que cumpla con los criterios y requerimientos solicitados por la DEOE en apego a la normatividad vigente.
605	Gestionar los sistemas informáticos en materia de organización electoral	DEOE / UTSI	01/04/2020	31/07/2021	40.00	45.06	Como resultado de las pruebas de aceptación del Sistema de Sesiones de Junta y Ubicación de Casillas, se remitieron a la UNICOM las observaciones resultantes para su atención. Por otro lado, se están llevando a cabo pruebas de aceptación de los sistemas de Sesiones de Consejo y Observadoras/es Electorales, respecto a la corrección de incidencias que

No.	Actividad	UR	Inicio	Término	Avance real	Avance esperado	Valoración de la UR
							<p>ha remitido UNICOM. Lo anterior se ha realizado en las versiones nuevas de los Sistemas. En el caso del Sistema de Observadoras/es Electorales, se determinará la fecha de liberación en producción, una vez que se tenga un entregable que cumpla con los criterios y requerimientos solicitados por la DEOE en apego a la normatividad vigente. Por otro lado, se está en espera de la liberación del Sistema de Ubicación de Casillas en su versión anterior, previendo iniciar su operación el 16 de noviembre de 2020. Respecto al Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales, se ha liberado una primera versión en producción y se continúa con las pruebas de aceptación del resto de entregables. Finalmente, se continúan realizando los trabajos de levantamiento de requerimientos de los Sistemas de Mecanismos de Recolección, Representantes de Partidos Políticos y Candidatos Independientes, Registro de Actas y Cómputos distritales.</p>

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento (DPS) de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), con base en información proporcionada por las UR, al 06 de noviembre de 2020.

ANEXO 3

- **Estrategias de Control de Actividades**

No	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Tipo de cambio	Justificación
82	Asistencia Electoral	Programa de Asistencia Electoral	Elaborar la Ruta de Evaluación para verificar la efectividad en la ejecución de las actividades de Asistencia Electoral	DEOE	Cambio de fecha de inicio 1/10/20 y de término 30/11/20 a fecha de inicio 01/08/2021 y de término 30/11/2021	La modificación de la fecha de inicio y término se solicita en atención a los compromisos desagregados dentro del Programa de Asistencia Electoral 2020-2021 (PAE), aprobado por el CG en sesión extraordinaria el 7 de agosto de 2020 a mediante Acuerdo INE/CG189/2020. El PAE establece: "en diciembre de 2021, se presentará la Ruta de Evaluación del pae ante la comisión correspondiente, a fin de recabar la información necesaria para verificar de manera integral la efectividad en la ejecución de las actividades de Asistencia Electoral."

No	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Tipo de cambio	Justificación
83	Asistencia Electoral	Programa de Asistencia Electoral	Dar seguimiento al cumplimiento de las actividades del Programa de Asistencia Electoral	DEOE	Cambio de fecha de inicio de 15/02/2021 a 17/01/2021	La modificación de la fecha de inicio se requiere en atención de los periodos de contratación para SE y CAE, así como a los compromisos desagregados dentro del Programa de Asistencia Electoral 2020-2021 (PAE), aprobado por el CG en sesión extraordinaria el 7 de agosto de 2020 a mediante Acuerdo INE/CG189/2020.
84	Asistencia Electoral	Programa de Asistencia Electoral	Verificar la ejecución de las actividades de Asistencia Electoral mediante la elaboración y análisis de cuestionarios a las instancias involucradas	DEOE	Cambio de fecha de inicio de 15/02/2021 a 01/04/2021 y de término de 01/07/2021 a 10/06/2021	Verificar la ejecución de las actividades de Asistencia Electoral mediante la elaboración y aplicación de un cuestionario a VOE y CAE que participen en la elección antes de que concluya su periodo de contratación.

No	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Tipo de cambio	Justificación
144	Encuestas y propaganda publicadas en medios impresos nacionales y locales	Revisión de medios impresos nacionales y locales para la detección de encuestas y propaganda	Presentar el informe en cumplimiento al artículo 144 del Reglamento de Elecciones, en materia de encuestas por muestreo, sondeos de opinión, encuestas de salida y conteos rápidos no institucionales.	SE	Cambio de redacción y de fecha inicio y de término	La actividad se encuentra duplicada; sin embargo, después de revisar la información y actividades asociada a la misma se encuentra ausente la presentación de los informes en materia de encuestas y sondeos de opinión por parte de la Secretaría Ejecutiva al CG, conforme a lo establecido en el artículo 144 del Reglamento de Elecciones. En ese sentido, se propone incorporar esta última actividad, en la cual participa, proveyendo insumos, la Coordinación Nacional de Comunicación Social y como responsable final de la misma la Secretaría Ejecutiva del Instituto.
153	Fiscalización de apoyo ciudadano, pre campaña y campaña	Planeación de la fiscalización	Delimitar mediante acuerdo de la Comisión de Fiscalización los alcances de revisión de los Informes de Precampaña, Apoyo Ciudadano y campaña	UTF	Cambio la fecha término del 15/10/2020 al 21/10/2020	En proceso de elaboración de proyecto de acuerdo. Se modificó la fecha de aprobación del acuerdo debido a la homologación de plazos de los procesos locales, se aprobará por la Comisión a más tardar el 21 de octubre de 2020.

No	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Tipo de cambio	Justificación
15 4	Fiscalización de apoyo ciudadano, pre campaña y campaña	Planeación de la fiscalización	Elaborar el proyecto de acuerdo de homologación de los plazos para la fiscalización	UTF	Cambio la fecha de término del 30/09/2020 al 28/10/2020	En proceso de elaboración de proyecto de acuerdo. Se modificó la fecha de aprobación del acuerdo debido a la homologación de plazos de los procesos locales. El acuerdo se subirá a sesión del CG el día 28 de octubre de 2020.
15 5	Fiscalización de apoyo ciudadano, pre campaña y campaña	Planeación de la fiscalización	Elaborar el proyecto de acuerdo en donde se determinan los límites de financiamiento privado que podrán recibir los partidos políticos nacionales por sus precandidatas y precandidatos, candidatas y candidatos; así como las aportaciones de las y los aspirantes a candidaturas independientes y candidaturas independientes	UTF	Cambio la fecha de término del 30/09/2020 al 28/10/2020 Se presentó nueva solicitud de cambio de fecha fue rechazada	En proceso de elaboración de proyecto de acuerdo. Se modificó la fecha de aprobación del acuerdo debido a la homologación de plazos de los procesos locales. El acuerdo se subirá a sesión del CG el día 28 de octubre de 2020.

No	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Tipo de cambio	Justificación
156	Fiscalización de apoyo ciudadano, pre campaña y campaña	Planeación de la fiscalización	Elaborar el proyecto de acuerdo en el que se determinan las reglas para la contabilidad, rendición de cuentas y fiscalización, así como los gastos que se consideran como de apoyo ciudadano y precampaña correspondientes a los Procesos Electorales Federal y Locales 2020-2021, así como los procesos extraordinarios que se pudieran derivar de dichos procesos.	UTF	Cambio la fecha de término del 30/09/2020 al 28/10/2020	En proceso de elaboración de proyecto de acuerdo. Se modificó la fecha de aprobación del acuerdo debido a la homologación de plazos de los procesos locales. El acuerdo se subirá a sesión del CG el día 28 de octubre de 2020.
157	Fiscalización de apoyo ciudadano, pre campaña y campaña	Planeación de la fiscalización	Realizar la insaculación para la selección de los distritos electorales y municipios a verificar durante los periodos de precampañas, obtención del apoyo	UTF	Se cambio la fecha de término del 30/09/2020 al 22/10/2020 Se presentó nueva solicitud de cambio de fecha fue rechazada	Se modificó el plazo para la realización de la insaculación debido a la homologación de plazos de los procesos locales. La insaculación se llevará a cabo en el mes de octubre.

No	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Tipo de cambio	Justificación
			ciudadano y campaña			
159	Fiscalización de apoyo ciudadano, pre campaña y campaña	Planeación de la fiscalización	Entregar a la Comisión de Fiscalización la metodología para seleccionar uno o varios distritos, estados o municipios según corresponda, para la realización de visitas de verificación a los partidos políticos, candidatos, precandidatos, aspirantes y candidatos independientes	UTF	Se presentó solicitud de cambio de fecha fue rechazada	Se presentó solicitud de cambio de fecha fue rechazada
263	Gestión de TIC	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Dar soporte a la operación del Sistema Integral de Fiscalización 5.0 Campaña	UTSI	Cambio la fecha de inicio de 20/04/2021 a 01/04/2021	Se revisó con el área usuaria los requerimientos y fechas relevantes, con lo que se actualizó el plan de trabajo, el cual está en proceso de formalización su última versión.

No	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Tipo de cambio	Justificación
283	Gestión para la ubicación, equipamiento y acondicionamiento de casillas electorales	Ubicación, equipamiento y acondicionamiento de casillas.	Dar seguimiento a la publicación de encartes en los periódicos de circulación local o regional	DEOE	Cambio de fecha de inicio de 05/06/2020 a 05/06/2021	La modificación de la fecha de inicio se requiere dado que el inicio de la actividad es en junio del año 2021, no de 2020.
334	Integración de órganos de recepción de votación	Administración de la Operación de soluciones tecnológicas	Dar soporte a la operación del Sistema Primera Insaculación	UTSI	Cambio fecha de inicio de 12/01/2021 a 06/02/2021 y fecha de término de 14/01/2021 a 06/02/2021	Al momento de incorporar la información por un error involuntario se capturaron incorrectas las fechas.
338	Integración de órganos de recepción de votación	Administración de la Operación de soluciones tecnológicas	Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema Primera Insaculación	UTSI	Cambio de fecha de inicio de 01/02/2021 a 27/01/2021 y de terminó de 03/02/2021 a 04/02/2021	Al momento de incorporar la información por un error involuntario se capturaron incorrectas las fechas.
339	Integración de órganos de recepción de votación	Administración de la Operación de soluciones tecnológicas	Dar soporte a la operación del Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación	UTSI	Cambio fecha de inicio de 06/02/2021 a 01/12/2020 y de término 06/02/2021 a 04/04/2021	Se revisó con el área usuaria los requerimientos y fechas relevantes contempladas en el Oficio INE/DECEYEC/DCE/0193/2020, con lo que se actualizó el plan de trabajo, el cual está en proceso de formalización su última versión.
341	Integración de órganos de recepción de votación	Administración de la Operación de soluciones tecnológicas	Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación	UTSI	Cambio fecha de inicio de 22/02/2021 a 02/02/2021 y de término de 31/03/2021 a 04/02/2021	Al momento de incorporar la información por un error involuntario se capturaron incorrectas las fechas.

No	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Tipo de cambio	Justificación
34 3	Integración de órganos de recepción de votación	Administración de la Operación de soluciones tecnológicas	Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema Sustitución de SE y CAE	UTSI	Cambio fecha de inicio de 05/04/2021 a 13/01/2021 y de término de 08/04/2021 a 14/01/2021	Al momento de incorporar la información por un error involuntario se capturaron incorrectas las fechas.
34 4	Integración de órganos de recepción de votación	Administración de la Operación de soluciones tecnológicas	Dar soporte a la operación del Sistema Segunda Insaculación	UTSI	La fecha de inicio de 12/04/2021 a 08/04/2021 y de término de 05/06/2021 a 08/04/2021	Las fechas se actualizaron de acuerdo con la actividad del PIYCPEF 20-21 "Realizar la segunda insaculación y designación de funcionarios de Mesas Directivas de Casilla"
34 5	Integración de órganos de recepción de votación	Administración de la Operación de soluciones tecnológicas	Dar soporte a la operación del Sistema Sustitución de funcionarios de Mesas Directivas de Casilla	UTSI	Cambio fecha de inicio de 26/04/2021 a 13/04/2021	La fecha de inicio se actualizó de acuerdo con la actividad del PIYCPEF 20-21 "Realizar las sustituciones de integrantes de Mesas Directivas de Casilla"
36 5	Integración de órganos de recepción de votación	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Liberar el Sistema Sustitución de SE y CAE para pruebas y simulacros	UTSI	Cambio la fecha de inicio de 08/01/2021 a 11/01/2021 y de término de 11/01/2021 a 12/01/2021	Se revisó con el área usuaria los requerimientos y fechas relevantes, con lo que se actualizó el plan de trabajo, el cual está en proceso de formalización su última versión.

No	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Tipo de cambio	Justificación
48 1	Integración y funcionamiento de los Consejos Locales y Distritales	Designación de consejeras y consejeros de consejos locales del INE	Remitir las propuestas de los integrantes de los Consejos Locales a los representantes de los Partidos Políticos y a los Consejeros del Poder Legislativo del CG del INE	DEOE	Cambio de fecha de inicio de 11/08/2020 y de término 14/08/2020 a fecha de inicio 14/09/2020 y de término 14/09/2020	<p>La modificación de la fecha de inicio y término se requiere dado que el Acuerdo INE/CG175/2020, aprobado por el CG el 30 de julio del 2020, referente al "Procedimiento para integrar las propuestas de aspirantes para ocupar las vacantes de los cargos de consejeros y consejeras electorales de los consejos locales para los Procesos Electorales Federales 2020-2021 y 2023-2024", señala:</p> <p>SEGUNDO. El procedimiento a que se refiere el Punto de Acuerdo anterior, consistirá en lo siguiente: Procedimiento de designación (...) Tercera etapa: Análisis de los expedientes y selección de las y los Consejeros (...) La Presidencia de la Comisión correspondiente, a más tardar el 14 de septiembre de 2020, hará entrega de las propuestas a los representantes de los partidos políticos y a los Consejeros del Poder Legislativo ante el CG del Instituto y pondrá a su disposición los expedientes correspondientes, para sus observaciones y comentarios.</p>

No	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Tipo de cambio	Justificación
486	Integración y funcionamiento de los Consejos Locales y Distritales	Designación de consejeras y consejeros de consejos locales del INE	Remitir las observaciones formuladas por los representantes de los Partidos Políticos y los Consejeros del Poder Legislativo del CG del INE	DEOE / SE	Cambio de fecha de inicio 25/08/2020 y de término 25/08/2020 a fecha de inicio 25/09/2020 y de término 25/09/2020	<p>La modificación de la fecha de inicio y término se requiere dado que el Acuerdo INE/CG175/2020, aprobado por el CG el 30 de julio del 2020, referente al "Procedimiento para integrar las propuestas de aspirantes para ocupar las vacantes de los cargos de consejeros y consejeras electorales de los consejos locales para los Procesos Electorales Federales 2020-2021 y 2023-2024", señala:</p> <p>SEGUNDO. El procedimiento a que se refiere el Punto de Acuerdo anterior, consistirá en lo siguiente: Procedimiento de designación (...) Tercera etapa: Análisis de los expedientes y selección de las y los Consejeros (...) El 25 de septiembre de 2020, la Secretaría Ejecutiva remitirá las observaciones o comentarios presentados por cada uno de los partidos políticos y los Consejeros del Poder Legislativo, a la Presidencia de la Comisión correspondiente.</p>

No	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Tipo de cambio	Justificación
500	Integración y funcionamiento de los Consejos Locales y Distritales	Supervisión y seguimiento a la integración de los Órganos Desconcentrados temporales	Dar seguimiento al desarrollo de las sesiones de Consejos Locales y Distritales	DEOE	Cambio de fecha de inicio de 01/09/2020 y de término 31/08/2020 a fecha de inicio 03/11/2020 y de término 31/07/2021	<p>La modificación de la fecha de inicio y término se requiere dado que el Acuerdo INE/CG175/2020, aprobado por el CG en la sesión del 30 de julio del 2020, referente a "Procedimiento para integrar las propuestas de aspirantes para ocupar las vacantes de los cargos de consejeros y consejeras electorales de los consejos locales para los Procesos Electorales Federales 2020-2021 y 2023-2024", señala lo siguiente:</p> <p>QUINTO. Los Consejos Locales se instalarán el 3 noviembre para el Proceso Electoral Federal 2020-2021.</p> <p>La conclusión de las actividades durante el Proceso Electoral 2020-2021 por parte de los consejos se tiene prevista en el mes de julio de 2021, dado que la Jornada Electoral se celebrará el 6 de junio de 2021.</p>

No	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Tipo de cambio	Justificación
501	Integración y funcionamiento de los Consejos Locales y Distritales	Supervisión y seguimiento a la integración de los Órganos Desconcentrados temporales	Dar seguimiento a la acreditación y sustitución de representantes de Candidaturas Independientes ante los Órganos Desconcentrados temporales	DEOE	Cambio de fecha de inicio 15/09/2020 y de término 31/08/2021 a fecha de inicio 03/11/2020 y de término 31/07/2021	<p>Se requiere modificación de la fecha de inicio y término.</p> <p>El seguimiento a la acreditación y sustitución de representantes de Candidaturas Independientes ante los Órganos Desconcentrados temporales, se dará a partir de la instalación de los Consejos Locales acorde a lo señalado en el Acuerdo INE/CG175/2020, aprobado por el CG en la sesión del 30 de julio del 2020, referente a "Procedimiento para integrar las propuestas de aspirantes para ocupar las vacantes de los cargos de consejeros y consejeras electorales de los consejos locales para los Procesos Electorales Federales 2020-2021 y 2023-2024", señala lo siguiente: QUINTO. Los Consejos Locales se instalarán el 3 noviembre para el Proceso Electoral Federal 2020-2021.</p> <p>La conclusión de las actividades durante el Proceso Electoral 2020-2021 por parte de los consejos se tiene prevista en el mes de julio de 2021, dado que la Jornada Electoral se celebrará el 6 de junio de 2021.</p>

No	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Tipo de cambio	Justificación
50 2	Integración y funcionamiento de los Consejos Locales y Distritales	Supervisión y seguimiento a la integración de los Órganos Desconcentrados temporales	Dar seguimiento a la acreditación y sustitución de representantes de Partidos Políticos ante los Órganos Desconcentrados temporales	DEOE	Cambio de fecha de inicio de 15/09/202 y de término 31/08/2021 a fecha de inicio 03/11/2020 y de término 31/07/2021	<p>Se requiere modificación de la fecha de inicio y término.</p> <p>El seguimiento a la acreditación y sustitución de representantes de Partidos Políticos ante los Órganos Desconcentrados temporales, se dará a partir de la instalación de los Consejos Locales acorde a lo señalado en el Acuerdo INE/CG175/2020, aprobado por el CG en la sesión del 30 de julio del 2020, referente a "Procedimiento para integrar las propuestas de aspirantes para ocupar las vacantes de los cargos de consejeros y consejeras electorales de los consejos locales para los Procesos Electorales Federales 2020-2021 y 2023-2024", señala lo siguiente:</p> <p>QUINTO. Los Consejos Locales se instalarán el 3 noviembre para el Proceso Electoral Federal 2020-2021.</p> <p>La conclusión de las actividades durante el Proceso Electoral 2020-2021 por parte de los consejos se tiene prevista en el mes de julio de 2021, dado que la Jornada Electoral se celebrará el 6 de junio de 2021.</p>

No	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Tipo de cambio	Justificación
503	Integración y funcionamiento de los Consejos Locales y Distritales	Supervisión y seguimiento a la integración de los Órganos Desconcentrados temporales	Dar seguimiento a las inasistencias de representantes de Partidos Políticos y de Candidaturas Independientes a las sesiones de Consejos Locales y Distritales, para que se informe al CG	DEOE	Cambio de fecha de inicio 15/09/2020 y de término 31/08/2021 a fecha de inicio 03/11/2020 y de término 31/07/2021	<p>Se requiere modificación de la fecha de inicio y término.</p> <p>El seguimiento a la acreditación y sustitución de representantes de Partidos Políticos ante los Órganos Desconcentrados temporales, se dará a partir de la instalación de los Consejos Locales acorde a lo señalado en el Acuerdo INE/CG175/2020, aprobado por el CG en la sesión del 30 de julio del 2020, referente a "Procedimiento para integrar las propuestas de aspirantes para ocupar las vacantes de los cargos de consejeros y consejeras electorales de los consejos locales para los Procesos Electorales Federales 2020-2021 y 2023-2024", señala lo siguiente: QUINTO. Los Consejos Locales se instalarán el 3 noviembre para el Proceso Electoral Federal 2020-2021.</p> <p>La conclusión de las actividades durante el Proceso Electoral 2020-2021 por parte de los consejos se tiene prevista en el mes de julio de 2021, dado que la Jornada Electoral se celebrará el 6 de junio de 2021.</p>

No	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Tipo de cambio	Justificación
510	Integración y funcionamiento de los Consejos Locales y Distritales	Supervisión y seguimiento a la integración de los Órganos Desconcentrados temporales	Sesiones de Consejo Distrital	DEOE	Cambio de fecha de término del 30/07/2021 a 30/06/2021	Se requiere modificación de la fecha de término dado que se tiene prevista la conclusión de las actividades de los consejos distritales en el mes de junio de 2021, dado que la Jornada Electoral se celebrará el 6 de junio de 2021.
540	Planeación, aprobación y operación de los mecanismos de recolección de la Documentación Electoral al Término de la Jornada Electoral	Supervisión a la elaboración de los Estudios de factibilidad de los mecanismos de recolección	Dar seguimiento a la remisión del OPL al Consejo Local del INE de sus observaciones a los estudios de factibilidad y de la previsión presupuestal para la operación de los mecanismos de recolección de la elección local	DEOE	Cambio de fecha de término de 24/03/2021 a 24/04/2021	Se requiere modificación de la fecha de término dado que la actividad inicia y concluye en abril de 2021.

No	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Tipo de cambio	Justificación
54 5	Preparación y ejecución del cómputo de las Elecciones	Coordinación y seguimiento a la celebración de las sesiones de cómputos distritales	Elaborar los lineamientos para la sesión especial de cómputos distritales del Proceso Electoral 2020-2021	DEOE	Cambio fecha de término del 30/10/2020 al 30/11/2020	Se requiere modificación de la fecha de término dado que la actividad está en proceso de valoración, a efecto de reorientar su desarrollo de conformidad con los requerimientos de distanciamiento social en el contexto por la Pandemia por COVID-19. Aunado a lo anterior, a partir de las observaciones que se han recibido de diferentes oficinas, se trabaja en la reestructuración del documento base.

No	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Tipo de cambio	Justificación
588	Registro de candidaturas, plataformas electorales y coaliciones o acuerdos de participación	Revisión del cumplimiento de los requisitos de candidaturas, plataformas electorales y coaliciones o acuerdos de participación	Verificar que los métodos de selección, que en su momento sean informados por los Partidos Políticos, se encuentren apegados a lo señalado en el Acuerdo del CG respectivo, así como a la Ley Electoral y a la normativa interna de cada partido, y en su oportunidad rendir un Informe al CG	DEPPP	Cambio de fecha de término de 18/11/2020 a 15/12/2020	<p>Conforme al Acuerdo INE/CG308/2020, los partidos políticos nacionales con registro previo a 2020 debieron determinar el proceso aplicable para la selección de sus candidaturas a diputaciones federales a más tardar el 23 de octubre de 2020 y Encuentro Solidario, al ser un partido de nuevo registro, el 3 de noviembre.</p> <p>No obstante, en acatamiento a sentencias del TEPJF, se otorgó el registro a dos partidos políticos nacionales de forma adicional con efectos constitutivos el 20 de octubre, por lo que el plazo para informar de sus métodos de selección se estableció el 15 de noviembre. En ese sentido, es necesario modificar la fecha para contar con el tiempo que permita analizar la documentación y solventar las observaciones que puedan presentarse para rendir ante el CG un solo informe respecto de los diez partidos políticos nacionales.</p>

No	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Tipo de cambio	Justificación
610	Verificación, diagnóstico y validez del Padrón Electoral	Seguimiento y coordinación de los trabajos del Comité Técnico de Evaluación del Padrón Electoral	Elaborar y someter a consideración del CG el Proyecto de Acuerdo por el que se dispone la creación del Comité Técnico de Evaluación del Padrón Electoral para el Proceso Electoral Federal 2020-2021.	DERFE	Actividad desincorporada	Derivado de un análisis a las actividades del PlyCPEF por el área de Planeación Institucional de la Secretaría Ejecutiva del INE, se localizaron dos actividades que se encuentran duplicadas, por lo que se propone eliminar la actividad 610.
618	Promoción del Voto y Participación Ciudadana	Supervisión y seguimiento del Programa de Promoción de la Participación Ciudadana en el Proceso Electoral Concurrente 2020-2021	Presentar el informe del diseño del Programa de Promoción de la Participación Ciudadana 2020-2021 a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral	DECEYE C	Incorporación de actividad nueva	Permitirá presentar los elementos de seguimiento que faciliten la implementación de las actividades de promoción de la participación ciudadana, enunciando los resultados de las propuestas iniciales consultadas a las y los VCEyEC de los Órganos Desconcentrados y los ajustes impactados derivados de estos análisis.

No	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Tipo de cambio	Justificación
619	Promoción del Voto y Participación Ciudadana	Supervisión y seguimiento del Programa de Promoción de la Participación Ciudadana en el Proceso Electoral Concurrente 2020-2021	Presentar el primer informe de la implementación del Programa de Promoción de la Participación Ciudadana 2020-2021 a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral	DECEYE C	Incorporación de actividad nueva	La presentación de este informe facilitará la detección de acciones territoriales en materia de promoción de la participación ciudadana de manera diferenciada, ubicando los niveles de respuesta de los Órganos Desconcentrados y permitiendo atacar de manera oportuna las prácticas necesarias para la difusión e implementación de las acciones de promoción del voto.
620	Promoción del Voto y Participación Ciudadana	Supervisión y seguimiento del Programa de Promoción de la Participación Ciudadana en el Proceso Electoral Concurrente 2020-2021	Presentar el segundo informe de la implementación del Programa de Promoción de la Participación Ciudadana 2020-2021 a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral	DECEYE C	Incorporación de actividad nueva	Derivado de la detección de acciones territoriales en materia de promoción de la participación ciudadana de manera diferenciada, en un primer informe, se continuará con el monitoreo a los Órganos Desconcentrados, otorgando un especial seguimiento a las entidades con bajos niveles de actividad, lo que permitirá la detección oportuna de estrategias de implementación alternativas para la difusión e implementación de las acciones de promoción del voto.

No	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Tipo de cambio	Justificación
62 1	Promoción del Voto y Participación Ciudadana	Supervisión y seguimiento del Programa de Promoción de la Participación Ciudadana en el Proceso Electoral Concurrente 2020-2021	Presentar al CG el informe final del Programa de Promoción de la Participación Ciudadana 2020-2021 a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral	DECEYE C	Incorporación de actividad nueva	Este documento permitirá analizar el impacto de las acciones en materia de promoción de la participación ciudadana realizando un análisis cuantitativo y cualitativo que determine qué actividades pueden seguir su implementación durante los Procesos Electorales subsecuentes, cuáles deberán ser rediseñadas y las acciones que deberán ser eliminadas ante su bajo impacto o bajo nivel de respuesta.
62 3	Fiscalización de apoyo ciudadano, pre campaña y campaña	Seguimiento a la fiscalización de los Procesos Electorales Federales y Locales 2020-2021	Informar a la DEPPP los nombres de las precandidaturas a diputaciones federales que no hubieren presentado informe de precampaña.	UTF	Incorporación de actividad nueva	Del acuerdo del CG INE/CG308/2020 en el punto de acuerdo DECIMÓ PRIMERO, se localizó que dicho punto de acuerdo mandata que se informe a la DEPPP los nombres de las precandidaturas a diputaciones federales que no hubieren presentado informe de precampaña, por lo que para dar cumplimiento a lo mandatado en dicho acuerdo se propone adicionar la actividad.
