
Informe del seguimiento al Plan Integral y
Calendarios de Coordinación de los Procesos
ElectORAles Locales Ordinarios 2017-2018

Ciudad de México, a 30 de noviembre de 2017

Contenido

Glosario	1
Introducción	1
Procesos Electorales Locales Ordinarios 2017-2018	4
Modificaciones a los Calendarios de Coordinación	5
Avance del cumplimiento	14
Actividades concluidas fuera del plazo establecido	17
Actividades en proceso de ejecución	25
Avance del cumplimiento de actividades por subprocesos	26
De las actividades de partidos políticos	33
Proceso Electoral Local Extraordinario	35

Glosario

Comisión:	Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales
Consejo General:	Consejo General del Instituto Nacional Electoral
DEOE:	Dirección Ejecutiva de Organización Electoral
INE:	Instituto Nacional Electoral
LGPE:	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
OPL:	Organismos Públicos Locales
SIJE:	Sistema de Información de la Jornada Electoral
UTVOPL:	Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales

Introducción

El 8 de septiembre de 2017, el Consejo General emitió el acuerdo número INE/CG430/2017, a través del cual aprobó el Plan Integral y Calendarios de Coordinación de los Procesos Electorales Locales concurrentes con el Federal 2017-2018, por el cual se mandata a la Comisión llevar a cabo el seguimiento del grado de avance de cada uno de los procedimientos y actividades identificadas cronológicamente.

El seguimiento de los calendarios, se estructuró de la siguiente forma:

1. Consecutivo,
2. Subproceso,
3. Actividad,
4. Adscripción y órgano responsable, y
5. Periodo de ejecución.

Los subprocesos, que definen la integración del calendario, se componen por diversas actividades con un periodo de ejecución específico y por la adscripción del órgano responsable de realizarla, así como por la etapa de cumplimiento dentro del cuerpo de actividades.

Las actividades de coordinación interinstitucional se encuentran agrupadas en los siguientes subprocesos:

1. Mecanismos de coordinación
2. Integración y funcionamiento de órganos desconcentrados
3. Lista Nominal de Electores
4. Observadores electorales
5. Ubicación de casillas
6. Integración de las Mesas Directivas de Casilla
7. Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos
8. Candidaturas
9. Documentación y material electoral
10. Bodegas electorales
11. Voto de los ciudadanos residentes en el extranjero
12. Jornada Electoral
13. Mecanismos de recolección y
14. Cómputos

Es importante señalar que el número de subprocesos no es el mismo para las 30 entidades, ya que, de ellas, solamente 9 tendrán elección para renovar al titular del poder ejecutivo local y de esas, 7 entidades contemplan el ejercicio del voto de sus ciudadanos residentes en el extranjero. En razón de ello, en 7 entidades se dará seguimiento a 14 subprocesos y, en los 23 restantes, a 13.

De la misma forma, el número de actividades de cada subproceso, en los que tienen actividades directas de realización y determinación los OPL, es diferente por entidad, considerando el tipo de cargo a elegir. Los subprocesos que inciden en este apartado son:

- Integración y funcionamiento de órganos desconcentrados
- Observadores electorales
- Integración de las Mesas Directivas de Casilla
- Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos
- Candidaturas
- Documentación y material electoral
- Voto de los ciudadanos residentes en el extranjero

- Jornada Electoral
- Cómputos

La división de los calendarios bajo este esquema, permite realizar cruces de actividades y plazos de cumplimiento para determinar no solo el número de actividades iniciadas y terminadas en los plazos establecidos, sino que también permitirá determinar en forma cualitativa el detalle del cumplimiento.

De la misma forma, se informa sobre el seguimiento del Plan Integral y Calendario de Coordinación para el proceso electoral extraordinario en la Primera Demarcación del municipio de San Blas, Nayarit, donde se elegirá Regidor.

Procesos Electorales Locales Ordinarios 2017-2018

El Consejo General, mediante la resolución INE/CG386/2017, en ejercicio de la facultad de atracción, resolvió en sesión extraordinaria de fecha 28 de agosto de 2017, que para los procesos electorales federal y local la fecha de término de las precampañas sea el 11 de febrero de 2018; la fecha máxima de periodos para recabar el apoyo ciudadano de las y los aspirantes a candidatos independientes, será el 6 de febrero de 2018, con excepción de la Ciudad de México para el cargo de Jefe de Gobierno, que como consecuencia del sismo del mes de septiembre el plazo se amplió hasta el 12 de febrero de 2018; se establecieron las fechas límite para aprobación del registro de candidaturas por las autoridades competentes, para realizarse a más tardar el 29 de marzo de 2018 para las candidaturas a gubernaturas así como todos aquellos cargos de los procesos electorales locales en donde la duración de las campañas sea mayor a sesenta días y el 20 de abril de 2018 para los Procesos Electorales Locales restantes.

Derivado de la resolución mencionada en el párrafo anterior, en función de las fechas señaladas, los OPL ajustaron los plazos en los calendarios correspondientes.

A la fecha de la presentación del presente informe, 25 entidades han dado inicio formal a sus procesos electorales conforme a la siguiente tabla:

Entidad	Fecha
Aguascalientes	06/10/2017
Campeche	21/09/2017
Coahuila	01/11/2017
Colima	12/10/2017
Chiapas	07/10/2017
Ciudad de México	06/10/2017
Durango	01/11/2017
Guanajuato	08/09/2017
Guerrero	08/09/2017
Jalisco	01/09/2017
Estado de México	06/09/2017
Michoacán	08/09/2017
Morelos	08/09/2017

Entidad	Fecha
Nuevo León	06/11/2017
Oaxaca	06/09/2017
Puebla	03/11/2017
Querétaro	01/09/2017
San Luis Potosí	01/09/2017
Sinaloa	27/09/2017
Sonora	08/09/2017
Tabasco	01/10/2017
Tamaulipas	10/09/2017
Veracruz	01/11/2017
Yucatán	06/09/2017
Zacatecas	07/09/2017

Los OPL de las entidades que aún están pendientes, iniciarán sus respectivos procesos conforme a las siguientes fechas:

Entidad	Fecha
Baja California Sur	01/12/2017
Chihuahua	01/12/2017
Hidalgo	15/12/2017
Quintana Roo	20/12/2017
Tlaxcala	01/01/2018

Modificaciones a los Calendarios de Coordinación

Del 17 de octubre del presente año, fecha de corte del informe anterior, al 30 de noviembre de este mismo año, los OPL han informado al Instituto, la determinación de plazos y actividades, relativas a la homologación de plazos, así como algunos que aún no se habían definido, conforme a la siguiente tabla:

Organismo Público Local	Nombre de la actividad	Inicio	Término	Plazos modificados	
				Inicio	Término
Baja California Sur	Aprobación de topes de gastos de precampaña.	01/12/2017	10/12/2017	01/10/2017	31/10/2017
Baja California Sur	Plazo en que los partidos políticos deberán acreditar representantes ante los consejos distritales y municipales del OPL	Sin definición	Sin definición	15/11/2017	30/11/2017
Baja California Sur	Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente al cargo de Diputados y Ayuntamientos	04/11/2017	08/12/2017	15/11/2017	08/12/2017
Baja California Sur	Solicitud de registro Candidatura Común	01/12/2017	05/04/2018	01/12/2017	04/04/2018
Baja California Sur	Los partidos políticos deberán informar al Consejo General la selección interna de candidatos	08/09/2017	23/10/2017	Sin definición	Sin definición
Chihuahua	Aprobación de topes de gastos de precampaña para Diputados	Sin definición	Sin definición	06/11/2017	14/11/2017
Chihuahua	Aprobación de topes de gastos de precampaña para Ayuntamientos	Sin definición	Sin definición	06/11/2017	14/11/2017
Chihuahua	Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente de Diputados	Sin definición	Sin definición	05/12/2017	30/12/2017
Chihuahua	Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente de Ayuntamientos (Presidentes y Síndicos)	Sin definición	Sin definición	05/12/2017	30/12/2017
Chihuahua	Resolución sobre la procedencia de manifestaciones de intención de candidatos independientes	Sin definición	Sin definición	14/01/2018	14/01/2018
Chihuahua	Plazo para obtener al apoyo ciudadano de los Candidatos Independientes a Diputados de Mayoría Relativa	08/01/2018	06/02/2018	15/01/2018	06/02/2018
Chihuahua	Plazo para obtener al apoyo ciudadano de los Candidatos Independientes para Ayuntamientos (Presidente y Síndico)	08/01/2018	06/02/2018	15/01/2018	06/02/2018

Organismo Público Local	Nombre de la actividad	Inicio	Término	Plazos modificados	
				Inicio	Término
Chihuahua	Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de candidatos independientes para Ayuntamientos, Presidentes y Síndicos (verificar apoyo ciudadano)	Sin definición	Sin definición	12/02/2018	18/03/2018
Chihuahua	Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de candidatos independientes para diputados (verificar apoyo ciudadano)	Sin definición	Sin definición	12/02/2018	18/03/2018
Chihuahua	Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputados	Sin definición	Sin definición	01/03/2018	31/03/2018
Chihuahua	Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos	Sin definición	Sin definición	01/03/2018	31/03/2018
Ciudad de México	Los partidos políticos deberán informar al Consejo General el método de selección interna de candidatos a Gobernador, diputados y alcaldías	08/11/2017	10/11/2017	02/11/2017	04/11/2017
Ciudad de México	Plazo en el que los partidos políticos deberán realizar el proceso de selección interna de sus candidatos	01/12/2017	08/03/2018	01/12/2017	11/02/2018
Ciudad de México	Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a candidaturas independientes a Diputados	09/10/2017	21/10/2017	08/12/2017	14/12/2017
Ciudad de México	Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a Candidato Independientes a Alcaldías	16/10/2017	20/10/2017	08/12/2017	14/12/2017
Colima	Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputados	01/01/2018	31/01/2018	15/12/2017	15/12/2017
Colima	Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos	01/01/2018	31/01/2018	15/12/2017	15/12/2017
Durango	Plazo en que los partidos políticos deberán acreditar representantes ante los consejos municipales del OPL	15/10/2017	14/11/2017	08/11/2017	07/12/2017
Guerrero	Instalación de Consejos Distritales del OPL	25/11/2017	25/11/2017	30/11/2017	30/11/2017

Organismo Público Local	Nombre de la actividad	Inicio	Término	Plazos modificados	
				Inicio	Término
Guerrero	Emisión de la convocatoria para candidatos independientes a Diputados	27/11/2017	27/11/2017	01/12/2017	01/12/2017
Guerrero	Emisión de la convocatoria para candidatos independientes a Ayuntamientos	27/11/2017	27/11/2017	01/12/2017	01/12/2017
Jalisco	Plazo en que los partidos políticos deberán acreditar representantes ante los consejos distritales del OPL	01/09/2017	15/12/2017	01/09/2017	16/01/2018
Jalisco	Los partidos políticos deberán informar al Consejo General el método de selección interna de candidatos	06/11/2017	19/11/2017	04/09/2017	16/11/2017
Jalisco	Instalación de Consejos Distritales del OPL	01/09/2017	15/12/2017	16/01/2018	16/01/2018
Michoacán	Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputado	18/09/2017	23/01/2018	14/01/2017	23/01/2017
Michoacán	Resolución sobre convenio de coalición de Ayuntamientos	18/09/2017	23/01/2018	14/01/2017	23/01/2017
Nuevo León	Los partidos políticos deberán informar al Consejo General el método de selección interna de candidatos	06/11/2017	05/01/2018	06/11/2017	15/01/2018
Nuevo León	Plazo en el que los partidos políticos determinarán el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos	06/11/2017	05/01/2018	06/11/2017	12/01/2018
Nuevo León	Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Diputados	08/11/2017	08/12/2017	09/11/2017	08/12/2017
Nuevo León	Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Ayuntamientos	08/11/2017	08/12/2017	09/11/2017	08/12/2017
Nuevo León	Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de candidatos independientes para Diputados	08/11/2017	13/12/2017	09/11/2017	13/12/2017

Organismo Público Local	Nombre de la actividad	Inicio	Término	Plazos modificados	
				Inicio	Término
Nuevo León	Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de candidatos independientes para Ayuntamientos	08/11/2017	13/12/2017	09/11/2017	13/12/2017
Nuevo León	Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Diputados	09/11/2017	08/12/2017	17/11/2017	16/12/2017
Nuevo León	Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Ayuntamientos	09/11/2017	08/12/2017	17/11/2017	16/12/2017
Nuevo León	Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de candidatos independientes para Diputados	09/11/2017	13/12/2017	17/11/2017	22/12/2017
Nuevo León	Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de candidatos independientes para Ayuntamientos	09/11/2017	13/12/2017	17/11/2017	22/12/2017
Nuevo León	Solicitud de registro de candidatos de partidos políticos y candidaturas independientes para Diputados	14/04/2018	09/05/2018	22/03/2018	15/04/2018
Nuevo León	Solicitud de registro de candidatos de partidos políticos y candidaturas independientes para Ayuntamientos	14/04/2018	09/05/2018	22/03/2018	15/04/2018
Nuevo León	Resolución para aprobar las candidaturas para Diputados (de partidos políticos y candidatos independientes)	20/04/2018	20/04/2018	16/04/2018	20/04/2018
Nuevo León	Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos (de partidos políticos y candidatos independientes)	20/04/2018	20/04/2018	16/04/2018	20/04/2018
Nuevo León	Convocatoria para la integración de las Comisiones Municipales del OPL	Sin definición	Sin definición	06/11/2018	13/11/2018

Organismo Público Local	Nombre de la actividad	Inicio	Término	Plazos modificados	
				Inicio	Término
Puebla	Los partidos políticos deberán informar al Consejo General el método de selección interna de candidatos	29/10/2017	27/02/2018	29/10/2017	10/02/2017
Querétaro	Aprobación de topes de gastos de precampaña	01/09/2017	15/10/2018	01/09/2017	15/10/2017
Querétaro	Resolución sobre convenio de coalición para diputados	11/09/2017	08/11/2017	11/09/2017	23/01/2018
Querétaro	Resolución sobre convenio de coalición para ayuntamientos	11/09/2017	08/11/2017	11/09/2017	23/01/2018
Querétaro	Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Diputados	Sin definición	Sin definición	19/09/2017	17/10/2017
Querétaro	Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Ayuntamientos	Sin definición	Sin definición	19/09/2017	17/10/2017
Querétaro	Plazo para obtener al apoyo ciudadano de los Candidatos Independientes para la elección de Diputados	24/10/2017	06/02/2018	08/01/2018	06/02/2018
Querétaro	Plazo para obtener al apoyo ciudadano de los Candidatos Independientes para la elección de Ayuntamientos	24/10/2017	06/02/2018	08/01/2018	06/02/2018
Querétaro	Precampaña para Diputados	29/10/2017	11/02/2018	13/01/2018	11/02/2018
Querétaro	Precampaña para Ayuntamientos	29/10/2017	11/02/2018	13/01/2018	11/02/2018
Querétaro	Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputados	01/09/2017	29/10/2017	01/09/2017	13/01/2018
Querétaro	Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos	01/09/2017	29/10/2017	01/09/2017	13/01/2018
Querétaro	Plazo en el que los partidos políticos determinarán el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos	01/09/2017	14/10/2017	01/09/2017	29/12/2017
Quintana Roo	Sesión del Consejo General del OPL para dar inicio al PEL	15/02/2018	15/02/2018	20/12/2017	20/12/2017

Organismo Público Local	Nombre de la actividad	Inicio	Término	Plazos modificados	
				Inicio	Término
Quintana Roo	Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos	Sin definición	03/01/2018	20/12/2017	13/01/2018
Quintana Roo	Resolución sobre el registro de convenio de coalición de ayuntamiento	Sin definición	13/01/2018	30/12/2017	23/01/2018
Quintana Roo	Etapas de obtención de respaldo ciudadano de los aspirantes a candidatos independientes	24/01/2018	06/02/2018	14/01/2018	06/02/2018
Quintana Roo	Campaña para Ayuntamientos	29/04/2018	27/06/2018	14/05/2018	27/06/2018
San Luis Potosí	Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputados	10/09/2017	31/10/2017	10/09/2017	27/04/2018
San Luis Potosí	Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos	10/09/2017	31/10/2017	10/09/2017	27/04/2018
Sonora	Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente a Diputado	16/12/2017	17/01/2018	09/11/2017	17/01/2018
Sonora	Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente a Ayuntamientos.	16/12/2017	17/01/2018	09/11/2017	17/01/2018
Tabasco	Plazo en que los partidos políticos deberán acreditar representantes ante los consejos distritales del OPL	Sin definición	Sin definición	17/12/2017	15/01/2018
Tamaulipas	Sesión en la que se designan e integran los Consejos Municipales	15/11/2017	15/11/2017	10/12/2017	10/12/2017
Tamaulipas	Campaña para Ayuntamientos	29/04/2018	27/06/2018	14/05/2018	27/06/2018
Tlaxcala	Plazo para el registro de plataformas electorales	01/01/2018	22/01/2018	01/01/2018	01/03/2018
Tlaxcala	Plazo en que los partidos políticos deberán presentar al Consejo General del Organismo Público Local el registro de plataformas electorales	01/01/2018	22/01/2018	01/01/2018	01/03/2018

Organismo Público Local	Nombre de la actividad	Inicio	Término	Plazos modificados	
				Inicio	Término
Tlaxcala	Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de candidatos independientes	26/03/2018	02/04/2018	10/02/2018	20/02/2018
Tlaxcala	Resolución para aprobar las candidaturas para Diputados (de partidos políticos y candidatos independientes)	20/04/2018	20/04/2018	02/04/2018	20/04/2018
Veracruz	Plazo en el que los partidos políticos determinarán el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos	Sin definición	23/11/2017	23/11/2017	23/11/2017
Veracruz	Plazo en el que los partidos políticos deberán realizar el proceso de selección interna de sus candidatos	03/12/2017	Sin definición	03/12/2017	25/02/2018
Veracruz	Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a candidaturas independientes a Gobernador	Sin definición	Sin definición	08/12/2017	08/12/2017
Veracruz	Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a candidaturas independientes a Diputados	Sin definición	Sin definición	07/01/2018	07/01/2018
Veracruz	Precampaña para Diputados	03/01/2018	11/02/2018	23/01/2018	11/02/2018
Veracruz	Campaña para Diputados	29/04/2018	27/06/2018	29/05/2018	27/06/2018
Veracruz	Plazo en que los partidos políticos deberán retirar la propaganda electoral	Sin definición	Sin definición	08/07/2018	08/07/2018
Yucatán	Instalación de Consejos Distritales del OPL	01/11/2017	15/11/2017	01/12/2017	13/12/2017
Yucatán	Instalación de Consejos Municipales del OPL	01/11/2017	15/11/2017	01/12/2017	13/12/2017
Yucatán	Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente a Gobernador	08/12/2017	06/02/2018	09/12/2017	06/02/2018
Yucatán	Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente de Diputados	08/12/2017	06/02/2018	09/12/2017	06/02/2018
Yucatán	Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente para Ayuntamientos	08/12/2017	06/02/2018	09/12/2017	06/02/2018

Organismo Público Local	Nombre de la actividad	Inicio	Término	Plazos modificados	
				Inicio	Término
Yucatán	Solicitud de registro Candidatura Común para Diputados	05/04/2018	12/04/2018	11/03/2018	18/03/2018
Yucatán	Solicitud de registro Candidatura Común para Ayuntamientos	05/04/2018	12/04/2018	11/03/2018	18/03/2018
Yucatán	Resolución del registro de Candidatura Común para Diputados	22/04/2018	22/04/2018	20/04/2018	20/04/2018
Yucatán	Resolución del registro de Candidatura Común para Ayuntamientos	22/04/2018	22/04/2018	20/04/2018	20/04/2018

Cabe mencionar que, derivado de la determinación del OPL de Quintana Roo, en su calendario se agregó la siguiente actividad:

Nombre de la actividad	Inicio	Término
Plazo para obtener apoyo ciudadano	14/01/2018	06/02/2018

Todo lo anterior atendiendo lo que establece el artículo 73 del Reglamento de Elecciones, así como al punto resolutivo Tercero del acuerdo del Consejo General número INE/CG430/2017.

Avance del cumplimiento


En las 30 entidades con procesos electorales locales ordinarios concurrentes con el federal 2017-2018, ha iniciado un total de 1,075 actividades, conforme a lo que se muestra en la siguiente tabla:

Organismo Público Local	Número de actividades programadas	Número de actividades iniciadas		Número de actividades concluidas	
Aguascalientes	100	31	31.0%	19	19.0%
Baja California Sur	105	27	25.7%	16	15.2%
Campeche	126	40	31.7%	21	16.7%
Coahuila	97	32	33.0%	20	20.6%
Colima	109	29	26.6%	16	14.7%
Chiapas	137	41	29.9%	21	15.3%
Chihuahua	113	26	23.0%	15	13.3%
Ciudad de México	136	46	33.8%	17	12.5%
Durango	101	32	31.7%	20	19.8%
Guanajuato	140	45	32.1%	26	18.6%
Guerrero	116	37	31.9%	17	14.7%
Hidalgo	99	26	26.3%	14	14.1%
Jalisco	129	46	35.7%	25	19.4%
Estado de México	112	43	38.4%	26	23.2%
Michoacán	117	35	29.9%	20	17.1%
Morelos	134	45	33.6%	21	15.7%
Nuevo León	112	39	34.8%	18	16.1%
Oaxaca	110	36	32.7%	21	19.1%
Puebla	136	35	25.7%	18	13.2%
Querétaro	117	43	36.8%	25	21.4%
Quintana Roo	99	25	25.3%	14	14.1%
San Luis Potosí	115	39	33.9%	26	22.6%
Sinaloa	105	33	31.4%	19	18.1%
Sonora	114	40	35.1%	17	14.9%
Tamaulipas	102	35	34.3%	19	18.6%
Tabasco	127	34	26.8%	18	14.2%

Organismo Público Local	Número de actividades programadas	Número de actividades iniciadas	Número de actividades concluidas
Tlaxcala	99	23	13
Veracruz	108	34	19
Yucatán	137	42	21
Zacatecas	116	36	19
Totales	3,468	1,075	581

Las actividades iniciadas, inciden en todos los subprocesos de los calendarios de coordinación y representan 31.00% de avance del total de los calendarios de las 30 entidades.

CUMPLIMIENTO 2017-2018

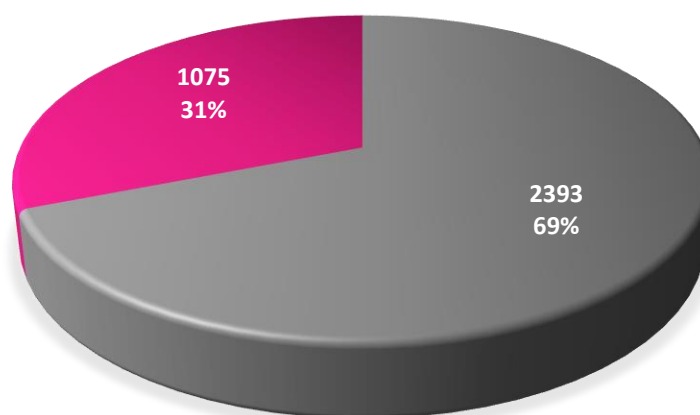


■ Por iniciar ■ Iniciadas

Detalle del cumplimiento de actividades

Aunado a lo anterior, a continuación se detalla el nivel de cumplimiento de las actividades, diferenciando por el estatus de cada una de ellas; es decir, si conforme a los parámetros establecidos en el Plan Integral, las actividades se encuentran a) han iniciado dentro de los plazos, b) han iniciado fuera de los plazos, c) han concluido dentro de los plazos establecidos, d) han concluido fuera de los plazos establecidos, e) se encuentran en proceso de ejecución dentro del plazo determinado y f) se encuentran en proceso de ejecución fuera del plazo determinado.

Es así que a la fecha hay un total de 1,075 actividades iniciadas, de las cuales 581 han finalizado y 494 se encuentran en ejecución, como se muestra a continuación:

ACTIVIDADES INICIADAS

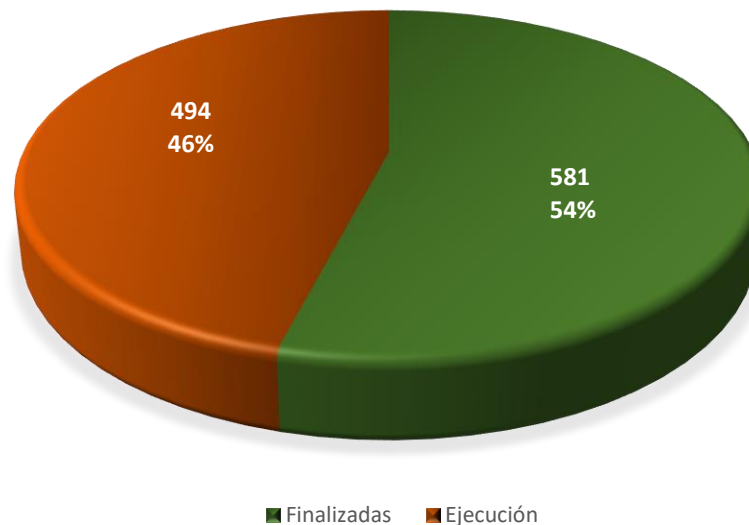

Actividades concluidas fuera del plazo establecido

De las 577 actividades que han finalizado, 499 (86.48%) fueron ejecutadas dentro de los plazos calendarizados y 78 (13.52%) fuera de los mismos.

Los plazos en que se desarrollaron las 78 actividades referidas en el párrafo anterior, se reseñan a continuación:

Entidad	Actividad	INE/OPL	UR	Plazo programado		Fecha real de término
				Inicio	Término	
Aguascalientes	Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL	INE	DEOE	20/09/2017	25/09/2017	09/11/2017
Chiapas	Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL	INE	DEOE	20/09/2017	25/09/2017	10/11/2017
Chihuahua	Corrección y validación de materiales de capacitación para elecciones locales	INE	JLE	15/09/2017	30/10/2017	31/10/2017
Coahuila	Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, tanto para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero como para la votación en territorio nacional, en medios impresos y electrónicos	OPL	CG	10/09/2017	16/09/2017	27/09/2017
Coahuila	Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL	INE	DEOE	20/09/2017	25/09/2017	09/11/2017

Entidad	Actividad	INE/OPL	UR	Plazo programado		Fecha real de término
				Inicio	Término	
Coahuila	Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos	OPL	CG	31/08/2017	31/08/2017	28/09/2017
Colima	Emisión de la convocatoria para los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales	INE/OPL	CG	08/08/2017	08/09/2017	09/10/2017
Colima	Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL	INE	DEOE	20/09/2017	25/09/2017	23/11/2017
Durango	Emisión de la convocatoria para los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales	INE/OPL	CG	08/08/2017	01/11/2017	02/11/2017
Durango	Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL	INE	DEOE	20/09/2017	25/09/2017	10/11/2017
Estado de México	Sesión del Consejo General del OPL, en la que se designan Consejeros Municipales	OPL	CG	01/11/2017	10/11/2017	14/11/2017
Estado de México	Convocatoria para la designación de Consejeros Electorales Distritales y Municipales.	OPL	CG	02/09/2017	02/09/2017	08/09/2017
Estado de México	Emisión de la Convocatoria a ciudadanos interesados en postularse como candidatos independientes a cargos de elección popular	OPL	CG	10/11/2017	10/11/2017	19/10/2017

Entidad	Actividad	INE/OPL	UR	Plazo programado		Fecha real de término
				Inicio	Término	
Estado de México	Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, tanto para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero como para la votación en territorio nacional, en medios impresos y electrónicos	OPL	CG	10/09/2017	16/09/2017	18/09/2017
Guanajuato	Emisión de la convocatoria para los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales	INE/OPL	CG	08/08/2017	08/09/2017	29/09/2017
Guerrero	Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL	INE	DEOE	20/09/2017	25/09/2017	09/11/2017
Guerrero	Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos	OPL	CG	31/08/2017	31/08/2017	01/09/2017
Hidalgo	Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, tanto para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero como para la votación en territorio nacional, en medios impresos y electrónicos	OPL	CG	10/09/2017	16/09/2017	21/09/2017
Jalisco	Sesión en la que se designan e integran los Consejos Distritales del OPL	OPL	CG	01/09/2017	31/10/2017	29/11/2017

Entidad	Actividad	INE/OPL	UR	Plazo programado		Fecha real de término
				Inicio	Término	
Jalisco	Emisión de la convocatoria para los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales	INE/OPL	CG	08/08/2017	08/09/2017	25/09/2017
Jalisco	Intercambio de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE	INE/OPL	VEL/OPL	30/10/2017	25/11/2017	28/11/2017
Jalisco	Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL	INE	DEOE	20/09/2017	25/09/2017	15/07/2017
Jalisco	En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral	OPL	CG	25/09/2017	30/09/2017	28/11/2017
Michoacán	Emisión de la convocatoria para los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales	INE/OPL	CG	08/08/2017	08/09/2017	14/09/2017
Michoacán	Corrección y validación de materiales de capacitación para elecciones locales	INE	JLE	15/09/2017	30/10/2017	09/11/2017
Michoacán	Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputados	OPL	CG	13/09/2017	13/09/2017	14/09/2017
Michoacán	Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos	OPL	CG	13/09/2017	13/09/2017	14/09/2017

Entidad	Actividad	INE/OPL	UR	Plazo programado		Fecha real de término
				Inicio	Término	
Michoacán	Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, tanto para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero como para la votación en territorio nacional, en medios impresos y electrónicos	OPL	CG	10/09/2017	16/09/2017	18/09/2017
Morelos	Sesión en la que se designan e integran los Consejos Distritales y Municipales Electorales	OPL	CG	18/11/2017	18/11/2017	21/11/2017
Morelos	Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL	INE	DEOE	20/09/2017	25/09/2017	11/11/2017
Morelos	En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral	OPL	CG	25/09/2017	30/09/2017	11/11/2017
Nuevo León	Emisión de la convocatoria para los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales	INE/OPL	CG	08/08/2017	06/11/2017	15/11/2017
Nuevo León	Remisión de materiales de capacitación por parte del OPL a la JLE para revisión	OPL	CG	14/08/2017	08/10/2017	11/10/2017
Oaxaca	Emisión de la convocatoria para los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales	INE/OPL	CG	08/08/2017	08/09/2017	15/11/2017
Oaxaca	Remisión de materiales de capacitación por parte del OPL a la JLE para revisión	OPL	CG	14/08/2017	08/10/2017	24/10/2017

Entidad	Actividad	INE/OPL	UR	Plazo programado		Fecha real de término
				Inicio	Término	
Oaxaca	Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, tanto para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero como para la votación en territorio nacional, en medios impresos y electrónicos	OPL	CG	10/09/2017	16/09/2017	08/11/2017
Puebla	Corrección y validación de materiales de capacitación para elecciones locales	INE	JLE	15/09/2017	30/10/2017	31/10/2017
Querétaro	Emisión de la convocatoria para los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales	INE/OPL	CG	08/08/2017	08/09/2017	18/09/2017
Querétaro	Sesión del Consejo General para emitir la convocatoria para participar como candidatos independientes en la elección de Diputados.	OPL	CG	01/09/2017	30/09/2017	18/09/2017
Querétaro	Sesión del Consejo General para emitir la convocatoria para participar como candidatos independientes en la elección de Ayuntamientos.	OPL	CG	01/09/2017	30/09/2017	18/09/2017
San Luis Potosí	Emisión de la convocatoria para los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales	INE/OPL	CG	08/08/2017	08/09/2017	22/09/2017
San Luis Potosí	Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, tanto para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero como para la votación en territorio nacional, en medios impresos y electrónicos	OPL	CG	10/09/2017	16/09/2017	18/09/2017

Entidad	Actividad	INE/OPL	UR	Plazo programado		Fecha real de término
				Inicio	Término	
San Luis Potosí	Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL	INE	DEOE	20/09/2017	25/09/2017	23/11/2017
Sinaloa	Emisión de la convocatoria para los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales	INE/OPL	CG	08/08/2017	08/09/2017	31/10/2017
Sonora	Emisión de la convocatoria para los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales	INE/OPL	CG	08/08/2017	08/09/2017	13/10/2017
Tamaulipas	Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL	INE	DEOE	20/09/2017	25/09/2017	09/11/2017
Veracruz	Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL	INE	DEOE	20/09/2017	25/09/2017	10/11/2017
Zacatecas	Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, tanto para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero como para la votación en territorio nacional, en medios impresos y electrónicos	OPL	CG	10/09/2017	16/09/2017	26/09/2017

Es así que, en conjunto con las 48 actividades que se reseñan en la tabla anterior, en las 30 entidades se cumplió fuera del plazo, la siguiente:

Entidad	Actividad	Adscripción	UR	Plazo programado		Fecha real de término
				Inicio	Término	
30 entidades	Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2018	INE	DEOE	01/07/2017	08/09/2017	16/10/2017

Actividades en proceso de ejecución

De las 496 que se encuentran en periodo de ejecución, 413 (83.27%) se encuentran en ejecución dentro de los plazos determinados y 83 (16.73%), se están ejecutando fuera del plazo de término establecido.

Las 83 actividades que se encuentran en ejecución fuera de los plazos establecidos en los calendarios de coordinación son las siguientes:

1. Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por los OPL.

Esta actividad ha sido cumplida por los OPL en las entidades de Coahuila, Colima, Durango, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Morelos, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz.

2. En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral.

Sólo ha sido atendido por Morelos.

3. Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas.

Están pendientes por cumplimiento las 30 entidades.

Es conveniente resaltar que, la Comisión de Organización y Capacitación Electoral, determinó, con posterioridad a la aprobación del Plan Integral y Calendarios de Coordinación, un calendario para el desarrollo de estas actividades, con el cual se están guiando los OPL y la DEOE para el cumplimiento de estas actividades.

De igual forma, sigue pendiente por parte del OPL de la Ciudad de México, la aprobación de sus lineamientos para la sesión especial de cómputo, lo cual está sujeto a la consulta formulada al INE.

Avance del cumplimiento de actividades por subprocesos

De conformidad con lo establecido en el Plan Integral, es necesario hacer del conocimiento del Consejo General, el nivel de avance de cada subproceso que integra los Calendarios de Coordinación.

El porcentaje de avance que se registra en cada subproceso está en función al número de actividades que lo integra y el número de actividades concluidas.

Las consideraciones respecto a cada uno de los subprocesos, se resumen en los siguientes cuadros:

Mecanismos de coordinación	Avance
Este subproceso se compone de dos actividades para cada uno de los 30 OPL. En todos los calendarios se ha ejecutado, en tiempo y forma, la celebración del convenio de coordinación INE-OPL. Se encuentra pendiente de ejecución, dentro del plazo establecido, la elaboración e implementación de un plan de trabajo para la promoción de la participación ciudadana; esta actividad está a cargo de los OPL conjuntamente con el INE.	50%
	Hasta el momento no se registra desfase en el cumplimiento de las actividades en su conjunto.

Integración y funcionamiento de órganos desconcentrados	Avance
Este subproceso está conformado por un total de 285 actividades, repartidas de forma desigual entre las 30 entidades, ya que las actividades de los OPL varían en función del tipo y número de órganos desconcentrados que deben instalar para el desarrollo y vigilancia del respectivo proceso electoral. Respecto al INE, tenemos que a la fecha los 32 Consejos Locales se instalaron en el plazo establecido; como consecuencia de esta instalación, los Consejos Locales, en el presente mes, designaron a los consejeros electorales que integrarán los 300 Consejos Distritales. En relación con los OPL, Tlaxcala no ha emitido la convocatoria correspondiente para la integración de sus órganos desconcentrados, sin embargo, tiene como plazo para hacerlo, todo el mes de diciembre. De los 29 OPL restantes, Colima y Ciudad de México ratificaron la integración del proceso electoral pasado, y éste último emitió una convocatoria para designar las vacantes generadas. Los OPL en las entidades de Guerrero y Michoacán y San Luis Potosí, han emitido 2 y 3 convocatorias, respectivamente, ya que no reunieron el número de aspirantes necesarios para integrar sus respectivos órganos.	60.16%

Integración y funcionamiento de órganos desconcentrados	Avance
<p>EL OPL en el estado de Tamaulipas, modificó los plazos de la convocatoria aprobada, ya que el Tribunal Electoral del Estado, le ordenó su modificación, para que se tomara en cuenta, al momento de la designación, la paridad de género.</p> <p>En los calendarios correspondientes a las entidades de Guerrero, Sonora y Yucatán, no se incluye la actividad correspondiente a la emisión de convocatoria, ya que estos OPL, la emitieron antes de la aprobación de los calendarios.</p> <p>Conforme a los plazos determinados en sus respectivas convocatorias, los OPL de Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Yucatán han designado a los consejeros integrantes de sus respectivos consejos municipales y/o distritales y de estos, los correspondientes a Campeche, Colima, Durango, Guanajuato y Estado de México, se encuentran debidamente instalados.</p>	<p>No se encuentra desfase en el cumplimiento de las actividades.</p>

Lista Nominal de Electores	Avance
<p>Este subproceso se compone por un total de 194 actividades; 180 se reparten igualmente entre las 30 entidades (6 por cada una de ellas) y 14 corresponden a las 7 entidades (2 por cada una de ellas) que tendrán participación de los mexicanos residentes en el extranjero.</p> <p>4 actividades son responsabilidad del INE y 2 responsabilidad conjunta INE/OPL, para las actividades relacionadas con el voto de los mexicanos residentes en el extranjero 1 actividad es responsabilidad del INE y 1 responsabilidad conjunta del INE/OPL.</p> <p>Será en el mes de enero, cuando este subproceso de inicio con su primera actividad, por lo que al momento no se señala su nivel de avance.</p>	<p>0.00%</p> <p>Sin actividades iniciadas.</p>

Observadores electorales	Avance
<p>Este subproceso se compone por 210 actividades, le corresponden el mismo número de actividades a cada entidad (7).</p> <p>2 actividades son responsabilidad del INE, 1 es responsabilidad del OPL y 4 son responsabilidad conjunta del INE/OPL.</p> <p>Los OPL en las entidades de Chihuahua, Hidalgo, Quintana Roo y Tlaxcala aún no aprueban la convocatoria dirigida a los ciudadanos interesados en participar como observadores electorales debido a que en estas entidades aún no ha dado inicio al proceso electoral.</p> <p>Los 30 OPL enviaron la propuesta de materiales de capacitación a sus respectivas Junta Locales Ejecutivas a efecto de que se realizara la revisión correspondiente. Dado lo anterior, se llevó a cabo la corrección y validación del material de capacitación presentado por los 30 OPL.</p> <p>Los OPL de las entidades de Ciudad de México, Nuevo León, Yucatán y Veracruz informaron que están a la espera de que sus respectivos proveedores entregue el Manual de Observadores Electorales de manera impresa para estar en posibilidad de realizar el intercambio de materiales de capacitación para observación electoral entre el OPL y el INE.</p> <p>El OPL del estado de Quintana Roo solicitó una prórroga de hasta un mes para estar en condiciones de enviar a impresión el material de capacitación para observación electoral, esto derivado de la modificación del plazo para el inicio del proceso electoral de esta entidad. Aun no se ha dado respuesta a esta solicitud por parte de la DECEyEC.</p>	<p>53.33%</p> <p>Hasta el momento no se registra desfase en el cumplimiento de las actividades en conjunto.</p>

Observadores electorales	Avance
Los 25 OPL restantes ya realizaron el intercambio de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE. Hasta el momento los OPL de las 30 entidades se encuentran dentro del plazo para recibir las solicitudes, impartir los cursos de capacitación y, en su caso, acreditar a los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales.	

Ubicación de casillas	Avance
Este subproceso se compone de 11 actividades para cada uno de los 30 OPL (330) que contemplan los recorridos por los distritos, la examinación, la aprobación, el registro de representantes y la publicación de las ubicaciones para las casillas electorales. De las 11 actividades, 9 corresponden al INE y las 2 INE/OPL. Sin embargo, la primera actividad inicia el 15 de febrero de 2018, por lo que hasta el momento no se presenta ningún avance.	0.00%
	Sin actividades iniciadas.

Integración de las mesas directivas de casillas	Avance
Este subproceso se compone de 10 actividades para cada entidad federativa cuyo cumplimiento corresponde en su totalidad al INE. De lo anterior se desprende, la estrategia de capacitación, los sorteos, dos insaculaciones, integración de las listas y entrega de reconocimientos. Solo la primera actividad se ha realizado hasta el momento, por lo que se tiene un avance de 10%.	10.00%
	No se encuentra desfase en el cumplimiento de las actividades.

Fiscalización de los recursos de los partidos políticos	Avance
Este subproceso se compone por un total de 213 actividades, repartidas de forma desigual entre las 30 entidades, ya que las actividades de los OPL varían en relación con el número de cargos a elegir. 46 actividades se han cumplido dentro del plazo, 2 se cumplieron fuera del plazo y 4 se encuentran en proceso de ejecución dentro del plazo. Al 30 de octubre, los OPL de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas ya aprobaron los topes de gasto de precampaña. Ciudad de México se encuentra en proceso de aprobación dentro del plazo, y Colima, Sinaloa y Tlaxcala lo harán en diciembre. Las actividades correspondientes a la realización de las precampañas inician a partir del mes de diciembre y finalizan, en apego a la resolución INE/CG386/2017, el 11 de febrero de 2018. La aprobación de topes de gasto de campaña está programada en la mayoría de los OPL para el año 2018. Sin embargo al 30 de octubre de 2017, Coahuila, Estado de México, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco y Zacatecas ya cumplieron la actividad dentro del plazo. El OPL de Michoacán cumplió fuera del plazo. Y Jalisco se encuentra en proceso de aprobación dentro del plazo. Será en el mes de marzo de 2018, cuando las actividades correspondientes a la realización de campañas den inicio, por lo que al momento no se puede medir su nivel de avance.	22.54%
	No se encuentra desfase en el cumplimiento de las actividades.

Candidaturas	Avance
<p>Este subproceso se compone por 606 actividades, repartidas de forma desigual entre las 30 entidades, ya que las actividades de los OPL varían en relación con el número de cargos a elegir.</p> <p>Al 30 de octubre, 34 actividades se han cumplido dentro del plazo, 3 se cumplieron fuera del plazo y 173 se encuentran en proceso de ejecución dentro del plazo.</p> <p>Las actividades de solicitud de registro de candidatos y su respectiva resolución comienzan en el año 2018, por lo cual no se presenta al momento ningún avance.</p> <p>36 actividades corresponden al registro de plataformas electorales. Los OPL de Coahuila, Nuevo León, Querétaro y Tamaulipas se encuentran en proceso de ejecución dentro del plazo; el OPL de Oaxaca informó que recibió en tiempo y forma las plataformas electorales de todos los partidos políticos. El resto de los órganos electorales inicia esta actividad en 2018.</p> <p>De las actividades relacionadas a candidaturas independientes, 56 corresponden a la recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos interesados. Las 30 entidades ya dieron inicio, de los cuales el OPL de Ciudad de México cumplió dentro del plazo el correspondiente a Jefe de Gobierno, de la misma forma Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí y Yucatán cumplieron dentro del plazo. Los OPL de Baja California Sur, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas se encuentran en proceso de ejecución dentro del plazo.</p> <p>La resolución sobre la procedencia de manifestación de intención está cumplida dentro del plazo en el caso de Jefe de Gobierno en Ciudad de México, así como en los OPL de Jalisco y Querétaro. Mientras que, al 30 de octubre, el OPL de Yucatán se encuentra en proceso de ejecución dentro del plazo. El resto de los órganos electorales aún no inician esta actividad.</p> <p>Respecto del plazo para recabar apoyo ciudadano el único OPL que ha iniciado es el de la Ciudad de México para el cargo de Jefe de Gobierno, los OPL de Baja California Sur, Coahuila, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas comienzan en el mes de diciembre y el resto de los órganos electorales inician en 2018. Derivado de la resolución INE/CG386/2017 la fecha máxima de término de los periodos para recabar apoyo ciudadano es el 6 de febrero de 2018.</p>	<p>5.94%</p> <p>No se encuentra desfase en el cumplimiento de las actividades.</p>

Documentación y material electoral	Avance
<p>Este subproceso está compuesto por 481 actividades, las cuales están distribuidas en 16 actividades para cada OPL, excepto para el de Campeche, el cual tiene 17, toda vez que la actividad <i>Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del Organismo Público Local</i> está desglosada para los consejos distritales y municipales, respectivamente. 180 actividades corresponden al INE y 301 a los OPL.</p> <p>Del total de actividades, han iniciado 209; de estas 34 fueron cumplidas dentro del plazo, 20 cumplidas fuera del plazo, 78 se encuentran en proceso de ejecución y 77 en proceso de ejecución fuera del plazo; cabe señalar que 272 actividades no han iniciado su proceso de ejecución.</p> <p>A continuación se hace una breve descripción de la situación en la que se encuentran las actividades que han iniciado y en su caso concluido, conforme al plazo establecido en el Calendario de Coordinación con los OPL:</p> <p>La actividad <i>Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, tanto para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero como para</i></p>	<p>10.81%</p> <p>Hay desfase en 3 actividades, para la revisión y validación del material y la documentación electoral, que ha re calendarizado la comisión unidad de capacitación y organización electoral; puede representar un problema, en la</p>

Documentación y material electoral	Avance
<p>la votación en territorio nacional, en medios impresos y electrónicos, se encuentra cumplida al 100 por ciento; cabe señalar que 23 entidades cumplieron dentro del plazo y 7 fuera de este.</p> <p>En cuanto a la actividad <i>Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL</i>, tiene un 37% de cumplimiento toda vez que hasta el momento la Dirección de Organización Electoral ha revisado y entregado observaciones a 11 entidades. Cabe señalar que el plazo establecido para su ejecución era del 20 al 25 de septiembre de 2017 situación por la que no aparecerán con el estatus "Cumplimiento dentro del plazo establecido"; sin embargo, la DEOE modificó los plazos en que debía realizarse esta actividad, estableciendo dos grupos para una primera y segunda revisión; los periodos abarcan del 25 de octubre al 9 de diciembre de 2017. Por lo anterior, 11 órganos electorales ya cumplieron con la actividad y 19 continúan en proceso de ejecución.</p> <p>La actividad <i>En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral</i>, presenta el cumplimiento de dos OPL, por lo que tiene un avance del siete por ciento. Cabe señalar que dicha actividad depende de las modificaciones de los plazos para su revisión señalados en la actividad anterior, por lo que una vez que el área competente envíe las observaciones correspondientes a los OPL, éstas estarán en condiciones de atender los cambios señalados.</p> <p>Respecto de la actividad <i>Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas</i>, hasta el momento no han sido validados los documentos y materiales de ningún órgano electoral.</p> <p>En cuanto a la <i>Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de la documentación y material electoral</i>, ningún órgano electoral ha sesionado para llevar a cabo su validación ya que el periodo establecido para su ejecución va del 6 de octubre al 31 de diciembre de 2017.</p> <p>Sobre la <i>Entrega del primer informe detallado del OPL a la DEOE, a través de la UTVOPL, que dé cuenta de las acciones realizadas para el diseño de la documentación y materiales electorales y la elaboración de las especificaciones técnicas, en medios impresos y electrónicos</i>, se tiene el cumplimiento de 11 de las 15 entidades que debían entregarlo el 24 de noviembre de 2017, conforme a lo estableció por la DEOE a través del oficio INE/DEOE/1163/2017 de fecha 14 de noviembre de 2017; los OPL de los estados de Guanajuato, Hidalgo, Jalisco y Morelos presentan incumplimiento de entrega.</p> <p>Cabe señalar que el 1 de diciembre del año en curso, se llevará a cabo una segunda entrega establecida para los órganos electorales de: Baja California Sur, Campeche, Colima, Chihuahua, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco y Zacatecas.</p> <p>La actividad <i>Revisión del primer informe, emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación</i>, no presenta avance alguno toda vez que el área correspondiente no ha enviado observaciones al informe mencionado, pues el plazo establecido para su ejecución es del 4 de noviembre de 2017 al 4 de enero de 2018; por lo que hasta el momento no existe validación de algún Primer Informe.</p> <p>Las actividades que a continuación se enumeran, no han iniciado su proceso de ejecución:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Supervisiones de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral a los OPL respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales • Entrega por parte del OPL, del segundo informe detallado que dé cuenta de las acciones realizadas para la aprobación y adjudicación de los documentos 	<p>aprobación del material y documentación electoral, si la DEOE no realiza la validación en tiempo.</p>

Documentación y material electoral	Avance
<p>y materiales electorales y, en su caso, los avances en su producción y el seguimiento que ha dado a dicha producción, en medios impresos y electrónicos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, del segundo informe y emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación • Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla • Aprobación de SE y CAE, así como de personas prestadoras de servicios o personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas • Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del Organismo Público Local • Conteo, sellado y agrupamiento de boletas • Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de Mesa Directiva de Casilla • Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL 	

Bodegas electorales	Avance
<p>El subproceso se conforma de 120 actividades bajo la adscripción del OPL; de las cuales corresponden cuatro a cada uno de los 30 Organismos Públicos Locales que tendrán Proceso Electoral 2017-2018. Hasta el momento, no ha iniciado ninguna de éstas.</p>	00.00%
	Sin actividades iniciadas.

Voto de los ciudadanos residentes en el extranjero	Avance
<p>Las entidades de Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla y Yucatán, con elección de gobernador son quienes implementarán el Voto de los Ciudadanos Residentes en el Extranjero. Este subproceso se integra por un total de 9 actividades para cada una de las entidades mencionadas, a la fecha han dado inicio 2 actividades que por su naturaleza son inherentes a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE), mismas que se citan a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Envío-recepción de la Solicitud individual de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el extranjero para procesos electorales locales (SIILNERE), y de la Solicitud Individual para Votar desde el Extranjero (SIVE), la cual dio inicio el 09 de septiembre de 2017 y concluye el 31 de marzo de 2018. Con fecha de corte al 06 de noviembre de 2017, se habían recibido un total de 3,316 solicitudes; 1,653 SIVE y 1,663 SIILNERE. • Fecha límite de envío de subsane de inconsistencias de las Solicitudes por parte los ciudadanos, la cual dio inicio el 10 de septiembre de 2017 y concluye el 03 de abril de 2018. 	2.22%
	Hasta el momento no se registra desfase en el cumplimiento de las actividades en su conjunto.

Jornada Electoral	Avance
<p>Este subproceso se encuentra integrado por 4 actividades, repartidas de forma igualitaria entre las 30 entidades, debido a que son las mismas actividades; 2 están a cargo de la Dirección de Organización Electoral del INE, 1 es responsabilidad tanto del INE como del OPL y 1 de entera responsabilidad del OPL. De las 4 actividades 2 se han iniciado y son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Aprobación de las metas del SIJE 2018, la cuales tenían fecha de inicio el 01 de julio de 2017 y su fecha de término 08 de septiembre de 2017. Para dar cumplimiento a esta actividad, el 28 de agosto de 2017, en sesión extraordinaria el Consejo General del INE aprobó el acuerdo INE/CG384/2017, mediante el cual se establecieron las metas del SIJE 2018, por tanto la actividad se cumplió en tiempo y forma. · Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2018, la cuales tenían fecha de inicio el 01 de julio de 2017 y su fecha de término 08 de septiembre de 2017. Para dar cumplimiento el 16 de octubre de 2017, la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, en la Cuarta Sesión Extraordinaria aprobó el Programa de Operación del SIJE, por tanto se cumplió fuera del plazo establecido. 	50.00%
	<p>No se encuentra desfase en el cumplimiento de las actividades.</p>

Mecanismos de recolección	Avance
<p>Este subproceso se compone de siete actividades para cada uno de los 30 OPL. Cabe señalar que a partir del 1 de diciembre de 2017 dará inicio en todos los calendarios la actividad referente a la “Elaboración por parte de las Juntas Distritales Ejecutivas de los estudios de factibilidad para las elecciones locales”. Asimismo, es importante mencionar que de las siete actividades que integran este subproceso, seis corresponden al INE y una a los OPL.</p>	0.00%
	<p>Sin actividades iniciadas.</p>

Cómputos	Avance
<p>Este subproceso tiene un total de 310 actividades, repartidas de forma desigual entre las 30 entidades, ya que estas actividades varían en relación con las que cada OPL contempló para el desarrollo del mismo.</p> <p>Los 30 órganos electorales con Proceso Electoral Concurrente con el Federal 2017-2018 dieron cumplimiento en tiempo y forma con la emisión de los lineamientos a través de los cuales se regule el desarrollo de las sesiones especiales de cómputo.</p> <p>Por otra parte, cabe resaltar que 27 OPL aprobaron en tiempo y forma los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos. Sin embargo es importante mencionar que el IEC y al IEPC Guerrero dieron cumplimiento a los mismos fuera del plazo establecido. Finalmente, por lo que hace al OPL de la Ciudad de México aún se encuentran en proceso de ejecución fuera del plazo establecido, toda vez que el citado órgano electoral realizó una consulta al Instituto Nacional Electoral referente a la posibilidad de realizar sus cómputos distritales al término de la jornada electoral, a la cual no se le ha dado respuesta alguna.</p>	19.03%
	<p>El desfase del OPL, no representa peligro, hasta el momento del presente informe, en el subproceso, pero será necesario que se cumpla a la brevedad.</p>

De las actividades de partidos políticos

Al momento del corte del presente informe, los OPL han dado cumplimiento a los diversos requerimientos sobre las actividades y plazos que deben homologar respecto a las actividades que los partidos políticos deben ejecutar, en torno a las precampañas y campañas electorales.

Sin embargo, se debe tomar en consideración lo siguiente:

Aguascalientes

A través del oficio INE/UTVOPL/5253/2017 de fecha 6 de octubre del año en curso, se le solicitó al OPL informar los plazos en que los partidos políticos deberían realizar los procesos internos para la selección de candidatos, solicitud que fue atendida con el oficio IEE/P/2287/2017 de fecha 10 de octubre del mismo año, en él informó que el plazo sería del 13 de enero al 11 de febrero de 2018; sin embargo, el 23 de octubre de 2017 envió un oficio más en el que aclaró que por un error involuntario informaron un plazo que solo corresponde a la etapa de precampañas actividad que tiene verificativo dentro de dicho proceso. Derivado de lo anterior, el OPL informó que el plazo se podría considerar desde el inicio del proceso electoral local hasta el último día de las precampañas.

Baja California Sur

Mediante oficios INE/UTVOPL/5271/2017 y INE/UTVOPL/5932/2017 esta Unidad Técnica, ha requerido al Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur para que determine los plazos en que habrán de llevarse a cabo los procesos de selección interna de los partidos políticos, a los cuales el OPL respondió que solicitaría a los institutos políticos que informaran el plazo en el cual llevarían a cabo dicha actividad.

Nuevo León

Mediante el oficio número INE/UTVOPL/5529/2017 de fecha 17 de octubre de 2017 la UTVOPL solicitó al OPL manifestarse sobre el plazo para presentar la solicitud de coalición por parte de los partidos políticos. En respuesta a esta solicitud, mediante el oficio número SECEE/0420/2017 del 20 de octubre de 2017, el OPL informó que con base en la legislación aplicable dicho periodo se realizará hasta el día 2 de enero de 2018, periodo que se plasmó y fue aprobado en el calendario del Proceso Electoral Local. Al respecto y dado que la fecha indicada por el OPL no cumple con lo que se establece en la ley, toda vez que la precampaña en dicho estado dará inicio el día 3 de enero de 2018, esta inconsistencia ya fue notificada al OPL de Nuevo León. En su

respuesta, el OPL manifestó que hará el ajuste correspondiente mediante la publicación de una fe de erratas en el Diario Oficial del estado.

Puebla

En seguimiento de las actividades del calendario de coordinación correspondientes a los partidos políticos, a través del oficio INE/UTVOPL/5231/2017 del 06 de octubre de 2017 se le solicitó al Instituto Electoral de Puebla información sobre el plazo en el que los partidos políticos determinarán el procedimiento aplicable para la elección de sus candidatos. En atención a dicho requerimiento el OPL respondió mediante el oficio IEE-PRE-1621/17 del 09 de octubre que la legislación local únicamente establece el plazo para los procesos internos de los institutos políticos que conlleven una precampaña. Más adelante, el 27 octubre, a través del oficio INE/UTVOPL/5817/2017, se conminó al OPL a pronunciarse sobre el plazo para la realización de esta actividad. Sin embargo, el OPL respondió mediante oficio IEE/PRE-1801/17 el 3 de noviembre, la misma referencia a la legislación local, que no contempla plazos al respecto, quedando sin determinación. No se omite mencionar que el plazo para que los partidos políticos comuniquen al OPL sobre su método de selección interna, inició el 29 de octubre de 2017 y terminará el 10 de febrero de 2018.

Proceso Electoral Local Extraordinario

San Blas, Nayarit

El pasado 4 de junio de 2017, en el estado de Nayarit, se desarrolló la Jornada Electoral, en la que se eligieron los cargos de Gobernador, Diputados, Ayuntamientos y Regidurías. Derivado de lo anterior, en la Primera Demarcación del municipio de San Blas, se obtuvo como resultado entre el primer y segundo lugar un empate con 546 votos, por parte del Partido Verde Ecologista de México y la Coalición “*Juntos por Tl*” integrada por los Partidos Políticos Nacionales Acción Nacional, de la Revolución Democrática, de Trabajo y el Partido Político Local denominado de la Revolución Socialista.

Ante esta situación y dado el empate declarado por el Consejo Municipal del OPL en San Blas, el Tribunal Electoral del estado, al resolver los medios de impugnación interpuestos, determinó que era necesario efectuar un proceso electoral extraordinario, por lo que declaró la nulidad de la elección.


El Consejo General, en sesión extraordinaria celebrada el 20 de octubre de 2017, emitió el acuerdo número INE/CG473/2017, por medio del cual aprobó el Plan Integral y Calendario de Coordinación del Proceso Electoral Local Extraordinario 2017, para la Primera Demarcación del municipio de San Blas, Nayarit, con un total de 48 actividades.

La convocatoria aprobada para el desarrollo del proceso electoral extraordinario, fijó como fecha de la jornada electoral el domingo 3 de diciembre del presente año.

Avance en el cumplimiento


Estas actividades, se empezaron a desarrollar a partir del 2 de octubre de 2017, momento en el cual se instaló el Consejo Estatal del OPL, para iniciar el desarrollo del mencionado proceso extraordinario, mismo que al momento lleva un avance del 88%, conforme a la gráfica que se inserta a continuación:

CUMPLIMIENTO ELECCIÓN DE SAN BLAS

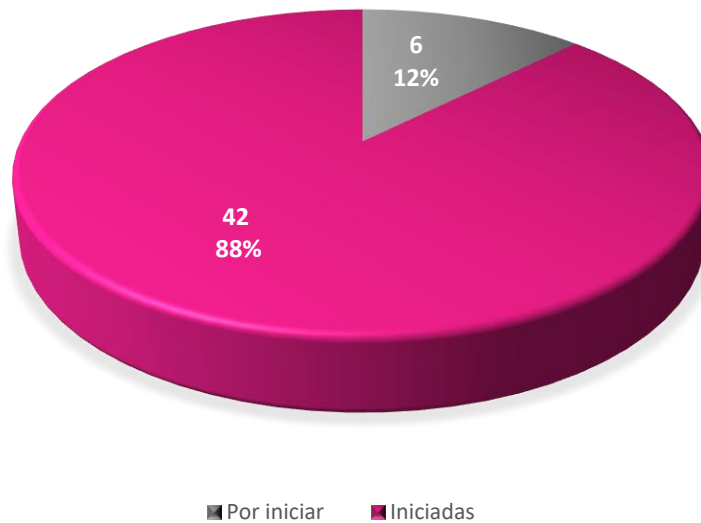

El nivel de cumplimiento de las actividades calendarizadas, se visualiza en la siguiente gráfica:

ACTIVIDADES INICIADAS

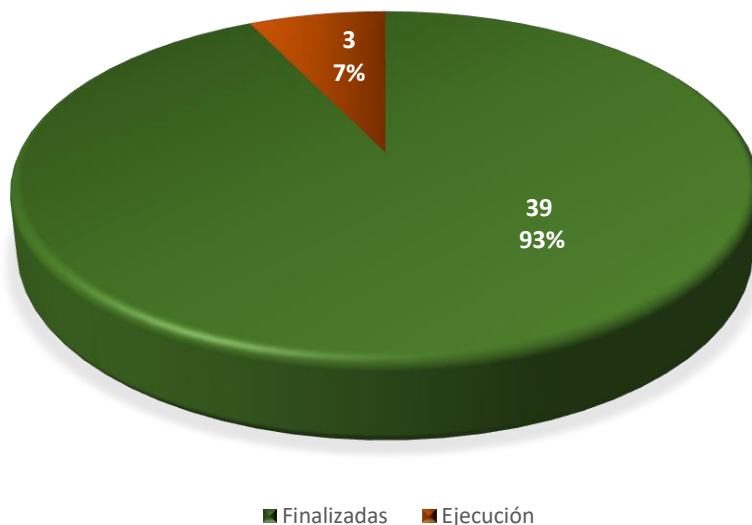

Por lo que hace a las actividades cumplidas fuera de los plazos establecidos, son las siguientes:

Actividad	Inicio	Término	Término Real
Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas y extraordinarias	16/10/2017	17/10/2017	25/10/2017
Aprobación del número y ubicación de casillas	18/10/2017	18/10/2017	31/10/2017
Primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral	19/10/2017	19/10/2017	01/11/2017
Remisión del listado de ubicación de casillas al OPL	20/10/2017	20/10/2017	31/10/2017
La Junta Distrital Ejecutiva presentará al Consejo Distrital del INE el listado de lugares propuestos para ubicar casillas	18/10/2017	18/10/2017	31/10/2017
Producción de la documentación y materiales electorales	17/11/2017	17/11/2017	19/11/2017

Actividad	Inicio	Término	Término Real
Recepción de los documentos y materiales electorales en los órganos electorales del OPL	23/11/2017	23/11/2017	24/11/2017
Conteo, sellado y agrupamiento de boletas	23/11/2017	24/11/2017	25/11/2017
