
Informe del seguimiento al Plan Integral y Calendarios de Coordinación de los Procesos Electorales Locales Ordinarios 2017-2018, así como del Proceso Electoral Local Extraordinario derivado del proceso electoral local 2016-2017 en los municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán en el estado de Veracruz.

Contenido

I. Glosario.	3
II. Introducción.	3
III. Procesos Electorales Locales Ordinarios 2017-2018.	6
1. Modificaciones a los Calendarios de Coordinación.	8
2. Avance del cumplimiento.	9
3. Actividades concluidas fuera del plazo establecido.	13
4. Actividades en proceso de ejecución.	13
6. Avance del cumplimiento de actividades por subprocesos.	17
IV. Proceso Electoral Local Extraordinario.	41
ANEXO 1. Modificaciones a los calendarios electorales.	45
ANEXO 2. Actividades concluidas fuera de plazo.	59

I. Glosario.

Comisión:	Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales
Consejo General:	Consejo General del Instituto Nacional Electoral
DEOE:	Dirección Ejecutiva de Organización Electoral
INE:	Instituto Nacional Electoral
LGIFE:	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
OPL:	Organismos Públicos Locales
SIJE:	Sistema de Información de la Jornada Electoral
UTVOPL:	Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales

II. Introducción.

El 8 de septiembre de 2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) emitió el acuerdo número INE/CG430/2017, a través del cual aprobó el Plan Integral y Calendarios de Coordinación de los Procesos Electorales Locales concurrentes con el Federal 2017-2018, por el cual se mandata a la Comisión llevar a cabo el seguimiento del grado de avance de cada uno de los procedimientos y actividades identificadas cronológicamente.

El seguimiento de los calendarios, se estructuró de la siguiente forma:

1. Consecutivo,
2. Subproceso,
3. Actividad,
4. Adscripción y órgano responsable, y
5. Periodo de ejecución.

Los subprocesos, que definen la integración del calendario, se componen por diversas actividades con un periodo de ejecución específico y por la adscripción del órgano responsable de realizarla, así como por la etapa de cumplimiento dentro del cuerpo de actividades.

Las actividades de coordinación interinstitucional se encuentran agrupadas en los siguientes subprocesos:

1. Mecanismos de coordinación
2. Integración y funcionamiento de órganos desconcentrados
3. Lista Nominal de Electores
4. Observadores electorales
5. Ubicación de casillas
6. Integración de las Mesas Directivas de Casilla
7. Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos
8. Candidaturas
9. Documentación y material electoral
10. Bodegas electorales
11. Voto de los ciudadanos residentes en el extranjero
12. Jornada Electoral
13. Mecanismos de recolección y
14. Cómputos

Es importante señalar que el número de subprocesos no es el mismo para las 30 entidades, ya que solo nueve tendrán elección para renovar al titular del poder ejecutivo local y de ellas, siete entidades contemplan el ejercicio del voto de sus ciudadanos residentes en el extranjero. En razón de ello, en siete entidades se dará seguimiento a 14 subprocesos y, en los 23 restantes, a 13.

Entidades con elección para Gobernador que contemplan el ejercicio del voto de sus ciudadanos residentes en el extranjero

Chiapas

Guanajuato

Morelos

Yucatán

Ciudad de México

Jalisco

Puebla

De la misma forma, el número de actividades que integra cada subproceso, en los que tienen actividades directas de realización y determinación los OPL, es diferente en cada entidad debido a la variación de los cargos de elección.

Los subprocesos que a la fecha han iniciado son:

- Bodegas electorales.
- Mecanismos de coordinación.
- Integración y funcionamiento de órganos desconcentrados.
- Observadores electorales.
- Integración de las Mesas Directivas de Casilla.
- Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos.
- Candidaturas.
- Documentación y material electoral.
- Voto de los ciudadanos residentes en el extranjero.
- Jornada Electoral.
- Lista Nominal de Electores.
- Mecanismos de Recolección.
- Cómputos.

La división de los calendarios bajo este esquema permite realizar cruces de actividades y plazos de cumplimiento para determinar no solo el número de actividades iniciadas y terminadas en los plazos establecidos, sino que también posibilita determinar en forma cualitativa el detalle del cumplimiento.

De la misma forma, se da cuenta sobre el seguimiento del Plan Integral y Calendario de Coordinación para el proceso electoral extraordinario en los Municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para el cargo de Presidente Municipal.

III. Procesos Electorales Locales Ordinarios 2017-2018.

El Consejo General del INE, el 28 de agosto de 2017, aprobó la resolución INE/CG386/2017, en ejercicio de la facultad de atracción, mediante la cual señala que para los procesos electorales federal y local, se deben considerar las siguientes fechas:

- Para precampañas la fecha de término será el 11 de febrero de 2018;
- La fecha máxima de periodos para recabar el apoyo ciudadano de las y los aspirantes a candidatos independientes, será el 6 de febrero de 2018, con excepción de la Ciudad de México para el cargo de Jefe de Gobierno, que como consecuencia del sismo del mes de septiembre el plazo se amplió hasta el 12 de febrero de 2018;
- Las fechas límite, para aprobación del registro de candidaturas donde la duración de las campañas sea mayor a sesenta días será el 29 de marzo de 2018 para las candidaturas a gubernatura, así como todos aquellos cargos de los procesos electorales locales en donde la duración de las campañas sea mayor a 60 días, y el 20 de abril de 2018 para los cargos restantes.

Derivado de la resolución mencionada en el párrafo anterior, en función de las fechas señaladas, los OPL ajustaron los plazos en los calendarios correspondientes.

Al 9 de febrero de 2018, las 30 entidades han dado inicio formal a sus procesos electorales conforme a la siguiente tabla:

Entidad	Fecha
Aguascalientes	06/10/2017
Baja California Sur	01/12/2017
Campeche	21/09/2017
Coahuila	01/11/2017


Entidad	Fecha
Colima	12/10/2017
Chiapas	07/10/2017
Chihuahua	01/12/2017
Ciudad de México	06/10/2017
Durango	01/11/2017
Guanajuato	08/09/2017
Guerrero	08/09/2017
Hidalgo	15/12/2017
Jalisco	01/09/2017
Estado de México	06/09/2017
Michoacán	08/09/2017
Morelos	08/09/2017
Nuevo León	06/11/2017
Oaxaca	06/09/2017
Puebla	03/11/2017
Querétaro	01/09/2017
Quintana Roo	20/12/2017
San Luis Potosí	01/09/2017
Sinaloa	27/09/2017
Sonora	08/09/2017
Tabasco	01/10/2017
Tlaxcala	01/01/2018

Entidad	Fecha
Tamaulipas	10/09/2017
Veracruz	01/11/2017
Yucatán	06/09/2017
Zacatecas	07/09/2017

1. Modificaciones a los Calendarios de Coordinación.

Desde el inicio al seguimiento de los calendarios, a la fecha de corte del presente informe, 9 de febrero de 2018, se tienen registradas 118 modificaciones, en virtud de que los OPL han informado al Instituto, la determinación de plazos y actividades relativas a la homologación de plazos, así como la determinación de algunos que aún no se habían definido. Once de las modificaciones se refieren a ajustes de plazo sobre la integración y/o instalación de los órganos desconcentrados de los OPL, mientras que el resto se refiere a las actividades de partidos políticos, candidaturas independientes y candidatura común (plazos de procedimientos de registro, manifestaciones de intención, plazo para recabar apoyo ciudadano de aspirantes a candidaturas independientes, solicitud de registro de convenio de candidatura común, entre otros).

Cantidad de modificaciones a calendarios OPL por entidad

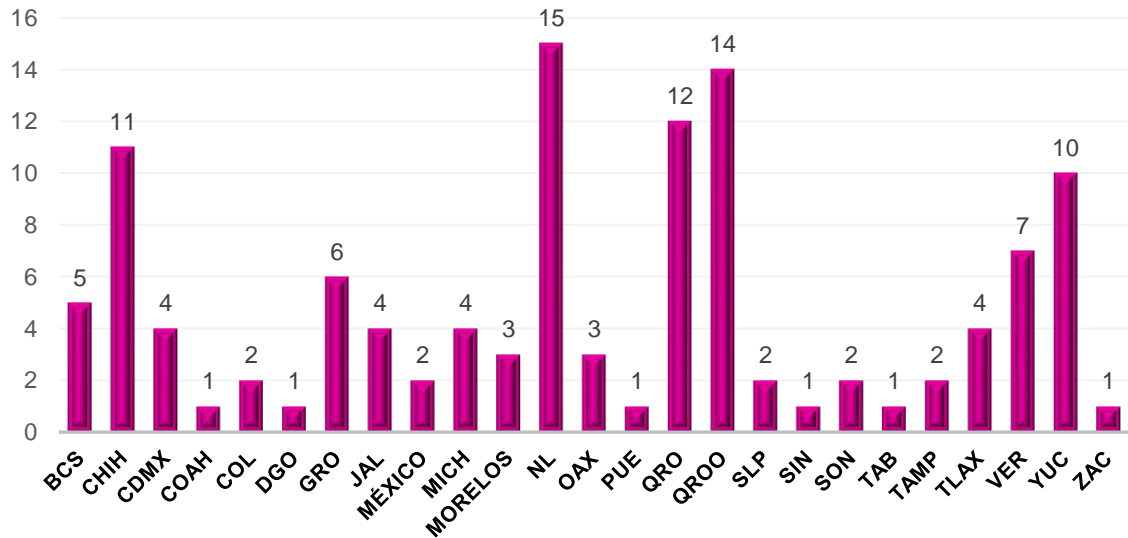

Ver detalles por entidad en **Anexo 1**.

Todo lo anterior, atendiendo lo que establece el artículo 73 del Reglamento de Elecciones, así como al punto resolutivo Tercero del acuerdo del Consejo General número INE/CG430/2017.

2. Avance del cumplimiento.

En las 30 entidades con procesos electorales locales ordinarios concurrentes con el federal 2017-2018, han iniciado 1,590 actividades, conforme a lo que se muestra en la siguiente tabla:


Organismo Público Local	Número de actividades programadas	Número de actividades iniciadas	Número de actividades concluidas
Aguascalientes	100	45	36
Baja California Sur	105	48	34
Campeche	126	63	50

Organismo Público Local	Número de actividades programadas	Número de actividades iniciadas		Número de actividades concluidas	
Coahuila	97	44	45.4%	35	36.1%
Colima	109	48	44.0%	38	34.9%
Chiapas	137	62	45.3%	42	30.7%
Chihuahua	113	54	47.8%	42	37.2%
Ciudad de México	136	61	44.9%	44	32.4%
Durango	101	45	44.6%	34	33.7%
Guanajuato	140	66	47.7%	50	35.7%
Guerrero	116	57	49.1%	45	38.8%
Hidalgo	99	42	42.4%	31	31.3%
Jalisco	129	60	46.5%	45	34.9%
Estado de México	112	53	47.3%	42	37.5%
Michoacán	115	56	48.7%	45	39.1%
Morelos	134	61	45.5%	47	35.1%
Nuevo León	112	53	47.3%	42	37.5%
Oaxaca	110	52	47.3%	41	37.3%
Puebla	136	58	42.6%	40	29.4%
Querétaro	117	55	47.0%	43	36.8%
Quintana Roo	99	45	45.5%	34	34.3%
San Luis Potosí	115	54	47.0%	44	38.3%
Sinaloa	105	47	44.8%	37	35.2%
Sonora	114	56	49.1%	40	35.1%
Tabasco	127	55	43.3%	44	34.6%
Tamaulipas	102	47	46.1%	37	36.3%

Organismo Público Local	Número de actividades programadas	Número de actividades iniciadas	Número de actividades concluidas
Tlaxcala	99	42	30
Veracruz	108	48	38
Yucatán	137	57	43
Zacatecas	116	56	46
Totales	3,466	1,590	1,219

Las actividades iniciadas inciden en trece de los catorce subprocesos de los calendarios de coordinación, y representan 45.9% de avance del total de los calendarios de las 30 entidades.

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES 2017-2018

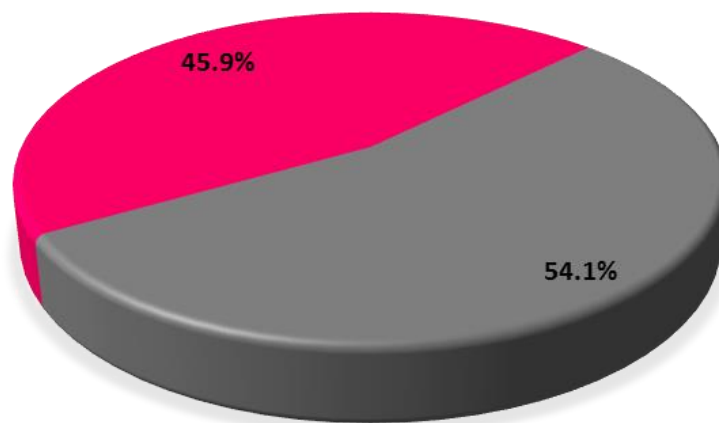

■ Iniciadas 1590

■ Sin Iniciar 1876

Detalle del cumplimiento de actividades.

El nivel de cumplimiento de las actividades, se encuentra diferenciado por el estatus de cada una de ellas, conforme a los parámetros establecidos en el Plan Integral, mismas que se encuentran clasificadas de la siguiente forma:


1. Por iniciar.
2. Cumplidas dentro del plazo.
3. Cumplidas fuera del plazo.
4. En proceso de ejecución dentro del plazo.
5. En proceso de ejecución fuera del plazo.

Es así que a la fecha hay un total de 1, 590 actividades iniciadas, de las cuales 1,219 han finalizado y 371 se encuentran en ejecución, como se muestra en los siguientes apartados.

3. Actividades concluidas fuera del plazo establecido.

De las 1,219 actividades que han finalizado, 1,020 (83.68%) fueron ejecutadas dentro de los plazos calendarizados y 199 (16.32%) fuera de los mismos.

ACTIVIDADES CONCLUIDAS

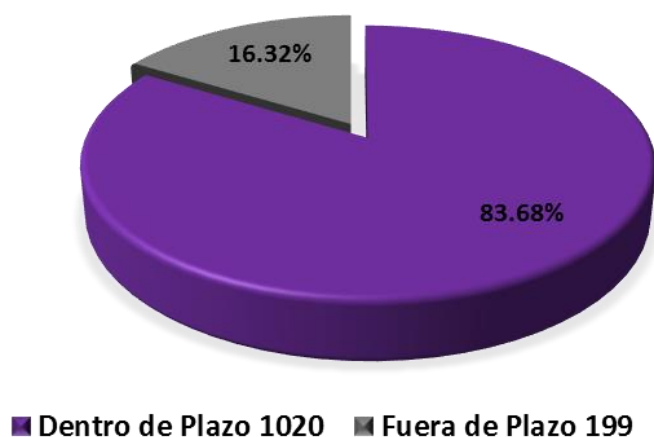


Los plazos en que se desarrollaron las 199 actividades referidas en el párrafo anterior, se detallan en el **Anexo 2**.

4. Actividades en proceso de ejecución.

De las 371 actividades que se encuentran en periodo de ejecución, 361 (97.30%) se encuentran en ejecución dentro de los plazos determinados y 10 (2.70%), se están ejecutando fuera del plazo de término establecido.

ACTIVIDADES EN PROCESO DE EJECUCIÓN

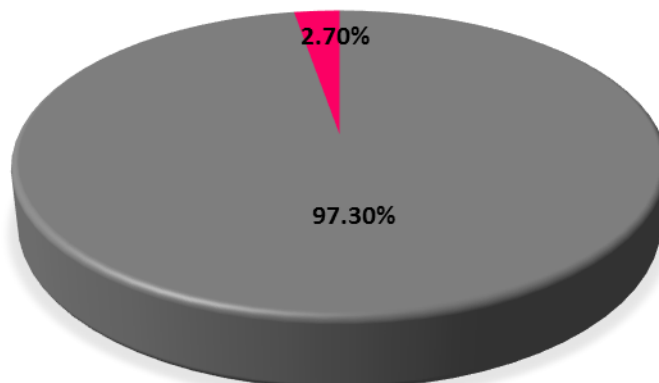

■ Ejecución dentro de plazo 361 ■ Ejecución fuera de plazo 10

5. Actividades en proceso de ejecución fuera de los plazos.

Respecto de las actividades de revisión de materiales electorales por parte de la DEOE, cabe mencionar que, con posterioridad a la aprobación del Plan Integral y Calendarios de Coordinación, la Comisión de Organización y Capacitación Electoral emitió el 5 de octubre del año en curso, el Acuerdo INE/CCOE001/2017 por el que aprobó el diseño de formatos únicos de la boleta y documentación, los materiales electorales y colores a utilizar por los OPL en el Proceso Electoral Local 2017-2018.

En consecuencia, se llevó a cabo un ajuste en los plazos correspondientes a la revisión y validación de la documentación y materiales electorales, mismos que han sido atendidos por los OPL.

A continuación, se detallan las 10 actividades que se encuentran en ejecución, fuera de los plazos establecidos, en los calendarios de coordinación, con corte al 9 de febrero de 2018.

- 1. Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas:**

Solamente está pendiente la validación de materiales o documentación electoral de Baja California Sur.

Baja California Sur: A través del oficio IEEBCS-PS-1880-2017 el OPL realizó una consulta respecto a la documentación relativa a la elección de Diputaciones en casillas especiales. La misma fue atendida mediante oficio INE/DEOE/ST/0004/2018 y Acuerdo INE/CCOE003/2018, en fecha 18 de enero de 2018. El OPL está atendiendo los ajustes correspondientes a su documentación electoral.

2. Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de la documentación y material electoral:

Falta la aprobación por parte de los Consejos Generales de los OPL de Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Hidalgo, Oaxaca, Querétaro, Sonora y Yucatán.

Baja California Sur: Se encuentra pendiente la aprobación por parte de su Consejo General toda vez que con motivo de la presentación de Consulta, misma que ya fue atendida, se encuentran realizando los ajustes correspondientes a la documentación electoral.

Campeche: En fecha 6 de febrero, mediante oficio INE/DEOE/0152/2018 la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del Instituto, validó el diseño de la documentación electoral y las especificaciones técnicas. Se encuentra pendiente fecha de sesión del Consejo General del OPL para la aprobación de documentación y materiales electorales.

Ciudad de México: DEOE ha validado la documentación electoral y los materiales electorales, sin embargo queda pendiente la aprobación por parte del Consejo General de la parte correspondiente a la documentación electoral con motivo de la Solicitud presentada por el OPL relativo a la instalación de una antena RFID en las sedes de las Juntas Distritales Ejecutivas del INE. En fecha 2 de febrero se llevó a cabo una reunión para tratar el tema.

Hidalgo: La DEOE emitió la validación a la documentación electoral y materiales electorales mediante oficios INE/DEOE/1486/2018 e

INE/DEOE/1517/2018, respectivamente. Con el diverso IEE/PRESIDENCIA/020/2018, el OPL solicitó a la DEOE a través de la UTV, el análisis y validación de la modificación de los textos en la Constancia de clausura y remisión del paquete electoral al Consejo Distrital. En fecha 24 de enero de 2018, la DEOE emitió respuesta mediante oficio INE/DEOE/0095/2018, por lo que la aprobación del Consejo del OPL se llevará a cabo en su oportunidad. El pasado 6 de febrero sesionó el Consejo General del OPL, sin embargo no agendó la aprobación de la documentación y materiales electorales. Se encuentra pendiente la fecha de aprobación.

Oaxaca: En fecha 29 de enero, se aprobó el proyecto de acuerdo de la documentación y materiales electorales en la comisión correspondiente. Se tiene previsto la aprobación del Acuerdo de documentación y materiales electorales en la próxima sesión del Consejo General del OPL.

Querétaro: Una vez resuelta la consulta realizada por el OPL mediante oficio INE/DEOE/ST/0002/2018 el 18 de enero, la DEOE concluyó la validación de la documentación y materiales electorales, quedando pendiente la aprobación por parte del Consejo General del OPL.

Sonora: En fecha 28 de enero mediante Acuerdo CG05/2018 el Consejo General del OPL aprobó el material electoral. A la fecha queda pendiente la aprobación de la documentación electoral.

Yucatán: En fecha 2 de febrero, mediante oficio INE/UTVOPL/0149/2018 la DEOE validó su documentación electoral. La sesión para la aprobación del Acuerdo de documentación y materiales electorales está prevista para el 21 de febrero.

3. Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos.

Ciudad de México: En fecha 1 de febrero, DEOE a través del oficio INE/DEOE/147/2018 emitió la validación definitiva de los Lineamientos, señalando que el OPL podía continuar con su proceso interno para la aprobación en Consejo General. El OPL agendó la aprobación de los Lineamientos en su Sesión Extraordinaria del 13 de febrero.

6. Avance del cumplimiento de actividades por subprocesos.

De conformidad con lo establecido en el Plan Integral, es necesario hacer del conocimiento del Consejo General, el nivel de avance de cada subproceso que integra los Calendarios de Coordinación.

El porcentaje de avance que se registra en cada subproceso está en función del número de actividades que lo integra y el número de actividades concluidas.

Las consideraciones respecto a cada uno de los subprocesos, se resumen en los siguientes recuadros:

Mecanismos de coordinación	Avance
Este subproceso se compone de dos actividades para cada uno de los 30 OPL. <ul style="list-style-type: none"> • En todos los calendarios se ha ejecutado, en tiempo y forma, la celebración del convenio de coordinación INE-OPL. • Se encuentra en proceso de ejecución, dentro del plazo establecido, la elaboración e implementación de un plan de trabajo para la promoción de la participación ciudadana; esta actividad está a cargo de los OPL conjuntamente con el INE. El plazo de cumplimiento finaliza el próximo 1 de julio del presente. 	50% Hasta el momento no se registra desfase en el cumplimiento de las actividades en su conjunto.

Lista Nominal de Electores	Avance
Este subproceso se compone por un total de 194 actividades; 180 se reparten igualmente entre las 30 entidades (seis por cada una de ellas) y 14 corresponden a las siete entidades (dos por cada una de ellas) que tendrán participación de los mexicanos residentes en el extranjero. <ul style="list-style-type: none"> • Son responsabilidad del INE cuatro actividades, y dos tienen responsabilidad conjunta INE/OPL; para las actividades relacionadas con el voto de los mexicanos residentes en el extranjero, una actividad es responsabilidad del INE y una responsabilidad conjunta del INE/OPL. • Durante el mes de enero dio inicio este subproceso con la la Generación del insumo de Lista Nominal de Electores para revisión y exhibición, en las 30 entidades con Proceso Electoral Concurrente. 	0.0% Actividades cumplidas de acuerdo a lo planificado.

Observadores electorales	Avance
<p>Este subproceso se compone por 210 actividades, le corresponden el mismo número de actividades a cada entidad (7). Dos actividades son responsabilidad del INE, una es responsabilidad del OPL y cuatro son responsabilidad conjunta del INE/OPL.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los 30 OPL enviaron la propuesta de materiales de capacitación a sus respectivas Junta Locales Ejecutivas a efecto de que se realice la revisión correspondiente. Dado lo anterior, se llevó a cabo la corrección y validación del material de capacitación presentado por los 30 OPL. • Los OPL ya realizaron el intercambio de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE. • Hasta el momento los OPL y las Juntas Distritales y Locales del Instituto, de las 30 entidades con proceso electoral concurrente, se encuentran dentro del plazo para recibir las solicitudes, impartir los cursos de capacitación y, en su caso, acreditar a los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales. 	<p>56.7%</p> <hr/> <p>No se encuentra desfase en el cumplimiento de las actividades.</p>

Ubicación de casillas	Avance
<p>Este subproceso se compone de 11 actividades para cada uno de los 30 OPL (330) que contemplan los recorridos por los distritos, la examinación, la aprobación, el registro de representantes y la publicación de las ubicaciones para las casillas electorales.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De las 11 actividades, 9 corresponden al INE y 2 a INE/OPL. La primera actividad inicia el 15 de febrero de 2018, por lo que hasta el momento no se presenta ningún avance. 	<p>0.0%</p> <hr/> <p>Sin actividades iniciadas.</p>

Integración de las mesas directivas de casillas	Avance
<p>Este subproceso se compone de 10 actividades para cada entidad federativa cuyo cumplimiento corresponde en su totalidad al INE.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De lo anterior se desprende, la estrategia de capacitación, los sorteos, dos insaculaciones, integración de las listas y entrega de reconocimientos. Solo la primera actividad se ha realizado hasta el momento, por lo que se mantiene el avance de 10%. • En sesión Ordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral del 31 de enero se llevó a cabo el sorteo de insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla, resultando sorteado el mes de febrero. 	<p>20.0%</p> <hr/> <p>No se encuentra desfase en el cumplimiento de las actividades.</p>

Fiscalización de los recursos de los partidos políticos	Avance
<p>Este subproceso se compone por un total de 213 actividades, distribuidas de forma desigual entre las 30 entidades, debido a que las actividades de los OPL varían en relación con el número de cargos a elegir.</p> <p>Se han cumplido 62 actividades dentro del plazo, siete se cumplieron fuera del plazo y sesenta y ocho se encuentran en proceso de ejecución dentro del plazo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Respecto a la aprobación de los topes de gastos de precampañas, todos los OPL cumplieron con la actividad. • Las actividades correspondientes a la realización de las precampañas iniciaron a partir del mes de diciembre y finalizan, en apego a la resolución INE/CG386/2017, el 11 de febrero de 2018. • En relación con la aprobación de topes de gasto de campaña, los Consejos Generales de los OPL, están en proceso para su aprobación. Por tanto, hasta la fecha del corte, 31 de enero de 2018, las Entidades de Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Coahuila, Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco y Zacatecas, realizaron la actividad dentro del plazo. En lo que concierne a los OPL de Michoacán, Querétaro y Oaxaca, éstos cumplieron fuera del plazo. Los OPL de las entidades restantes aún están por aprobar los topes de gastos de campaña, conforme a los plazos establecidos en los respectivos calendarios. 	<p>32.4 %</p> <p>No se encuentra desfase que afecte el desarrollo de las actividades.</p>

Documentación y material electoral	Avance
<p>Este subproceso está compuesto por 481 actividades, las cuales están distribuidas en 16 actividades para cada OPL, excepto para el de Campeche, el cual tiene 17, toda vez que la actividad <i>Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del Organismo Público Local</i> está desglosada para los consejos distritales y municipales, respectivamente; 180 actividades corresponden al INE y 301 a los OPL.</p> <p>Del total de actividades, 79 fueron cumplidas dentro del plazo, 121 cumplidas fuera del plazo y 11 en proceso de ejecución fuera del plazo; cabe señalar que 270 actividades no han iniciado su proceso de ejecución.</p> <p>A continuación, se hace una breve descripción de la situación en la que se encuentran las actividades que han iniciado y en su caso concluido, conforme al plazo establecido en el Calendario de Coordinación con los OPL:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La actividad <i>En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral</i>, las 30 entidades recibieron observaciones en primera y segunda vuelta. • Respecto de la actividad <i>Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas</i>, los estados que ya obtuvieron las validaciones tanto de las especificaciones técnicas de material electoral como de documentación electoral son Aguascalientes, Ciudad de México, Colima Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Faltan por validarse las siguientes entidades Baja California Sur, 	<p>41.6%</p> <p>Si bien hay un desfase en la revisión y validación del material y la documentación electoral, lo anterior responde a las consultas formuladas por los OPL, mismas que han sido atendidas por la Comisión respectiva. Lo anterior, no</p>

<p>Campeche, y Yucatán, debido a que las entidades realizaron algunas consultas, mismas que ya fueron resueltas por la Comisión respectiva. A la fecha del corte se encontraban en proceso de realizar los ajustes correspondientes conforme a lo resuelto, está próxima su validación por parte de la DEOE.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En cuanto a la <i>Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de la documentación y material electoral</i>, las entidades que han cumplido con esta actividad son: Aguascalientes, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. En el caso de Ciudad de México, se encuentra en proceso una solicitud del OPL. • El OPLE de Baja California Sur a través del oficio IEEBCS-PS-1756-2017, solicitó una ampliación de plazo a la DEOE, para la entrega de la segunda revisión de los formatos únicos de la documentación y materiales electorales para el 7 de diciembre de 2017, mismo que se dio cumplimiento con el oficio IEEBCS-PS-1839-2017 en la fecha señalada. • La actividad <i>Revisión del primer informe, emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación</i>. A la fecha de corte la totalidad de los OPL en las entidades, han recibido la validación del <i>primer informe</i> por parte de la DEOE. <p>Las siguientes actividades se encuentran previstas para dar inicio en los próximos meses, conforme a las fechas establecidas en los respectivos calendarios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Supervisiones de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral a los OPL respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales • Entrega por parte del OPL, del segundo informe detallado que dé cuenta de las acciones realizadas para la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales y, en su caso, los avances en su producción y el seguimiento que ha dado a dicha producción, en medios impresos y electrónicos • Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, del segundo informe y emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación • Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla • Aprobación de SE y CAE, así como de personas prestadoras de servicios o personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas • Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del Organismo Público Local • Conteo, sellado y agrupamiento de boletas • Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de Mesa Directiva de Casilla • Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL. 	<p>implica una afectación al desarrollo de las actividades consideradas dentro del presente subproceso.</p>
---	---

Bodegas electorales	Avance
<p>El subproceso se conforma de 120 actividades bajo la adscripción del OPL; de las cuales corresponden cuatro a cada uno de los 30 Organismos Públicos Locales que tendrán Proceso Electoral 2017-2018.</p> <p>A la fecha de corte del presente informe, se ha iniciado la actividad para la <i>determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral.</i></p>	00.0%
	Sin actividades iniciadas.

Voto de los ciudadanos residentes en el extranjero	Avance
<p>Las entidades de Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla y Yucatán, con elección de Gobernador son quienes implementarán el Voto de los Ciudadanos Residentes en el Extranjero. Este subproceso se integra por un total de 9 actividades para cada una de las entidades mencionadas, a la fecha han dado inició 2 actividades que por su naturaleza son inherentes a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE), mismas que se citan a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> Envío-recepción de la Solicitud individual de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el extranjero para procesos electorales locales (SIILNERE), y de la Solicitud Individual para Votar desde el Extranjero (SIVE), la cual dio inició el 09 de septiembre de 2017 y concluye el 31 de marzo de 2018. Fecha límite de envío de subsane de inconsistencias de las Solicitudes por parte los ciudadanos, la cual dio inició el 10 de septiembre de 2017 y concluye el 3 de abril de 2018. 	00.0%
	Hasta el momento no se registra desfase en el cumplimiento de las actividades en su conjunto; se reporta avance en ceros, hasta que las actividades se den por concluidas.

Jornada Electoral	Avance
<p>Este subproceso se encuentra integrado por cuatro actividades, repartidas de forma igualitaria entre las 30 entidades, debido a que son las mismas actividades; dos están a cargo de la Dirección de Organización Electoral del INE, una es responsabilidad tanto del INE como del OPL y una es directamente responsabilidad del OPL. De las cuatro actividades, dos se han iniciado y son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> Aprobación de las metas del SIJE 2018, la cuales tenían fecha de inicio el 01 de julio de 2017 y su fecha de término 08 de septiembre de 2017. Para dar cumplimiento a esta actividad, el 28 de agosto de 2017, en sesión 	50.0%
	El plazo en el que se aprobó el Programa de Operación del SIJE derivó del amplio análisis al interior de la Comisión correspondiente.

<p>extraordinaria el Consejo General del INE aprobó el acuerdo INE/CG384/2017, mediante el cual se establecieron las metas del SIJE 2018, por tanto, la actividad se cumplió en tiempo y forma.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2018, la cuales tenían fecha de inicio el 01 de julio de 2017 y su fecha de término 08 de septiembre de 2017. Para dar cumplimiento el 16 de octubre de 2017, la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, en la Cuarta Sesión Extraordinaria aprobó el Programa de Operación del SIJE. 	
--	--

Mecanismos de recolección	Avance
<p>Este subproceso se compone de siete actividades para cada uno de los 30 OPL. Cabe señalar que a partir del 1 de diciembre de 2017, las Juntas Ejecutivas Distritales del Instituto, están elaborando los estudios de factibilidad para la aprobación de los mecanismos de recolección a utilizarse en el proceso electoral local.</p> <p>Asimismo, es importante mencionar que de las siete actividades que integran este subproceso, seis corresponden al INE y una a los OPL.</p>	<p>0.0%</p> <p>Ha dado inicio una actividad para cada OPL; sin embargo, no representa un avance hasta que las mismas se den por finalizadas.</p>

Cómputos	Avance
<p>Este subproceso tiene un total de 310 actividades, repartidas de forma desigual entre las 30 entidades, ya que estas actividades varían en relación con las que cada OPL contempló para el desarrollo del mismo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los 30 órganos electorales con Proceso Electoral Concurrente con el Federal 2017-2018 iniciaron la actividad en tiempo y forma con la emisión de los lineamientos a través de los cuales se regule el desarrollo de las sesiones especiales de cómputo. • Por otra parte, cabe resaltar que 27 OPL aprobaron en tiempo y forma los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos. Sin embargo, es importante mencionar que el Instituto Electoral de Coahuila y el IEPC de Guerrero dieron cumplimiento a los mismos fuera del plazo establecido. Por lo que respecta al OPL de la Ciudad de México en fecha 1 de febrero, DEOE a través del oficio INE/DEOE/147/2018 emitió la validación definitiva de los Lineamientos, señalando que el OPL podía continuar con su proceso interno para la aprobación en Consejo General. La aprobación se encuentra agendada para el 13 de febrero en la Cuarta Sesión Extraordinaria del Consejo General del OPL de CDMX. 	<p>19%</p> <p>El desfase del cumplimiento de los OPL en la aprobación de los Lineamientos de cómputo no representa riesgo para la continuación de las actividades de este subproceso.</p>

Integración y funcionamiento de órganos desconcentrados	Avance
<p>Este subproceso está conformado por un total de 285 actividades, repartidas de forma desigual entre las 30 entidades, ya que las actividades de los OPL varían en función del tipo y número de órganos desconcentrados que deben instalar para el desarrollo y vigilancia del respectivo proceso electoral.</p> <p>Emisión de convocatorias OPL:</p> <ul style="list-style-type: none"> El OPL de Tlaxcala emitió la convocatoria en fecha 30 de enero, cumpliendo dentro del plazo establecido. Por lo tanto, la actividad ha quedado concluida al 100% por los 30 OPL. <p>Designación e integración:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tlaxcala queda pendiente de integrar sus Consejos Distritales, la actividad se encuentra dentro de plazo. En cuanto a los Consejos Municipales, las entidades que aún no designan a sus integrantes son: Jalisco, Puebla y Tabasco. Todas se encuentran dentro del plazo establecido. Todas las entidades cumplieron en tiempo y forma la designación e integración de sus órganos desconcentrados, a excepción de: Jalisco, Estado de México y Morelos. <p>Instalación:</p> <ul style="list-style-type: none"> La instalación de los órganos desconcentrado presenta un considerable avance. Cabe señalar que los OPL que han concluido con la actividad ha sido en tiempo y forma. Respecto a la instalación de los Consejos Distritales sólo queda pendiente: Tlaxcala. Se encuentra dentro de plazo. En relación a los Consejos Municipales, están pendientes de instalarse en las entidades de: Jalisco, Puebla y Tabasco. Todas están dentro del plazo establecido. 	<p>96.4 %</p> <p>La mayoría de las actividades se han realizado en tiempo y forma, las que presentaron desfase no representa riesgo para continuar con la ejecución de las actividades restantes del subproceso.</p>

Al respecto de este subproceso, sobre la designación e instalación de los órganos desconcentrados de los OPL, resulta pertinente desagregar lo siguiente:

Entidad	Fecha de la sesión del CG del OPL para designación e integración de los órganos desconcentrados.	Fecha de instalación de los Órganos Desconcentrados de los Organismos Públicos Locales.	Estatus
Aguascalientes	28/12/2017	11/01/2018	<p>Ambas actividades se cumplieron dentro de plazo.</p> <p>La instalación de los Consejos se realizó del 9 al 11 de enero del año en curso.</p>
Baja California Sur	24/11/2017	01/12/2017	<p>El OPL emitió tres convocatorias para la integración de los Consejos Municipales y Distritales, la primera fue el 12 de septiembre, la segunda el 27 de octubre y el 24 de octubre se emitió la tercera. No obstante, la actividad de cumplió dentro de plazo.</p> <p>En fecha 1 de diciembre se instalaron los 16 Concejos Distritales y los 5 Consejos Municipales.</p>
Campeche	15/11/2017	21/11/2017	<p>Ambas actividades se cumplieron dentro de plazo.</p> <p>En fecha 21 de noviembre se instalaron los 21 Concejos Distritales y los 3 Consejos Municipales.</p>
Coahuila	23/11/2017	1/12/2017	<p>Ambas actividades se cumplieron dentro de plazo. El día 25 de noviembre se realizó una reunión para dar la bienvenida, capacitar y tomar protesta a los 190 ciudadanos que integran los 38 comités municipales.</p> <p>El día 1 de diciembre de 2017 se realizó una reunión con la Comisión Temporal Coordinadora de Comités Municipales para dar inicio a las funciones de los 38 municipios del Estado.</p>
Colima	30/11/2017	27/11/2017	<p>Ambas actividades se cumplieron dentro de plazo.</p>

Entidad	Fecha de la sesión del CG del OPL para designación e integración de los órganos desconcentrados.	Fecha de instalación de los Órganos Desconcentrados de los Organismos Públicos Locales.	Estatus
			La instalación de los Consejos Municipales se llevó a cabo del 21 al 27 de noviembre del 2017.
Chiapas	30/11/2017	15/12/2017	<p>Ambas actividades se cumplieron dentro de plazo.</p> <p>Cabe mencionar que en Oxchuc no se ha instalado el Consejo Municipal por situaciones ajenas al OPL, toda vez que una parte de la población del municipio quiere cambiar del régimen de Partidos Políticos a usos y costumbres. El OPL y la comunidad de Oxchuc se encuentran en negociaciones para la instalación del Consejo Municipal.</p>
Chihuahua	5/12/2017	26/12/2017	La emisión de la convocatoria se emitió el 19 de septiembre de 2017 y posteriormente se extendió el plazo para la inscripción, fortaleciendo la difusión. Cumplida dentro de plazo.
Ciudad de México	23/01/2018	9/02/2018	Ambas actividades concluyeron dentro de plazo.
Durango	5/11/2017	6/11/2017	Ambas actividades se cumplieron dentro de plazo.
Guanajuato	30/09/2017	15/10/2017	<p>Ambas actividades se cumplieron dentro de plazo.</p> <p>En fecha 21 de noviembre se instalaron los 22 Concejos Distritales y los 46 Consejos Municipales.</p>
Guerrero	29/08/2017	30/11/2017	<p>La convocatoria para integrar los Consejos Distritales se aprobó el 21 de abril de 2017 mediante Acuerdo 017/SE/21-04-2017 y en fecha 24 de mayo de 2017 se modificó la convocatoria para ampliar el periodo de inscripción de aspirantes y las fechas de las etapas subsecuentes.</p> <p>Ambas actividades se cumplieron dentro de plazo.</p>

Entidad	Fecha de la sesión del CG del OPL para designación e integración de los órganos desconcentrados.	Fecha de instalación de los Órganos Desconcentrados de los Organismos Públicos Locales.	Estatus
Hidalgo	23/12/2017	10/01/2018	Ambas actividades se cumplieron dentro de plazo.
			La instalación de los Consejos Distritales se llevó a cabo del 5 al 10 de enero del año en curso.
Jalisco	29/11/2017	16/01/2018	Sólo se han designado e instalado los Consejos Distritales.
			El plazo para la integración de los Consejos Municipales vence el 30 de abril del año en curso, por lo tanto la actividad está dentro del plazo.
Estado de México	1/11/2017	22/11/2017	Cumplida dentro de plazo la integración de los Consejos Distritales.
	1/11/2017	9/11/2017	En el caso de los Consejos Distritales, ambas actividades se llevaron a cabo dentro de plazo.
	14/11/2017	27/11/2017	El IEEM designó a los consejeros electorales municipales, utilizando el método de Insaculación manual, primero asignando a las Consejeras electorales propietarias y suplentes por paridad de género y posteriormente la designación de los Consejeros propietarios y suplentes, completando así un listado de 125 Municipios.
			La designación se cumplió fuera de plazo, sin embargo la instalación fue dentro de plazo.
Michoacán	23/12/2017	31/12/2017	Ambas actividades se cumplieron dentro de plazo. Cabe mencionar que en la entidad no se instalaron los Comités en los municipios de Cherán y Nahuatzen, por situaciones ajenas relacionadas con los grupos indígenas de dichos municipios.
Morelos	21/11/2017	30/11/2017	La designación se cumplió fuera de plazo, toda vez que la fecha de término se encontraba prevista para el 18/11/2017, sin

Entidad	Fecha de la sesión del CG del OPL para designación e integración de los órganos desconcentrados.	Fecha de instalación de los Órganos Desconcentrados de los Organismos Públicos Locales.	Estatus
			<p>embargo la instalación de los Consejos Distritales y Municipales se llevaron a cabo dentro del plazo.</p>
Nuevo León	02/01/2018	17/01/2018	<p>Ambas actividades fueron cumplidas dentro del plazo establecido, sin embargo en fecha 23 de enero el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León revocó el Acuerdo CEE/CG/03/2018.</p> <p>El Pleno consideró por Unanimidad que el acuerdo impugnado es insuficiente para justificar la integración de las Comisiones Municipales, en virtud de que no se anexó y publicó el dictamen por el que se realizó la ponderación de los requisitos de las designaciones, asimismo se tuvo por demostrada la violación al derecho fundamental de petición en su vertiente de plazo razonable en relación con el derecho de acceso a la información; concluyendo que, para tener por satisfecha la exigencia de motivación y lo relativo a paridad de género, la Comisión Estatal deberá tomar en cuenta, al momento de emitir el nuevo acuerdo, las directrices que se establecen en la resolución. Se les otorgó un plazo de 12 días para emitir un nuevo acuerdo; el Organismo Público Local solicitó prórroga, misma fue concedida por un periodo de 7 días, por lo tanto el nuevo Acuerdo deberá emitirse el próximo el 10 de febrero.</p>
Oaxaca	21/11/2017	30/11/2017	<p>Ambas actividades se cumplieron dentro de plazo.</p>
	23/12/2017	30/12/2017	<p>Ambas actividades se cumplieron dentro de plazo.</p>
Puebla	06/12/2017	16/12/2017	<p>Sólo se han designado instalados los 26 Consejos Distritales.</p> <p>Se encuentra pendiente la integración de los Consejos Municipales. La actividad inicia el próximo 24 de febrero.</p>

Entidad	Fecha de la sesión del CG del OPL para designación e integración de los órganos desconcentrados.	Fecha de instalación de los Órganos Desconcentrados de los Organismos Públicos Locales.	Estatus
Querétaro	29/11/2017	10/12/2017	<p>Ambas actividades se cumplieron dentro de plazo.</p> <p>En fecha 10 de diciembre se instalaron los 15 Concejos Distritales y los 12 Consejos Municipales.</p>
Quintana Roo	02/01/2018	19/01/2018	<p>Ambas actividades se cumplieron dentro de plazo.</p>
San Luis Potosí	29/11/2017	30/01/2018	<p>En sesión celebrada el 29 de septiembre del año en curso, el Consejo General del CEEPAC aprobó el acuerdo 083/09/2017 por el cual amplió el plazo para el registro de aspirantes en algunos municipios toda vez que no contaban con el número suficiente de aspirantes para realizar la designación. La designación e integración se llevó a cabo en dos momentos, la primera el 13 de octubre de 2017, misma fecha en que se aprobó una segunda convocatoria; el segundo momento se realizó el 29 de noviembre de 2017.</p> <p>La instalación de las 15 Comisiones Distritales y de los 58 Comités Municipales, se cumplió dentro del plazo establecido.</p>
Sinaloa	14/11/2017	30/11/2017	<p>Ambas actividades se cumplieron dentro de plazo.</p> <p>En fecha 30 de noviembre de 2017 se instalaron los 24 Consejos Distritales y los 12 Consejos Municipales.</p>
Sonora	09/09/2017	10/01/2018	<p>Ambas actividades se cumplieron dentro de plazo.</p> <p>En fecha 10 de enero del año en curso se instalaron los 21 Consejos Distritales y los 72 Consejos Municipales.</p>
Tabasco	05/12/2017	13/12/2017	<p>Sólo se han designado e instalado los Consejos Distritales.</p>

Entidad	Fecha de la sesión del CG del OPL para designación e integración de los órganos desconcentrados.	Fecha de instalación de los Órganos Desconcentrados de los Organismos Públicos Locales.	Estatus
			Se encuentra pendiente la integración de los Consejos Municipales. La actividad comienza el 11 de febrero del año en curso.
Tamaulipas	10/12/2017	5/01/2018	<p>La fecha para la designación de los consejos municipales se modificó para llevarse a cabo, a más tardar, el 10 de diciembre de 2017, derivado del acuerdo IETAM/CG-33/2017 aprobado en fecha 18 de octubre de 2017. En sesión extraordinaria en fecha 10 de diciembre de 2017 se aprobó la integración de los 43 integrantes de los Consejos Municipales de la entidad.</p> <p>La instalación de los mismos se llevó a cabo de acuerdo a lo establecido.</p>
Tlaxcala	Actividad por iniciar el próximo 09/03/2018 y con fecha límite de 13/03/2018.		
Veracruz	10/01/2018	15/01/2018	Ambas actividades se cumplieron dentro de plazo.
Yucatán	20/09/2017	13/12/2017	Ambas actividades se cumplieron dentro de plazo, en fecha 13 de diciembre del 2017 quedaron formalmente instalados los 15 Consejos Distritales y los 106 Consejos Municipales.
	25/09/2017	13/12/2017	
Zacatecas	13/12/2017	12/01/2018	La instalación de los Consejos Distritales se llevó a cabo del 8 al 12 de enero del año en curso.
		9/02/2018	Del 5 al 9 de febrero se instalaron los 58 Consejos Distritales. Ambas actividades fueron concluidas dentro de plazo.

Candidaturas	Avance
<p>Este subproceso se compone por 604 actividades, repartidas de forma desigual entre las 30 entidades, ya que las actividades de los OPL varían en relación con el número de cargos a elegir.</p> <p>Al 31 de enero, 297 actividades se han cumplido dentro del plazo, siete se cumplieron fuera del plazo, 95 se encuentran en proceso de ejecución dentro del plazo y 4 en proceso de ejecución fuera de plazo.</p> <ul style="list-style-type: none"> Las actividades de solicitud de registro de candidatos y su respectiva resolución comienzan en el año 2018, por lo cual no se presenta al momento ningún avance. Al registro de plataformas electorales le corresponden 36 actividades. Los OPL de Coahuila, Nuevo León, Querétaro y Tamaulipas se encuentran en proceso de ejecución dentro del plazo; el OPL de Oaxaca informó que recibió en tiempo y forma las plataformas electorales de todos los partidos políticos. El resto de los órganos electorales inicia esta actividad en 2018. De las actividades relacionadas a candidaturas independientes, 56 corresponden a la recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos interesados. Las 30 entidades ya dieron inicio, de los cuales el OPL de Ciudad de México cumplió dentro del plazo el correspondiente a Jefe de Gobierno, de la misma forma Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí y Yucatán cumplieron dentro del plazo. Los OPL de Baja California Sur, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas se encuentran en proceso de ejecución dentro del plazo. En el caso de Morelos, el plazo para la recepción del escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiran a la candidatura independiente para Gobernador, cerró el 8 de diciembre del año en curso y se registraron 8 personas. Respecto a la recepción de escrito de intención para el cargo de Gobernador en Guanajuato, el OPL hizo de conocimiento que no existió manifestación alguna. La resolución sobre la procedencia de manifestación de intención está cumplida dentro del plazo en el caso de Jefe de Gobierno en Ciudad de México, así como en los OPL de Jalisco, Querétaro y Yucatán. Respecto del plazo para recabar apoyo ciudadano 29 entidades han concluido con el plazo para obtener el respaldo ciudadano para aspirantes a candidatos independientes, a excepción de la Ciudad de México, cuyo plazo vence el 12 de febrero de conformidad con el Acuerdo IECM/ACU-CG-055/2017, mediante el cual se aprobó una ampliación de plazo con motivo del sismo del 19 de septiembre de 2017 que afectó a la CDMX. De conformidad con el Acuerdo No. CG/AC-041/17, en el Estado de Puebla se inició el día 9 de diciembre de 2017, la recepción de apoyo ciudadano para diputaciones y alcaldías. De las cuatro actividades que se cumplieron fuera de plazo, corresponden a Coahuila (Los partidos políticos deberán informar al Consejo General el método de selección interna de candidatos), Estado de México (Emisión de la Convocatoria a ciudadanos interesados en postularse como candidatos independientes a cargos de elección popular) y Querétaro (Sesión del Consejo General para emitir las dos convocatorias, para participar como candidatos independientes, tanto de la elección de Ayuntamientos como en la elección de Diputados). 	<p>62.6%</p> <p>El desfase en el cumplimiento de algunas de las actividades de este subproceso, no representa riesgo para continuar con la ejecución de las actividades restantes.</p>

Respecto a las actividades relacionadas con candidaturas comunes, de las 30 entidades que tendrán Proceso Electoral Local 2017-2018, 23 prevén la figura de Candidatura Común:

Entidades que contemplan la figura de Candidatura Común según normatividad electoral			
<ul style="list-style-type: none"> ● Aguascalientes ● Baja California Sur ● Colima ● Chiapas ● Chihuahua ● Ciudad de México 	<ul style="list-style-type: none"> ● Durango ● Guerrero ● Hidalgo ● Estado de México ● Michoacán ● Morelos 	<ul style="list-style-type: none"> ● Nuevo León** ● Oaxaca* ● Puebla ● Querétaro ● Quintana Roo*** ● Sinaloa* 	<ul style="list-style-type: none"> ● Sonora ● Tabasco ● Tamaulipas ● Tlaxcala ● Yucatán

*Respecto a las entidades de Oaxaca y Sinaloa, los OPL no calendarizaron las actividades relacionadas con la Candidatura Común.

**Respecto al caso de Nuevo León, la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la Acción de inconstitucionalidad 83/2017 y acumuladas 88/2017, 89/2017, 91/2017, 96/2017 y 98/2017, declaró inválidos los artículos referentes a Candidatura Común.

***Mediante el Decreto 100 del Congreso del Estado aprobado el 21 de septiembre de 2017, mediante el cual se reformó la Constitución, las candidaturas comunes serán aplicables a partir del Proceso Electoral Local 2019.

De los 23 OPL que contemplan candidaturas comunes, 20 se encuentran considerados en el seguimiento de los calendarios las siguientes actividades de Candidatura Común:

Entidad	Actividad programada	Plazo		Estatus
		Inicio	Término	
Aguascalientes	Solicitud de registro de candidaturas comunes de Diputados.	06/10/2017	13/01/2018	No se presentaron solicitudes de registro de candidaturas comunes.
	Resolución sobre las candidaturas comunes de diputados.	11/10/2017	18/01/2018	
Baja California Sur	Solicitud de registro Candidatura Común para Diputaciones y Ayuntamientos.	01/12/2017	04/04/2018	En proceso de ejecución dentro del plazo.
	Resolución sobre procedencia de convenio de Candidatura Común para Diputaciones y Ayuntamientos.	06/12/2017	10/04/2018	En proceso de ejecución dentro del plazo.
Colima	Plazo para presentar al OPL la solicitud de registro de convenio de candidaturas comunes de Diputados y Ayuntamientos	15/10/2017	24/12/2017	No se presentaron solicitudes para el registro de candidatura común.
	Solicitud de registro de candidatos de partidos políticos, candidatos independientes, candidaturas comunes para la elección de Ayuntamientos	01/04/2018	04/04/2018	Actividad por iniciar.
Chiapas	Plazo para el registro de candidaturas comunes para diputados y miembros de Ayuntamiento.	07/10/2017	12/03/2018	En proceso de ejecución dentro del plazo.
	Resolución de registro de candidaturas comunes para diputados y miembros de ayuntamiento.	12/10/2017	17/03/2018	En proceso de ejecución dentro del plazo.
Chihuahua	Solicitud de registro de candidatura común para Diputados de Mayoría Relativa	01/12/2017	20/01/2018	Las actividades concluyeron sin la presentación de solicitud de registro de candidatura común.
	Solicitud de registro de candidatura común para Miembros de Ayuntamientos (Presidentes y Síndicos).	01/12/2017	20/01/2018	

Entidad	Actividad programada	Plazo		Estatus
		Inicio	Término	
	Resolución sobre la solicitud de registro de candidatura común para Diputados de Mayoría Relativa.	01/12/2017	25/01/2018	
	Resolución sobre la solicitud de registro de candidatura común para Miembros de Ayuntamientos (Presidentes y Síndicos).	01/12/2017	25/01/2018	
Ciudad de México	Solicitud de registro de candidatos de partidos políticos, candidatos independientes, candidaturas comunes para la elección de Jefe de Gobierno.	09/03/2018	16/03/2018	Actividad por iniciar.
	Solicitud de registro de candidatos de partidos políticos, candidatos independientes, candidaturas comunes para la elección para Diputados.	21/03/2018	28/03/2018	Actividad por iniciar.
	Solicitud de registro de candidatos de partidos políticos, candidatos independientes, candidaturas comunes para la elección para Alcaldías.	21/03/2018	28/03/2018	Actividad por iniciar.
	Resolución para aprobar los registro de candidatos de partidos políticos, candidatos independientes, candidaturas comunes para la elección para Jefe de Gobierno.	29/03/2018	29/03/2018	Actividad por iniciar.
	Resolución para aprobar los registros de candidatos de partidos políticos, candidatos comunes y de candidaturas independientes para la elección de Diputados.	20/04/2018	20/04/2018	Actividad por iniciar.
	Resolución para aprobar los registros de candidatos de partidos políticos, candidatos comunes y de candidaturas independientes para la elección de Alcaldías.	20/04/2018	20/04/2018	Actividad por iniciar.
Durango	Solicitud de registro de convenio de candidatura común	01/11/2017	01/04/2018	En proceso de ejecución dentro del plazo.
	Resolución de Candidatura Común.	06/11/2017	06/04/2018	En proceso de ejecución dentro del plazo.

Entidad	Actividad programada	Plazo		Estatus
		Inicio	Término	
Guerrero	Solicitud de registro de candidaturas comunes para Diputados.	08/09/2017	03/01/2018	El OPL informó que se registró una candidatura común conformada por el PRD y PAN en la elección de diputado local por M.R. en el distrito 20 con cabecera en Teloloapan.
	Solicitud de registro de candidaturas comunes para Ayuntamientos.	08/09/2017	15/01/2018	En la 3a sesión extraordinaria celebrada el 19 de enero, el Consejo General del OPL aprobó resoluciones de candidaturas comunes de la siguiente manera: -PAN-MC (Azoyú, Ahucuetzingo, Malinaltepec y José Joaquín de Herrera) -PRD-MC (Atlixac, Igualapa y Tlacoachistlahuaca) -PAN-PRD (Buenavista de Cuellar, Copala y Teloloapan y Tepecoacuilco de Trujano)
	Resolución sobre las solicitudes de registro de candidaturas comunes para Diputados.	04/01/2018	08/01/2018	El Consejo General del OPL aprobó en sesión del 08/01/2017 la candidatura común para el distrito 20 de Teloloapan entre el PRD y el PAN.
	Resolución sobre las solicitudes de registro de candidaturas comunes para Ayuntamientos.	16/01/2018	21/01/2018	En la 3a sesión extraordinaria celebrada el 19 de enero, el Consejo General del OPL aprobó resoluciones de las candidaturas comunes entre el PAN-MC, PRD-MC Y PAN-MC.
Hidalgo	Plazo para Solicitar al Consejo General del OPL, el registro bajo la figura de candidatura común.	12/02/2018	10/04/2018	Actividad por iniciar.
	Plazo para Resolver respecto a la procedencia de la candidatura común.	15/02/2018	13/04/2018	Actividad por iniciar.
Estado de México	Resolución sobre candidatura común para diputados y Ayuntamientos.	01/09/2017	21/02/2018	En proceso de ejecución dentro del plazo.

Entidad	Actividad programada	Plazo		Estatus
		Inicio	Término	
	Plazo para que los partidos políticos presenten ante el Consejo General del OPL, la solicitud de registro de convenio para candidatura común para la elección de Diputados.	06/09/2017	21/12/2017	La actividad se cumplió en tiempo y forma; el 26 de diciembre el OPL aprobó el convenio de candidatura común que registraron el PRI, PVEM y NUAL para postular candidaturas a Diputaciones de M.R. en 15 de los 45 distritos para la elección de diputados.
	Plazo para que los partidos políticos presenten ante el Consejo General del OPL, la solicitud de registro de convenio para candidatura común para la elección de Ayuntamientos.	06/09/2017	21/12/2017	En el caso de la elección de Ayuntamientos no se presentó ninguna solicitud.
Michoacán	Solicitud de registro de convenio de coalición y candidaturas comunes para Diputados.	08/09/2017	13/01/2018	El OPL informó que se registraron dos coaliciones 1)Morena-PT-PES y 2) PAN-PRD-MC. En candidatura común se sumó a ésta última el PVEM en diversos distritos.
	Solicitud de registro de convenio de coalición y candidaturas comunes para la elección de Ayuntamientos.	08/09/2017	13/01/2018	Solicitaron registro Morena-PT-PES y 2) PAN-PRD-MC. En candidatura común se sumó a ésta última el PVEM en diversos municipios.
	Plazo para presentar al OPLE el registro de convenios de candidaturas comunes para Diputados y Ayuntamientos	08/09/2017	13/01/2018	El OPL informó que en candidatura común se registró el PVEM al PAN y PRD en diversos distritos y municipios.
	Resolución para aprobar las candidaturas para Diputados (de partidos políticos, candidatos comunes).	20/04/2018	20/04/2018	Actividad por iniciar.
	Resolución para aprobar los registros de candidatos de partidos políticos, candidatos comunes para la elección de Ayuntamientos	20/04/2018	20/04/2018	Actividad por iniciar.
Morelos	Solicitud de registro de Convenio de Candidatura Común para Gobernador.	08/09/2017	03/12/2017	El OPL aprobó el acuerdo IMPEPEPAC/CEEE/088/2017 en

Entidad	Actividad programada	Plazo		Estatus
		Inicio	Término	
				el que determina la fecha de término hasta el 2 de enero de 2018.
	Solicitud de registro de Convenio de Candidatura Común para Diputados	08/09/2017	03/12/2017	El OPL aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEEE/088/2017 en el que determina la fecha de término hasta el 12 de enero de 2018.
	Solicitud de registro de Convenio de Candidatura Común para Ayuntamientos.	08/09/2017	03/12/2017	El OPL aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEEE/088/2017 en el que determina la fecha de término el 3 de enero de 2018.
	Resolución sobre convenios de Coalición y/o Candidaturas Común de Gobernador.	18/09/2017	13/01/2018	El Consejo General del OPL aprobó los convenios de coalición en sesión extraordinaria del 13 de enero de 2018.
	Resolución sobre convenios de Coalición y/o Candidaturas Común para Diputados	18/09/2017	23/01/2018	<p>El 22/01/2018 el Consejo General del IMPEPAC aprobó las resoluciones negando los convenios de las candidaturas comunes y convenios de coalición de: a) PAN-MC, b) PRD-PVEM-PSD, c) Morena-PT-PES y PRI-NA. Se otorgó un plazo de 6 días a los partidos para solventar los requerimientos.</p> <p>Ambas coaliciones subsanaron y se encuentra pendiente la sesión del CG del OPL para su aprobación.</p>
	Resolución sobre convenios de Coalición y/o Candidaturas Común para Ayuntamientos	18/09/2017	23/01/2018	<p>El 22/01/2018 el CG del IMPEPAC aprobó las resoluciones negando los convenios de las candidaturas comunes y convenios de coalición de: a) PAN-MC, b) PRD-PVEM-PSD, c) Morena-PT-PES y PRI-NA. Se otorgó un plazo de 6 días a los partidos para solventar los requerimientos.</p> <p>Ambas coaliciones subsanaron y se encuentra pendiente la sesión</p>

Entidad	Actividad programada	Plazo		Estatus
		Inicio	Término	
				del CG del OPL para su aprobación.
Puebla	Solicitud de registro de candidatos de partidos políticos y de candidatos comunes para Gobernador	05/03/2018	11/03/2018	Actividad por iniciar.
	Solicitud de registro de candidatos de partidos políticos y de candidatos comunes para Diputados	05/03/2018	11/03/2018	Actividad por iniciar.
	Solicitud de registro de candidatos de partidos políticos y de candidatos comunes para Ayuntamientos	05/03/2018	11/03/2018	Actividad por iniciar.
	Resolución para aprobar los registros de candidatos de partidos políticos, candidatos comunes y de candidaturas independientes para la elección de Gobernador	29/03/2018	29/03/2018	Actividad por iniciar.
	Plazo para que los partidos políticos presenten ante el Consejo General del OPL, la solicitud de registro de convenio para candidatura común para la elección de Gobernador	29/03/2018	29/03/2018	Actividad por iniciar.
	Resolución para aprobar los registros de candidatos de partidos políticos, candidatos comunes y de candidaturas independientes para la elección de Diputados	20/04/2018	20/04/2018	Actividad por iniciar.
	Resolución para aprobar los registros de candidatos de partidos políticos, candidatos comunes y de candidaturas independientes para la elección de Ayuntamientos	20/04/2018	20/04/2018	Actividad por iniciar.
	Plazo para que los partidos políticos presenten ante el Consejo General del OPL, la solicitud de registro de convenio para candidatura común para las elecciones de Diputados y Ayuntamientos	20/04/2018	20/04/2018	Actividad por iniciar.
Querétaro	Plazo para que los partidos políticos presenten la carta de intención para postular candidaturas comunes	01/09/2017	29/10/2017	No se registró ninguna intención para candidatura común.

Entidad	Actividad programada	Plazo		Estatus
		Inicio	Término	
	Solicitud de registro de candidaturas comunes para la elección de Diputados ante el Consejo General	12/04/2018	16/04/2018	Actividad por iniciar.
	Solicitudes de registro de candidaturas comunes para la elección de Ayuntamientos ante el Consejo General	12/04/2018	16/04/2018	Actividad por iniciar.
	Resolución de las solicitudes de registro de candidaturas comunes para la elección de Diputados	20/04/2018	20/04/2018	Actividad por iniciar.
	Resolución de las solicitudes de registro de candidaturas comunes para la elección de Ayuntamientos	20/04/2018	20/04/2018	Actividad por iniciar.
Sonora	Fecha límite que tienen los partidos políticos para presentar candidatura común ante el OPL	08/09/2017	31/03/2018	En proceso de ejecución dentro del plazo.
	Plazo para la presentación de candidatura común para la elección de Diputados y Ayuntamientos	08/09/2017	31/03/2018	En proceso de ejecución dentro del plazo.
	Resolución sobre el registro del convenio de candidatura común	13/09/2017	05/04/2018	En proceso de ejecución dentro del plazo.
Tabasco	Solicitud de registro de candidatura común para Gobernador	17/03/2018	26/03/2018	Actividad por iniciar.
	Solicitud de registro de candidatura común para Diputados	17/03/2018	26/03/2018	Actividad por iniciar.
	Solicitud de registro de candidatura común para Ayuntamientos	17/03/2018	26/03/2018	Actividad por iniciar.
	Resolución sobre candidatura común para Gobernador	11/04/2018	13/04/2018	Actividad por iniciar.
	Resolución sobre candidatura común para Diputados	11/04/2018	13/04/2018	Actividad por iniciar.
	Resolución sobre candidatura común para Ayuntamientos	11/04/2018	13/04/2018	Actividad por iniciar.
Tamaulipas	Solicitud de registro de candidatura común para Ayuntamientos	16/10/2017	13/01/2018	No se presentaron solicitudes a candidaturas comunes para ayuntamientos.

Entidad	Actividad programada	Plazo		Estatus
		Inicio	Término	
	Resolución sobre candidatura común para Ayuntamiento	17/10/2017	23/01/2018	Dado que no se presentaron solicitudes a candidaturas comunes por ayuntamientos, no se emitieron resoluciones al respecto.
Tlaxcala	Solicitud de registro de candidaturas comunes	24/01/2018	12/02/2018	En proceso de ejecución dentro del plazo.
	Resolución sobre las candidaturas comunes	29/01/2018	17/02/2018	En proceso de ejecución dentro del plazo.
Yucatán	Solicitud de registro Candidatura Común para Gobernador	11/03/2018	18/03/2018	Actividad por iniciar.
	Solicitud de registro Candidatura Común para Diputados	11/03/2018	18/03/2018	Actividad por iniciar.
	Solicitud de registro Candidatura Común para Ayuntamientos	11/03/2018	18/03/2018	Actividad por iniciar.
	Resolución del registro de Candidatura Común para Gobernador	29/03/2018	29/03/2018	Actividad por iniciar.
	Resolución del registro de Candidatura Común para Diputados	20/04/2018	20/04/2018	Actividad por iniciar.
	Resolución del registro de Candidatura Común para Ayuntamientos	20/04/2018	20/04/2018	Actividad por iniciar.

En cuanto a las actividades relativas a candidaturas comunes, de los OPL de Oaxaca y Sinaloa se tienen las siguientes:

Entidad	Actividad programada	Plazo		Estatus
		Inicio	Término	
Oaxaca	Solicitud de registro de convenio de candidatura común para diputaciones	07/03/2017	21/03/2017	Por iniciar. No existe regulación en la Ley Electoral Local, sin embargo la figura es válida. El OPL informó que los plazos de registro de las candidaturas comunes son

				<p>las mismas que para el registro de candidaturas. Hasta la fecha sigue vigente los Lineamientos que deberán observar los partidos políticos al postular candidaturas comunes al Proceso Electoral Ordinario 2015-2016, en los próximos días el Consejo General del OPL aprobará los Lineamientos para el Proceso Electoral 2017-2018.</p>
	<p>Solicitud de registro de convenio de candidatura común para Ayuntamientos</p>	<p>07/03/2017</p>	<p>21/03/2017</p>	<p>Por iniciar. No existe regulación en la Ley Electoral Local, sin embargo la figura es válida. El OPL informó que los plazos de registro de las candidaturas comunes son las mismas que para el registro de candidaturas. Hasta la fecha sigue vigente los Lineamientos que deberán observar los partidos políticos al postular candidaturas comunes al Proceso Electoral Ordinario 2015-2016, en los próximos días el Consejo General del OPL aprobará los Lineamientos para el Proceso Electoral 2017-2018.</p>
<p>Sinaloa</p>	<p>Solicitud de registro de candidatura común de Diputados de MR y RP</p>	<p>27/03/2018</p>	<p>05/04/2018</p>	<p>Por iniciar. No se considera convenio en la legislación (Art. 188 Fracc. VI y VII Ley Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa). Se registra en plazo regular de registro de candidatos.</p>
	<p>Solicitud de registro de candidatura común de Ayuntamientos</p>	<p>27/03/2018</p>	<p>05/04/2018</p>	<p>Por iniciar. No se considera convenio en la legislación (Art. 188 Fracc. VIII Ley Instituciones y Procedimiento Elecciones del Estado de Sinaloa). Se registra en plazo regular de registro de candidatos.</p>

IV. Proceso Electoral Local Extraordinario.

Municipios de Camarón de Tejada, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán, del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

El pasado 1 de junio de 2017, en el estado de Veracruz se celebró la Jornada Electoral, en la que se eligieron los cargos de Ayuntamientos. En los municipios de Camarón de Tejada, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán se declaró la nulidad de la elección de acuerdo con las consideraciones siguientes:

A. Camarón de Tejada

Derivado del recurso de inconformidad interpuesta por el Partido Acción Nacional, el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, determinó la anulación de la elección por actualizarse el supuesto del rebase de tope de gastos de campaña por parte de la candidata de Movimiento Ciudadano.

La sentencia fue confirmada por la Sala Regional el 12 de agosto de 2017 y en fecha 20 de diciembre del mismo año, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió el recurso de Reconsideración SUP-REC-1378/2017.

B. Emiliano Zapata

El Partido de la Revolución Democrática y el candidato Daniel Antonio Baizabal González, presentaron un recurso de inconformidad y juicio ciudadano, respectivamente en los que exponían posibles violaciones a los principios de equidad y certeza, debido a que Daniel Antonio Baizabal González estuvo impedido para realizar campaña electoral durante seis días, por causas que no le fueron imputables y porque la diferencia entre el primero y segundo lugar fue menor a un punto porcentual; el Tribunal Electoral de Veracruz al resolverlos confirmó la validez de la elección.

Sin embargo, la Sala Regional de Xalapa del Tribunal del Poder Judicial de la Federación, revocó la resolución emitida por la autoridad local y declaró la nulidad de la elección. Finalmente el 14 de diciembre del 2017, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de Reconsideración SUP-REC-1401/2017, confirmó la sentencia emitida por la Sala

Regional y la nulidad de la elección por violaciones a los principios de equidad y de certeza.

C. Sayula de Alemán


Derivado del recurso de inconformidad, promovidos por el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Verde Ecologista de México, el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz confirmó los resultados y validó la elección.

Sin embargo, la Sala Regional Xalapa del Tribunal del Poder Judicial de la Federación, revocó la resolución emitida por la autoridad local y declaró la nulidad de la elección, por falta de seguridad en la cadena de custodia del traslado de los 19 votos reservados, los cuales definen el resultado de la elección ya que estos son superiores a la diferencia entre primero y segundo lugar.

Finalmente, la Sala Superior del Tribunal del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de Reconsideración SUP-REC-1345/2017, dejó firme la sentencia emitida por la Sala Regional y la nulidad de la elección por violaciones a los principios de equidad y de legalidad.

Calendario de Seguimiento al PEL Extraordinario 2018 en Veracruz

En fecha 10 de enero de 2018 en Sesión Extraordinaria, el Consejo General emitió el acuerdo número INE/CG19/2018, mediante el cual aprobó el Plan Integral y Calendario de Coordinación para el Proceso Electoral Local Extraordinario, derivado del Proceso Electoral Local 2016-2017, en los municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán en el estado de Veracruz, el cual se integró con un total de **53 actividades**.

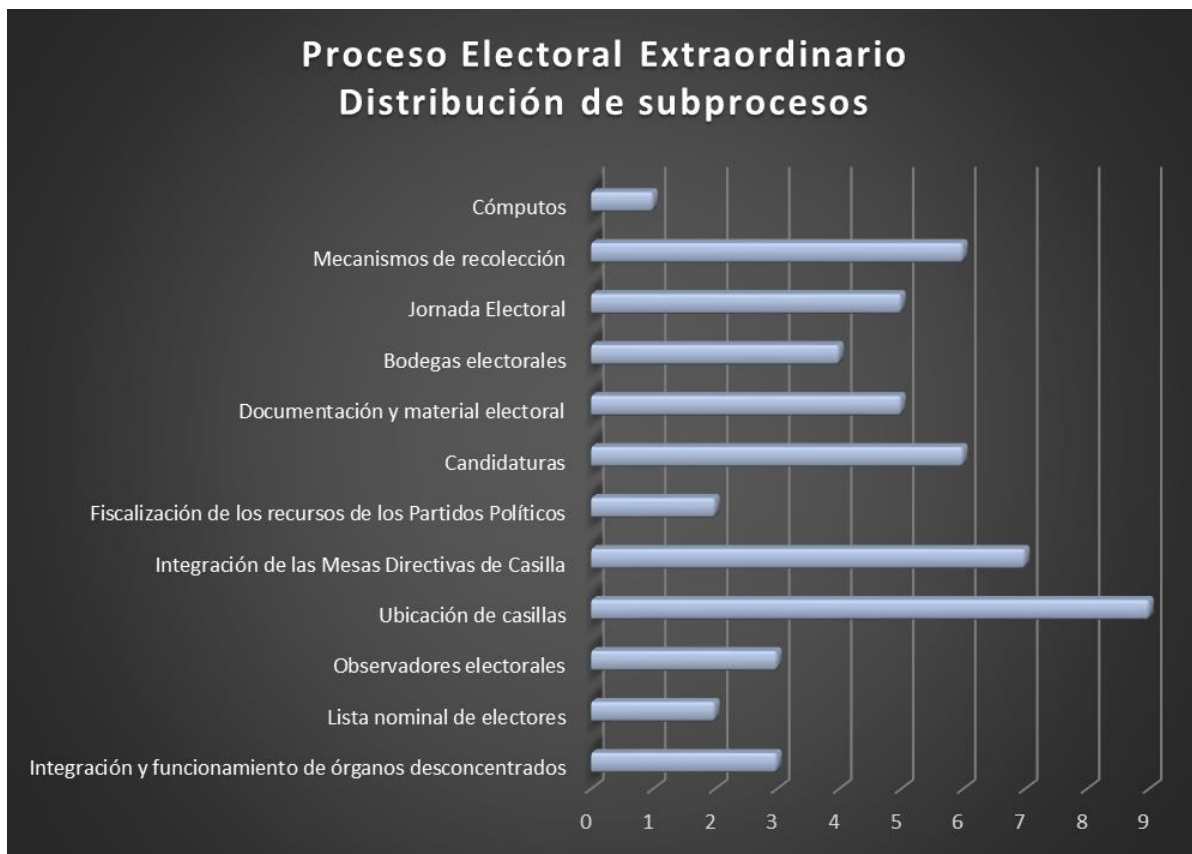

La convocatoria aprobada para el desarrollo del proceso electoral extraordinario, fijó como fecha de la jornada electoral el domingo 18 de marzo del presente año.


1. Avance en el cumplimiento.

Las actividades comenzaron a ejecutarse a partir del 3 de enero de 2018, momento en el que el OPL, en sesión especial, declaró el inicio formal del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, para los municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán.

Al corte del presente informe, se han iniciado un total de 24 en el Calendario para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018.

De las 53 actividades contempladas en el calendario, destaca las 13 actividades concluidas (24.53%), todas se realizaron dentro del plazo establecido, mientras que 11 (20.75%) se encuentran en ejecución dentro del plazo, quedando 29 por iniciar, lo que da un total de 45.28% de avance en el Proceso Local Extraordinario.

Avance Proceso Extraordinario Veracruz 2018

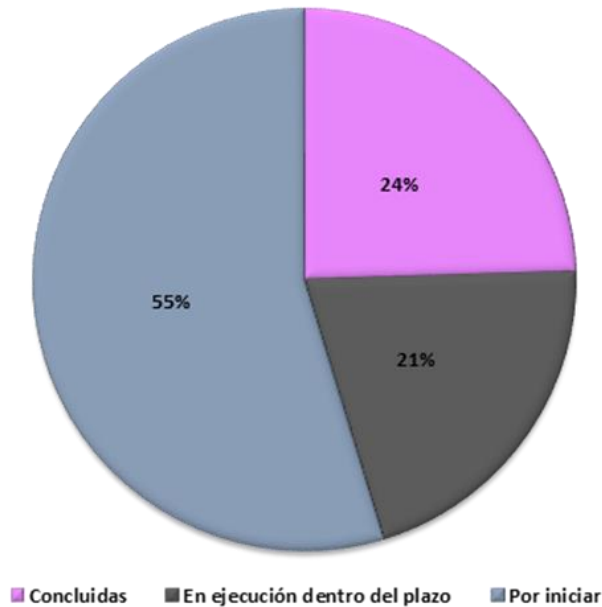

ANEXO 1.

Modificaciones a los calendarios electorales.

Organismo Público Local	Nombre de la actividad	Inicio	Término	Plazos modificados	
				Inicio	Término
Baja California Sur	Aprobación de topes de gastos de precampaña.	01/12/2017	10/12/2017	01/10/2017	31/10/2017
Baja California Sur	Plazo en que los partidos políticos deberán acreditar representantes ante los consejos distritales y municipales del OPL	Sin definición	Sin definición	15/11/2017	30/11/2017
Baja California Sur	Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente al cargo de Diputados y Ayuntamientos	04/11/2017	08/12/2017	15/11/2017	08/12/2017
Baja California Sur	Solicitud de registro Candidatura Común	01/12/2017	05/04/2018	01/12/2017	04/04/2018
Baja California Sur	Los partidos políticos deberán informar al Consejo General la selección interna de candidatos	08/09/2017	23/10/2017	Sin definición	Sin definición
Chihuahua	Aprobación de topes de gastos de precampaña para Diputados	Sin definición	Sin definición	06/11/2017	14/11/2017
Chihuahua	Aprobación de topes de gastos de precampaña para Ayuntamientos	Sin definición	Sin definición	06/11/2017	14/11/2017
Chihuahua	Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente de Diputados	Sin definición	Sin definición	05/12/2017	30/12/2017

Organismo Público Local	Nombre de la actividad	Inicio	Término	Plazos modificados	
				Inicio	Término
Chihuahua	Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente de Ayuntamientos (Presidentes y Síndicos)	Sin definición	Sin definición	05/12/2017	30/12/2017
Chihuahua	Resolución sobre la procedencia de manifestaciones de intención de candidatos independientes	Sin definición	Sin definición	14/01/2018	14/01/2018
Chihuahua	Plazo para obtener al apoyo ciudadano de los Candidatos Independientes a Diputados de Mayoría Relativa	08/01/2018	06/02/2018	15/01/2018	06/02/2018
Chihuahua	Plazo para obtener al apoyo ciudadano de los Candidatos Independientes para Ayuntamientos (Presidente y Síndico)	08/01/2018	06/02/2018	15/01/2018	06/02/2018
Chihuahua	Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de candidatos independientes para Ayuntamientos, Presidentes y Síndicos (verificar apoyo ciudadano)	Sin definición	Sin definición	12/02/2018	18/03/2018
Chihuahua	Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de candidatos independientes para diputados (verificar apoyo ciudadano)	Sin definición	Sin definición	12/02/2018	18/03/2018
Chihuahua	Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputados	Sin definición	Sin definición	01/03/2018	31/03/2018
Chihuahua	Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos	Sin definición	Sin definición	01/03/2018	31/03/2018

Organismo Público Local	Nombre de la actividad	Inicio	Término	Plazos modificados	
				Inicio	Término
Ciudad de México	Los partidos políticos deberán informar al Consejo General el método de selección interna de candidatos a Gobernador, diputados y alcaldías	08/11/2017	10/11/2017	02/11/2017	04/11/2017
Ciudad de México	Plazo en el que los partidos políticos deberán realizar el proceso de selección interna de sus candidatos	01/12/2017	08/03/2018	01/12/2017	11/02/2018
Ciudad de México	Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a candidaturas independientes a Diputados	09/10/2017	21/10/2017	08/12/2017	14/12/2017
Ciudad de México	Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a Candidato Independientes a Alcaldías	16/10/2017	20/10/2017	08/12/2017	14/12/2017
Coahuila	Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos	15/01/2018	15/01/2018	24/12/2017	24/12/2017
Colima	Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputados	01/01/2018	31/01/2018	15/12/2017	15/12/2017
Colima	Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos	01/01/2018	31/01/2018	15/12/2017	15/12/2017
Durango	Plazo en que los partidos políticos deberán acreditar representantes ante los consejos municipales del OPL	15/10/2017	14/11/2017	08/11/2017	07/12/2017

Organismo Público Local	Nombre de la actividad	Inicio	Término	Plazos modificados	
				Inicio	Término
Guerrero	Instalación de Consejos Distritales del OPL	25/11/2017	25/11/2017	30/11/2017	30/11/2017
Guerrero	Emisión de la convocatoria para candidatos independientes a Diputados	27/11/2017	27/11/2017	01/12/2017	01/12/2017
Guerrero	Emisión de la convocatoria para candidatos independientes a Ayuntamientos	27/11/2017	27/11/2017	01/12/2017	01/12/2017
Guerrero	Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos	08/09/2017	15/01/2018	08/09/2017	16/01/2018
Guerrero	Solicitud de registro de candidaturas comunes para Ayuntamiento	08/09/2017	15/01/2018	08/09/2017	16/01/2018
Guerrero	Plazo para el registro de alianzas políticas para Ayuntamientos	08/09/2017	15/01/2018	08/09/2017	16/01/2018
Jalisco	Plazo en que los partidos políticos deberán acreditar representantes ante los consejos distritales del OPL	01/09/2017	15/12/2017	01/09/2017	16/01/2018
Jalisco	Los partidos políticos deberán informar al Consejo General el método de selección interna de candidatos	06/11/2017	19/11/2017	04/09/2017	16/11/2017
Jalisco	Instalación de Consejos Distritales del OPL	01/09/2017	15/12/2017	16/01/2018	16/01/2018
Jalisco	Sesión en la que se designan e integran los Consejos Municipales	01/09/2017	31/10/2017	01/09/2017	30/04/2018

Organismo Público Local	Nombre de la actividad	Inicio	Término	Plazos modificados	
				Inicio	Término
Estado de México	Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente (Diputados y Ayuntamientos)	11/11/2017	17/12/2017	20/10/2017	23/12/2017
Estado de México	Plazo en que los partidos políticos deberán retirar su propaganda electoral	02/07/2017	08/07/2017	02/07/2018	08/07/2018
Michoacán	Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputado	18/09/2017	23/01/2018	14/01/2017	23/01/2017
Michoacán	Resolución sobre convenio de coalición de Ayuntamientos	18/09/2017	23/01/2018	14/01/2017	23/01/2017
Michoacán	Sesión en la que se designan e integran los Comités Distritales del OPL	23/12/2017	27/12/2017	14/12/2017	16/12/2017
Michoacán	Instalación de comités Distritales del OPL	31/12/2017	31/12/2017	23/12/2017	23/12/2017
Michoacán	Instalación de comités municipales del OPL	31/12/2017	31/12/2017	23/12/2017	23/12/2017
Michoacán	Solicitud de registro de candidatos de partidos políticos, candidatos independientes para la elección para Ayuntamientos.	02/01/2018	06/01/2018	27/03/2018	10/04/2018
Michoacán	Solicitud de registro de candidatos de partidos políticos, candidatos independientes para la elección para Diputados.	02/01/2018	06/01/2018	27/03/2018	10/04/2018
Morelos	Solicitud de registro de Convenio de Candidatura Común para Gobernador	08/09/2017	03/12/2017	08/09/2017	02/01/2018

Organismo Público Local	Nombre de la actividad	Inicio	Término	Plazos modificados	
				Inicio	Término
Morelos	Solicitud de registro de Convenio de Candidatura Común para Diputados	08/09/2017	03/12/2017	08/09/2017	12/01/2018
Morelos	Solicitud de registro de Convenio de Candidatura Común para Ayuntamientos	08/09/2017	03/12/2017	08/09/2017	12/01/2018
Nuevo León	Los partidos políticos deberán informar al Consejo General el método de selección interna de candidatos	06/11/2017	05/01/2018	06/11/2017	15/01/2018
Nuevo León	Plazo en el que los partidos políticos determinarán el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos	06/11/2017	05/01/2018	06/11/2017	12/01/2018
Nuevo León	Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Diputados	08/11/2017	08/12/2017	09/11/2017	08/12/2017
Nuevo León	Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Ayuntamientos	08/11/2017	08/12/2017	09/11/2017	08/12/2017
Nuevo León	Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de candidatos independientes para Diputados	08/11/2017	13/12/2017	09/11/2017	13/12/2017
Nuevo León	Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de candidatos independientes para Ayuntamientos	08/11/2017	13/12/2017	09/11/2017	13/12/2017

Organismo Público Local	Nombre de la actividad	Inicio	Término	Plazos modificados	
				Inicio	Término
Nuevo León	Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Diputados	09/11/2017	08/12/2017	17/11/2017	16/12/2017
Nuevo León	Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Ayuntamientos	09/11/2017	08/12/2017	17/11/2017	16/12/2017
Nuevo León	Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de candidatos independientes para Diputados	09/11/2017	13/12/2017	17/11/2017	22/12/2017
Nuevo León	Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de candidatos independientes para Ayuntamientos	09/11/2017	13/12/2017	17/11/2017	22/12/2017
Nuevo León	Solicitud de registro de candidatos de partidos políticos y candidaturas independientes para Diputados	14/04/2018	09/05/2018	22/03/2018	15/04/2018
Nuevo León	Solicitud de registro de candidatos de partidos políticos y candidaturas independientes para Ayuntamientos	14/04/2018	09/05/2018	22/03/2018	15/04/2018
Nuevo León	Resolución para aprobar las candidaturas para Diputados (de partidos políticos y candidatos independientes)	20/04/2018	20/04/2018	16/04/2018	20/04/2018

Organismo Público Local	Nombre de la actividad	Inicio	Término	Plazos modificados	
				Inicio	Término
Nuevo León	Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos (de partidos políticos y candidatos independientes)	20/04/2018	20/04/2018	16/04/2018	20/04/2018
Nuevo León	Convocatoria para la integración de las Comisiones Municipales del OPL	Sin definición	Sin definición	06/11/2018	13/11/2018
Oaxaca	Resolución sobre la procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a candidatos independientes a diputados	21/01/2018	Por Definir	07/01/2018	07/01/2018
Oaxaca	Resolución sobre la procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a candidatos independientes a ayuntamientos	21/01/2018	Por Definir	07/01/2018	07/01/2018
Oaxaca	Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente a diputados y ayuntamientos	01/02/2018	Por Definir	31/11/2017	25/12/2017
Puebla	Los partidos políticos deberán informar al Consejo General el método de selección interna de candidatos	29/10/2017	27/02/2018	29/10/2017	10/02/2017
Querétaro	Aprobación de topes de gastos de precampaña	01/09/2017	15/10/2018	01/09/2017	15/10/2017
Querétaro	Resolución sobre convenio de coalición para diputados	11/09/2017	08/11/2017	11/09/2017	23/01/2018
Querétaro	Resolución sobre convenio de coalición para ayuntamientos	11/09/2017	08/11/2017	11/09/2017	23/01/2018

Organismo Público Local	Nombre de la actividad	Inicio	Término	Plazos modificados	
				Inicio	Término
Querétaro	Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Diputados	Sin definición	Sin definición	19/09/2017	17/10/2017
Querétaro	Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Ayuntamientos	Sin definición	Sin definición	19/09/2017	17/10/2017
Querétaro	Plazo para obtener al apoyo ciudadano de los Candidatos Independientes para la elección de Diputados	24/10/2017	06/02/2018	08/01/2018	06/02/2018
Querétaro	Plazo para obtener al apoyo ciudadano de los Candidatos Independientes para la elección de Ayuntamientos	24/10/2017	06/02/2018	08/01/2018	06/02/2018
Querétaro	Precampaña para Diputados	29/10/2017	11/02/2018	13/01/2018	11/02/2018
Querétaro	Precampaña para Ayuntamientos	29/10/2017	11/02/2018	13/01/2018	11/02/2018
Querétaro	Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputados	01/09/2017	29/10/2017	01/09/2017	13/01/2018
Querétaro	Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos	01/09/2017	29/10/2017	01/09/2017	13/01/2018
Querétaro	Plazo en el que los partidos políticos determinarán el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos	01/09/2017	14/10/2017	01/09/2017	29/12/2017
Quintana Roo	Sesión del Consejo General del OPL para dar inicio al PEL	15/02/2018	15/02/2018	20/12/2017	20/12/2017

Organismo Público Local	Nombre de la actividad	Inicio	Término	Plazos modificados	
				Inicio	Término
Quintana Roo	Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos	Sin definición	03/01/2018	20/12/2017	13/01/2018
Quintana Roo	Resolución sobre el registro de convenio de coalición de ayuntamiento	Sin definición	13/01/2018	30/12/2017	23/01/2018
Quintana Roo	Etapa de obtención de respaldo ciudadano de los aspirantes a candidatos independientes	24/01/2018	06/02/2018	14/01/2018	06/02/2018
Quintana Roo	Campaña para Ayuntamientos	29/04/2018	27/06/2018	14/05/2018	27/06/2018
Quintana Roo	Sesión en la que se designan e integran los Consejos Municipales del OPL	15/02/2018	31/03/2018	20/12/2017	18/01/2018
Quintana Roo	Instalación de Consejos Municipales del OPL	25/03/2018	31/03/2018	20/12/2017	19/01/2018
Quintana Roo	Registro de aspirantes a candidatos independientes	26/02/2018	01/03/2018	04/01/2018	08/01/2018
Quintana Roo	Declaratoria de candidatos independientes	22/03/2018	26/03/2018	13/01/2018	13/01/2018
Quintana Roo	Plazo para el registro de plataformas electorales	01/04/2018	15/04/2018	01/02/2018	05/02/2018
Quintana Roo	Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de Mesa Directiva de Casilla	25/06/2018	29/06/2018	26/06/2018	30/06/2018
Quintana Roo	Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral	01/02/2018	28/02/2018	02/02/2018	28/02/2018

Organismo Público Local	Nombre de la actividad	Inicio	Término	Plazos modificados	
				Inicio	Término
Quintana Roo	Integración por parte de los Consejos Municipales del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo, para ser presentada a los integrantes del órgano para su análisis	04/03/2018	10/04/2018	04/02/2018	10/02/2018
Quintana Roo	Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos	15/06/2018	26/06/2018	01/06/2018	01/06/2018
San Luis Potosí	Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputados	10/09/2017	31/10/2017	10/09/2017	27/04/2018
San Luis Potosí	Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos	10/09/2017	31/10/2017	10/09/2017	27/04/2018
Sinaloa	Resolución sobre la procedencia de manifestaciones de intención de candidatos independientes	07/01/2018	07/01/2018	07/01/2018	09/01/2018
Sonora	Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente a Diputado	16/12/2017	17/01/2018	09/11/2017	17/01/2018
Sonora	Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente a Ayuntamientos.	16/12/2017	17/01/2018	09/11/2017	17/01/2018

Organismo Público Local	Nombre de la actividad	Inicio	Término	Plazos modificados	
				Inicio	Término
Tabasco	Plazo en que los partidos políticos deberán acreditar representantes ante los consejos distritales del OPL	Sin definición	Sin definición	17/12/2017	15/01/2018
Tamaulipas	Sesión en la que se designan e integran los Consejos Municipales	15/11/2017	15/11/2017	10/12/2017	10/12/2017
Tamaulipas	Campaña para Ayuntamientos	29/04/2018	27/06/2018	14/05/2018	27/06/2018
Tlaxcala	Plazo para el registro de plataformas electorales	01/01/2018	22/01/2018	01/01/2018	01/03/2018
Tlaxcala	Plazo en que los partidos políticos deberán presentar al Consejo General del Organismo Público Local el registro de plataformas electorales	01/01/2018	22/01/2018	01/01/2018	01/03/2018
Tlaxcala	Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de candidatos independientes	26/03/2018	02/04/2018	10/02/2018	20/02/2018
Tlaxcala	Resolución para aprobar las candidaturas para Diputados (de partidos políticos y candidatos independientes)	20/04/2018	20/04/2018	02/04/2018	20/04/2018
Veracruz	Plazo en el que los partidos políticos determinarán el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos	Sin definición	23/11/2017	23/11/2017	23/11/2017
Veracruz	Plazo en el que los partidos políticos deberán realizar el proceso de selección interna de sus candidatos	03/12/2017	Sin definición	03/12/2017	25/02/2018
Veracruz	Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los	Sin definición	Sin definición	08/12/2017	08/12/2017

Organismo Público Local	Nombre de la actividad	Inicio	Término	Plazos modificados	
				Inicio	Término
	aspirantes a candidaturas independientes a Gobernador				
Veracruz	Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a candidaturas independientes a Diputados	Sin definición	Sin definición	07/01/2018	07/01/2018
Veracruz	Precampaña para Diputados	03/01/2018	11/02/2018	23/01/2018	11/02/2018
Veracruz	Campaña para Diputados	29/04/2018	27/06/2018	29/05/2018	27/06/2018
Veracruz	Plazo en que los partidos políticos deberán retirar la propaganda electoral	Sin definición	Sin definición	08/07/2018	08/07/2018
Yucatán	Instalación de Consejos Distritales del OPL	01/11/2017	15/11/2017	01/12/2017	13/12/2017
Yucatán	Instalación de Consejos Municipales del OPL	01/11/2017	15/11/2017	01/12/2017	13/12/2017
Yucatán	Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente a Gobernador	08/12/2017	06/02/2018	09/12/2017	06/02/2018
Yucatán	Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente de Diputados	08/12/2017	06/02/2018	09/12/2017	06/02/2018
Yucatán	Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente para Ayuntamientos	08/12/2017	06/02/2018	09/12/2017	06/02/2018

Organismo Público Local	Nombre de la actividad	Inicio	Término	Plazos modificados	
				Inicio	Término
Yucatán	Solicitud de registro Candidatura Común para Diputados	05/04/2018	12/04/2018	11/03/2018	18/03/2018
Yucatán	Solicitud de registro Candidatura Común para Ayuntamientos	05/04/2018	12/04/2018	11/03/2018	18/03/2018
Yucatán	Resolución del registro de Candidatura Común para Diputados	22/04/2018	22/04/2018	20/04/2018	20/04/2018
Yucatán	Resolución del registro de Candidatura Común para Ayuntamientos	22/04/2018	22/04/2018	20/04/2018	20/04/2018
Yucatán	Plazo en que los partidos políticos deberán acreditar representantes ante los consejos distritales del OPL	01/12/2017	15/12/2017	01/01/2017	13/01/2017
Zacatecas	Instalación de los Consejos Distritales del OPL	01/01/2018	07/01/2018	08/01/2018	12/01/2018

ANEXO 2.

Actividades concluidas fuera de plazo.

En las 30 entidades se cumplió fuera del plazo, la siguiente actividad:

Entidad	Actividad	Adscripción	UR	Plazo programado		Fecha real de término
				Inicio	Término	
30 entidades	Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2018	INE	DEOE	01/07/2017	08/09/2017	16/10/2017

Entidad	Actividad	INE/OPL	UR	Plazo programado		Fecha real de término
				Inicio	Término	
Aguascalientes	Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL	INE	DEOE	20/09/2017	25/09/2017	09/11/2017
Aguascalientes	En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral	OPL	DEOE	25/09/2017	30/09/2017	27/11/2017
Aguascalientes	Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas	INE	DEOE	30/09/2017	05/10/2017	22/12/2017

Entidad	Actividad	INE/OPL	UR	Plazo programado		Fecha real de término
				Inicio	Término	
Aguascalientes	Revisión del primer informe, emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación	INE	DEOE	04/11/2017	04/01/2018	15/01/2018
Baja California Sur	Intercambio de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE	INE/OPL	VEL/OPL	30/10/2017	25/11/2017	27/11/2017
Baja California Sur	En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral	OPL	CG	25/09/2017	30/09/2017	28/12/2017
Baja California Sur	Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL	INE	DEOE	20/09/2017	25/09/2017	01/12/2017
Baja California Sur	Revisión del primer informe, emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación	INE	DEOE	04/11/2017	04/01/2018	18/01/2018
Chiapas	Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL	INE	DEOE	20/09/2017	25/09/2017	10/11/2017

Entidad	Actividad	INE/OPL	UR	Plazo programado		Fecha real de término
				Inicio	Término	
Chiapas	En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral	OPL	CG	25/09/2017	30/09/2017	04/12/2017
Chiapas	Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas	INE	DEOE	30/09/2017	05/10/2017	29/12/2017
Campeche	Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL	INE	DEOE	20/09/2017	25/09/2017	23/11/2017
Campeche	En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral	OPL	CG	25/09/2017	30/09/2017	04/12/2017
Campeche	Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas	INE	DEOE	30/09/2017	05/10/2017	06/02/2018
Chihuahua	Corrección y validación de materiales de capacitación para elecciones locales	INE	JLE	15/09/2017	30/10/2017	31/10/2017
	Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y	INE	DEOE	20/09/2017	25/09/2017	13/12/2017

Entidad	Actividad	INE/OPL	UR	Plazo programado		Fecha real de término
				Inicio	Término	
Chihuahua	especificaciones técnicas, presentadas por el OPL					
Chihuahua	En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral	OPL	CG	25/09/2017	30/09/2017	14/12/2017
Chihuahua	Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas	INE	DEOE	30/09/2017	05/10/2017	29/12/2017
Chihuahua	Revisión del primer informe, emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación	INE	DEOE	04/11/2017	04/01/2018	15/01/2018
Ciudad de México	Intercambio de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE	INE/OPL	VEL/OPL	30/10/2017	25/11/2017	13/12/2017
Ciudad de México	Aprobación de topes de gastos de precampaña Jefe de Gobierno	OPL	CG	16/10/2017	13/12/2017	30/11/2017
Ciudad de México	Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL	INE	DEOE	20/09/2017	25/09/2017	02/10/2017

Entidad	Actividad	INE/OPL	UR	Plazo programado		Fecha real de término
				Inicio	Término	
Ciudad de México	En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral	OPLI	CG	25/09/2017	30/09/2017	14/12/2017
Ciudad de México	Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas	INE	DEOE	30/09/2017	05/10/2017	15/01/2018
Coahuila	Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, tanto para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero como para la votación en territorio nacional, en medios impresos y electrónicos	OPL	CG	10/09/2017	16/09/2017	27/09/2017
Coahuila	Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL	INE	DEOE	20/09/2017	25/09/2017	09/11/2017
Coahuila	Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos	OPL	CG	31/08/2017	31/08/2017	28/09/2017

Entidad	Actividad	INE/OPL	UR	Plazo programado		Fecha real de término
				Inicio	Término	
Coahuila	En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral	OPL	CG	25/09/2017	30/09/2017	27/11/2017
Coahuila	Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas	INE	DEOE	30/09/2017	05/10/2017	15/12/2017
Coahuila	Los partidos políticos deberán informar al Consejo General el método de selección interna de candidatos	OPL	CG	01/11/2017	04/12/2017	12/12/2017
Coahuila	Revisión del primer informe, emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación	INE	DEOE	04/11/2018	04/01/2018	15/01/2018
Coahuila	Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de la documentación y material electoral	OPL	CG	16/10/2018	31/12/2018	13/01/2018
Colima	Emisión de la convocatoria para los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales	INE/OPL	CG	08/08/2017	08/09/2017	09/10/2017
Colima	Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL	INE	DEOE	20/09/2017	25/09/2017	23/11/2017

Entidad	Actividad	INE/OPL	UR	Plazo programado		Fecha real de término
				Inicio	Término	
Colima	Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas	INE	DEOE	30/09/2017	05/10/2017	28/12/2017
Colima	En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral	OPL	CG	25/09/2017	30/09/2017	28/12/2017
Colima	Revisión del primer informe, emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación	INE	DEOE	04/11/2017	04/01/2018	15/01/2018
Durango	Emisión de la convocatoria para los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales	INE/OPL	CG	08/08/2017	01/11/2017	02/11/2017
Durango	Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL	INE	DEOE	20/09/2017	25/09/2017	10/11/2017
Durango	En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral	OPL	CG	25/09/2017	30/09/2017	16/12/2017
Durango	Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones	INE	DEOE	30/09/2017	05/10/2017	22/12/2017

Entidad	Actividad	INE/OPL	UR	Plazo programado		Fecha real de término
				Inicio	Término	
	técnicas, con las observaciones subsanadas					
Durango	Aprobación de topes de gastos de campaña	OPL	CG	01/01/2018	31/01/2018	08/02/2018
Guanajuato	Emisión de la convocatoria para los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales	INE/OPL	CG	08/08/2017	08/09/2017	29/09/2017
Guanajuato	Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL	INE	DEOE	20/09/2017	25/09/2017	10/11/2017
Guanajuato	En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral	OPL	CG	25/09/2017	30/09/2017	24/11/2017
Guanajuato	Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas	INE	DEOE	30/09/2017	05/10/2017	28/12/2017
Guanajuato	Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de la documentación y material electoral	OPL	CG	06/10/2017	31/12/2017	13/01/2017
Guanajuato	Revisión del primer informe, emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación	INE	DEOE	04/11/2017	04/01/2018	18/01/2018

Entidad	Actividad	INE/OPL	UR	Plazo programado		Fecha real de término
				Inicio	Término	
Guerrero	Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL	INE	DEOE	20/09/2017	25/09/2017	09/11/2017
Guerrero	Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos	OPL	CG	31/08/2017	31/08/2017	01/09/2017
Guerrero	En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral	OPL	CG	25/09/2017	30/09/2017	09/12/2017
Guerrero	Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas	INE	DEOE	30/09/2017	05/10/2017	29/12/2017
Guerrero	Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de la documentación y material electoral	OPL	CG	06/10/2017	31/12/2017	12/01/2018
Hidalgo	Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, tanto para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero como para la votación en	OPL	CG	10/09/2017	16/09/2017	21/09/2017

Entidad	Actividad	INE/OPL	UR	Plazo programado		Fecha real de término
				Inicio	Término	
	territorio nacional, en medios impresos y electrónicos					
Hidalgo	Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL	INE	DEOE	20/09/2017	22/09/2017	05/12/2017
Hidalgo	En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral	OPL	CG	25/09/2017	30/09/2017	29/12/2017
Hidalgo	Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas	INE	DEOE	30/09/2017	05/10/2017	29/12/2017
Hidalgo	Revisión del primer informe, emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación	INE	DEOE	04/11/2017	04/01/2018	19/01/2018
Jalisco	Sesión en la que se designan e integran los Consejos Distritales del OPL	OPL	CG	01/09/2017	31/10/2017	29/11/2017
Jalisco	Emisión de la convocatoria para los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales	INE/OPL	CG	08/08/2017	08/09/2017	25/09/2017

Entidad	Actividad	INE/OPL	UR	Plazo programado		Fecha real de término
				Inicio	Término	
Jalisco	Intercambio de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE	INE/OPL	VEL/OPL	30/10/2017	25/11/2017	28/11/2017
Jalisco	Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL	INE	DEOE	20/09/2017	25/09/2017	15/07/2017
Jalisco	En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral	OPL	CG	25/09/2017	30/09/2017	28/11/2017
Jalisco	Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas	INE	DEOE	30/09/2017	05/10/2017	20/12/2017
Jalisco	Plazo para el registro de plataformas electorales	OPL	CG	01/01/2018	15/01/2018	16/01/2018
Jalisco	Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de la documentación y material electoral	OPL	CG	06/10/2017	31/12/2017	13/01/2018
Jalisco	Revisión del primer informe, emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación	INE	DEOE	04/11/2017	04/01/2018	19/01/2018
Estado de México	Convocatoria para la designación de Consejeros Electorales Distritales y Municipales.	OPL	CG	02/09/2017	02/09/2017	08/09/2017

Entidad	Actividad	INE/OPL	UR	Plazo programado		Fecha real de término
				Inicio	Término	
Estado de México	Sesión del Consejo General del OPL, en la que se designan Consejeros Municipales	OPL	CG	01/11/2017	10/11/2017	14/11/2017
Estado de México	Emisión de la Convocatoria a ciudadanos interesados en postularse como candidatos independientes a cargos de elección popular	OPL	CG	10/11/2017	10/11/2017	19/10/2017
Estado de México	Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, tanto para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero como para la votación en territorio nacional, en medios impresos y electrónicos	OPL	CG	10/09/2017	16/09/2017	18/09/2017
Estado de México	Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL	INE	DEOE	20/09/2017	25/09/2017	30/11/2017
Estado de México	En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral	OPL	CG	25/09/2017	30/09/2017	14/12/2017
Estado de México	Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas	INE	DEOE	30/09/2017	05/10/2017	29/12/2017

Entidad	Actividad	INE/OPL	UR	Plazo programado		Fecha real de término
				Inicio	Término	
Estado de México	Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de la documentación y material electoral	OPL	CG	06/10/2017	31/12/2017	11/01/2018
Estado de México	Revisión del primer informe, emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación	INE	DEOE	04/11/2017	04/01/2017	19/01/2018
Michoacán	Emisión de la convocatoria para los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales	INE/OPL	CG	08/08/2017	08/09/2017	14/09/2017
Michoacán	Corrección y validación de materiales de capacitación para elecciones locales	INE	JLE	15/09/2017	30/10/2017	09/11/2017
Michoacán	Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputados	OPL	CG	13/09/2017	13/09/2017	14/09/2017
Michoacán	Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos	OPL	CG	13/09/2017	13/09/2017	14/09/2017
Michoacán	Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, tanto para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero como para la votación en territorio nacional, en medios impresos y electrónicos	OPL	CG	10/09/2017	16/09/2017	18/09/2017
Michoacán	Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL	INE	DEOE	20/09/2017	25/09/2017	30/11/2017

Entidad	Actividad	INE/OPL	UR	Plazo programado		Fecha real de término
				Inicio	Término	
Michoacán	En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral	OPL	CG	25/09/2017	30/09/2017	08/12/2017
Michoacán	Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas	INE	DEOE	30/09/2017	05/10/2017	29/12/2017
Michoacán	Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de la documentación y material electoral	OPL	CG	06/10/2017	31/12/2017	17/01/2018
Morelos	Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL	INE	DEOE	20/09/2017	25/09/2017	11/11/2017
Morelos	En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral	OPL	CG	25/09/2017	30/09/2017	11/11/2017
Morelos	Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas	INE	DEOE	30/09/2017	05/10/2017	29/12/2017

Entidad	Actividad	INE/OPL	UR	Plazo programado		Fecha real de término
				Inicio	Término	
Morelos	Sesión en la que se designan e integran los Consejos Distritales y Municipales Electorales	OPL	CG	18/11/2017	18/11/2017	21/11/2017
Morelos	Revisión del primer informe, emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación	INE	DEOE	04/11/2017	04/01/2018	22/01/2018
Nuevo León	Emisión de la convocatoria para los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales	INE/OPL	CG	08/08/2017	06/11/2017	15/11/2017
Nuevo León	Remisión de materiales de capacitación por parte del OPL a la JLE para revisión	OPL	CG	14/08/2017	08/10/2017	11/10/2017
Nuevo León	Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL	INE	DEOE	20/09/2017	25/09/2017	30/11/2017
Nuevo León	Intercambio de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE	INE/OPL	VEL/OPL	30/10/2017	25/11/2017	18/12/2017
Nuevo León	En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral	OPL	CG	25/09/2017	30/09/2017	07/12/2017
Nuevo León	Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones	INE	DEOE	30/09/2017	05/10/2017	08/01/2018

Entidad	Actividad	INE/OPL	UR	Plazo programado		Fecha real de término
				Inicio	Término	
	técnicas, con las observaciones subsanadas					
Nuevo León	Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de la documentación y material electoral	OPL	CG	06/10/2017	31/12/2017	22/01/2017
Nuevo León	Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputado	OPL	CG	11/11/2017	13/01/2018	02/02/2018
Nuevo León	Resolución sobre convenio de coalición para ayuntamientos	OPL	CG	11/1/2017	13/01/2018	02/02/2018
Oaxaca	Emisión de la convocatoria para los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales	INE/OPL	CG	08/08/2017	08/09/2017	15/11/2017
Oaxaca	Remisión de materiales de capacitación por parte del OPL a la JLE para revisión	OPL	CG	14/08/2017	08/10/2017	24/10/2017
Oaxaca	Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, tanto para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero como para la votación en territorio nacional, en medios impresos y electrónicos	OPL	CG	10/09/2017	16/09/2017	08/11/2017
Oaxaca	En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral	OPLE	CG	25/09/2017	30/09/2017	05/12/2017

Entidad	Actividad	INE/OPL	UR	Plazo programado		Fecha real de término
				Inicio	Término	
Oaxaca	Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL	INE	DEOE	20/09/2017	25/09/2017	24/11/2017
Oaxaca	Aprobación de topes de gastos de campaña	OPL	CG	01/12/2017	31/12/2017	06/01/2018
Oaxaca	Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas	INE	DEOE	30/09/2017	05/10/2017	08/01/2018
Oaxaca	Revisión del primer informe, emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación	INE	DEOE	04/11/2017	04/01/2018	19/01/2018
Puebla	Corrección y validación de materiales de capacitación para elecciones locales	INE	JLE	15/09/2017	30/10/2017	31/10/2017
Puebla	Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL	INE	DEOE	20/09/2017	25/09/2017	22/11/2017
Puebla	En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral	OPL	CG	25/09/2017	30/09/2017	06/12/2017

Entidad	Actividad	INE/OPL	UR	Plazo programado		Fecha real de término
				Inicio	Término	
Puebla	Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas	INE	DEOE	30/09/2017	05/10/2017	28/12/2017
Puebla	Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de la documentación y material electoral	OPL	CG	01/12/2017	31/12/2017	06/01/2018
Querétaro	Emisión de la convocatoria para los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales	INE/OPL	CG	08/08/2017	08/09/2017	18/09/2017
Querétaro	Sesión del Consejo General para emitir la convocatoria para participar como candidatos independientes en la elección de Diputados.	OPL	CG	01/09/2017	30/09/2017	18/09/2017
Querétaro	Sesión del Consejo General para emitir la convocatoria para participar como candidatos independientes en la elección de Ayuntamientos.	OPL	CG	01/09/2017	30/09/2017	18/09/2017
Querétaro	Aprobación de topes de gastos de campaña	OPL	CG	01/01/2018	15/01/2018	17/01/2018
Querétaro	Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL	INE	DEOE	20/09/2017	25/09/2017	14/12/2017
Querétaro	En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la	OPL	CG	25/09/2017	30/09/2017	22/12/2017

Entidad	Actividad	INE/OPL	UR	Plazo programado		Fecha real de término
				Inicio	Término	
	Dirección Ejecutiva de Organización Electoral					
Querétaro	Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas	INE	DEOE	30/09/2017	05/10/2017	19/01/2018
Querétaro	Revisión del primer informe, emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación	INE	DEOE	04/11/2017	04/01/2017	19/01/2018
Querétaro	Resolución sobre convenio de coalición para diputados	OPL	CG	11/09/2017	23/01/2018	08/02/2018
Querétaro	Resolución sobre convenio de coalición para ayuntamientos	OPL	CG	11/09/2017	23/01/2018	08/02/2018
Quintana Roo	Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL	INE	DEOE	20/09/2017	25/09/2017	21/11/2017
Quintana Roo	Intercambio de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE	INE/OPL	VEL/OPL	30/10/2017	25/11/2017	12/12/2017
Quintana Roo	Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y	INE	DEOE	20/09/2017	25/09/2017	21/11/2017

Entidad	Actividad	INE/OPL	UR	Plazo programado		Fecha real de término
				Inicio	Término	
	especificaciones técnicas, presentadas por el OPL					
Quintana Roo	Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas.	INE	DEOE	30/09/2017	05/10/2017	20/12/2017
San Luis Potosí	Emisión de la convocatoria para los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales	INE/OPL	CG	08/08/2017	08/09/2017	22/09/2017
San Luis Potosí	Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, tanto para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero como para la votación en territorio nacional, en medios impresos y electrónicos	OPL	CG	10/09/2017	16/09/2017	18/09/2017
San Luis Potosí	Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL	INE	DEOE	20/09/2017	25/09/2017	23/11/2017
San Luis Potosí	En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral	OPL	CG	25/09/2017	30/09/2017	27/12/2017

Entidad	Actividad	INE/OPL	UR	Plazo programado		Fecha real de término
				Inicio	Término	
San Luis Potosí	Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas	INE	DEOE	30/09/2017	05/10/2017	27/12/2017
Sinaloa	Emisión de la convocatoria para los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales	INE/OPL	CG	08/08/2017	08/09/2017	31/10/2017
Sinaloa	Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL	INE	DEOE	20/09/2017	25/09/2017	01/12/2017
Sinaloa	Resolución sobre la procedencia de manifestaciones de intención de candidatos independientes	OPL	CD Y CM	07/01/2018	07/01/2018	09/01/2018
Sinaloa	Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas	INE	DEOE	30/09/2017	05/10/2017	19/01/2018
Sinaloa	Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de la documentación y material electoral	OPL	CG	06/10/2017	31/12/2017	30/01/2018
Sinaloa	En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral	OPL	CG	25/09/2017	30/09/2017	08/12/2017

Entidad	Actividad	INE/OPL	UR	Plazo programado		Fecha real de término
				Inicio	Término	
Sinaloa	Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de la documentación y material electoral	OPL	CG	06/10/2017	31/12/2017	30/01/2018
Sonora	Emisión de la convocatoria para los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales	INE/OPL	CG	08/08/2017	08/09/2017	13/10/2017
Sonora	Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL.	INE	DEOE	20/09/2017	25/09/2017	05/12/2017
Sonora	Revisión del primer informe, emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación	INE	DEOE	04/11/2017	04/01/2018	05/11/2017
Sonora	Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas	INE	DEOE	30/09/2017	05/10/2017	29/12/2017
Sonora	En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral	OPL	CG	25/09/2017	30/09/2017	08/12/2017
Sonora	Aprobación de topes de gastos de campaña	CG	OPL	01/01/2018	31/01/2018	01/02/2018
Tabasco	Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y	INE	DEOE	20/09/2017	25/09/2017	20/11/2017

Entidad	Actividad	INE/OPL	UR	Plazo programado		Fecha real de término
				Inicio	Término	
	materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL					
Tabasco	En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral	OPL	CG	25/09/2017	25/09/2017	08/12/2017
Tabasco	Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas	INE	DEOE	30/09/2017	05/10/2017	08/01/2018
Tabasco	Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de la documentación y material electoral	OPL	CG	06/10/2017	31/12/2017	08/01/2018
Tabasco	Revisión del primer informe, emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación	INE	DEOE	04/11/2017	04/01/2018	18/01/2018
Tamaulipas	Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL	INE	DEOE	20/09/2017	25/09/2017	09/11/2017
Tamaulipas	En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral	OPL	CG	25/09/2017	30/09/2017	08/12/2017

Entidad	Actividad	INE/OPL	UR	Plazo programado		Fecha real de término
				Inicio	Término	
Tamaulipas	Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas	INE	DEOE	30/09/2017	05/10/2017	14/12/2017
Tlaxcala	Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL	INE	DEOE	20/09/2017	25/09/2017	22/11/2017
Tlaxcala	En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral	OPL	CG	25/09/2017	30/09/2017	15/12/2017
Tlaxcala	Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas	INE	DEOE	30/09/2017	05/10/2017	15/12/2017
Tlaxcala	Revisión del primer informe, emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación	INE	DEOE	04/11/2017	04/01/2018	15/01/2018
Veracruz	Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL	INE	DEOE	20/09/2017	25/09/2017	10/11/2017

Entidad	Actividad	INE/OPL	UR	Plazo programado		Fecha real de término
				Inicio	Término	
Veracruz	En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral	OPL	CG	25/09/2017	30/09/2017	16/11/2017
Veracruz	Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas	INE	DEOE	30/09/2017	05/10/2017	15/12/2017
Veracruz	Revisión del primer informe, emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación	INE	DEOE	04/11/2017	04/01/2018	11/01/2018
Yucatán	Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL	INE	DEOE	25/09/2017	30/09/2017	16/11/2017
Yucatán	En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral	OPL	CG	25/09/2017	30/09/2017	01/12/2017
Yucatán	Revisión del primer informe, emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación	INE	DEOE	04/11/2017	04/01/2018	16/01/2018

Entidad	Actividad	INE/OPL	UR	Plazo programado		Fecha real de término
				Inicio	Término	
Yucatán	Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas	INE	DEOE	30/09/2017	02/10/2017	02/02/2018
Zacatecas	Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, tanto para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero como para la votación en territorio nacional, en medios impresos y electrónicos	OPL	CG	10/09/2017	16/09/2017	26/09/2017
Zacatecas	Intercambio de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE	INE/OPL	VEL/OPL	30/10/2017	25/11/2017	29/11/2017
Zacatecas	Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL	INE	DEOE	20/09/2017	25/09/2017	30/11/2017
Zacatecas	En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral	OPL	CG	25/09/2017	30/09/2017	04/12/2017
Zacatecas	Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas	INE	DEOE	30/09/2017	05/10/2017	19/12/2017

Entidad	Actividad	INE/OPL	UR	Plazo programado		Fecha real de término
				Inicio	Término	
Zacatecas	Los partidos políticos deberán informar al Consejo General el método de selección interna de candidatos	OPL	CG	13/12/2017	16/12/2017	18/12/2017
