



Segundo Informe Parcial

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2023-2024

Noviembre 2023

Índice

Glosario2

Introducción	3
1. Análisis cuantitativo y cualitativo.....	4
1.1 Actividades concluidas	5
1.2 Actividades en ejecución	6
1.2.1 Actividades en ejecución, en tiempo	7
1.2.2 Actividades en ejecución desfasadas	8
1.2.3 Actividades en riesgo.....	10
1.3 Actividades por iniciar y por concluir	10
1.4 Actividades que generan acuerdos o que dependen de aprobación de órganos desconcentrados	11
1.5 Estrategia de control de cambios	11
Conclusiones	13

Glosa

CG / Consejo General	Consejo General del Instituto Nacional Electoral
CAE	Capacitador Asistente Electoral
CAI	Coordinación de Asuntos Internacionales
CCOE	Comisión de Capacitación y Organización Electoral
CNCS	Coordinación Nacional de Comunicación Social
DEA	Dirección Ejecutiva de Administración
DECEyEC	Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
DEOE	Dirección Ejecutiva de Organización Electoral
DEPPP	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos
DERFE	Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores
DESPEN	Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional
DJ	Dirección Jurídica
Instituto/INE	Instituto Nacional Electoral
Junta/JGE	Junta General Ejecutiva
LGIFE	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
Metodología de Seguimiento	Metodología para el Seguimiento al Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2023-2024
OPL	Organismo(s) Público(s) Local(es)
PlyCPEF 2023 - 2024	Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2023-2024
RE	Reglamento de Elecciones
SE	Supervisor Electoral
UR	Unidades Responsables: Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas del INE
UTCE	Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral
UTF	Unidad Técnica de Fiscalización
UTIGyND	Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación
UTSI	Unidad Técnica de Servicios de Informática

UTTyPDP

Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales

Introducción

El 20 de julio de 2023, previo al inicio del Proceso Electoral Federal 2023-2024, el Consejo General, mediante Acuerdo INE/CG441/2023 aprobó el PlyCPEF 2023-2024 a propuesta de la Junta.

En cumplimiento al punto segundo del acuerdo referido, el 18 de septiembre la DEOE presentó ante las y los integrantes de la CCOE la Metodología de Seguimiento, que permitirá llevar el control y seguimiento de las actividades, así como la presentación de los informes correspondientes ante el Consejo General.

En dicho documento se establece que la DEOE elaborará informes mensuales, con las actividades que forman parte del PlyCPEF 2023-2024, detallando el estatus en el que se encuentran: concluidas, en ejecución (en tiempo, desfasadas y en riesgo), así como las actividades que están próximas a concluir y las que están por iniciar, para su presentación a los integrantes de la CCOE.

La fuente de información es la reportada por las UR en el aplicativo de seguimiento en forma semanal, de acuerdo con sus propias valoraciones. Este informe da cuenta del periodo del 07 de octubre al 10 de noviembre de 2023.

De conformidad con lo establecido en la Metodología de Seguimiento, el Informe se actualizará al corte más próximo a la sesión de CG en que se presentará.

Segundo informe parcial del Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2023-2024. Actividades Correspondientes al periodo del 07 de octubre al 10 de noviembre de 2023.


1. Análisis cuantitativo y cualitativo

El PlyCPEF 2023-2024 fue aprobado por CG con un total de 612 actividades, al periodo que se reporta, fueron procedentes dos solicitudes de desincorporación, por lo que, a la fecha de corte del presente documento, el PlyCPEF lo integran un total de 610 actividades.

Al periodo, se tiene el siguiente avance general:

- 90 (14.75%) actividades están concluidas, 134 (21.97%) actividades están en ejecución y 386 (63.28%) actividades no han iniciado (Gráfica 1).

Gráfica 1
Distribución relativa y absoluta del avance general de actividades del PlyCPEF 2023-2024

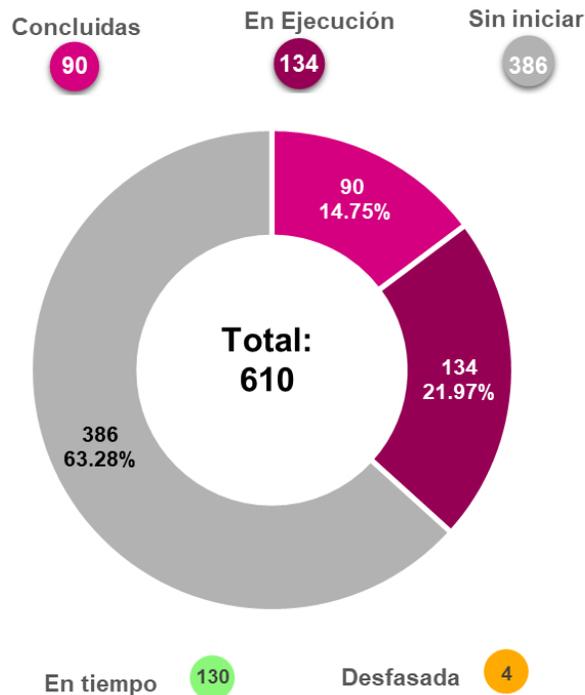


1.1 Actividades concluidas

De las 610 actividades se ha concluido un acumulado de 90 actividades, lo que representa 14.75% del total de actividades programadas.

Dentro del periodo que se reporta concluyeron 43 actividades. Las UR con actividades concluidas en el periodo son: UTSI con 21 (48.84%), DECEYEC con nueve (20.93%), DEOE con cinco (11.63%), DEPPP con cinco (11.63%) y DERFE con tres (6.98%). En la Gráfica 2 se muestra el avance general de actividades concluidas y, proporcionalmente, las concluidas en el periodo de reporte por UR. El detalle de las actividades concluidas se muestra en el Anexo 1.


Gráfica 2
Actividades concluidas, avance general y en el periodo de reporte por UR del PlyCPEF 2023-2024

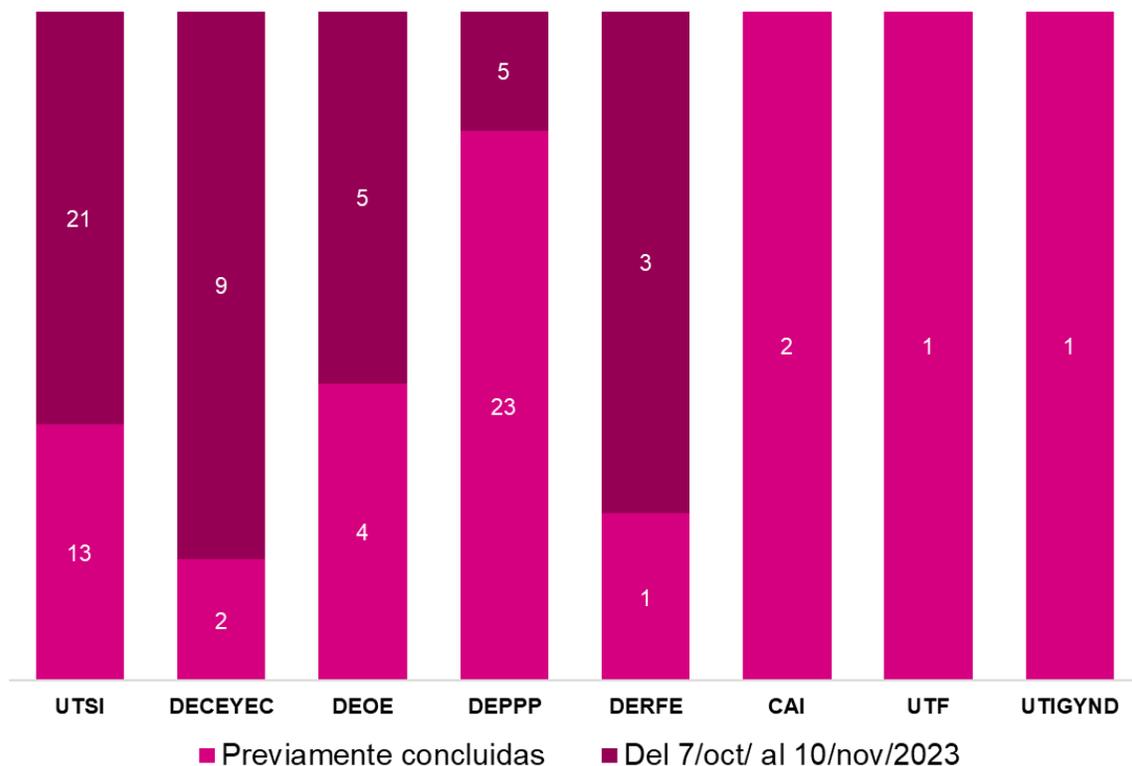

1.2 Actividades en ejecución

Al momento se encuentran en ejecución 134 actividades. El número de actividades en ejecución por UR se muestran en la Gráfica 3, donde destacan con mayor número de actividades en este estatus, la DECEYEC con 24 (17.91%), la DEOE con 24 (17.91%) y la DERFE con 21 (15.67%).


Gráfica 3
 Total de actividades en ejecución por UR del PlyCPEF 2023-2024

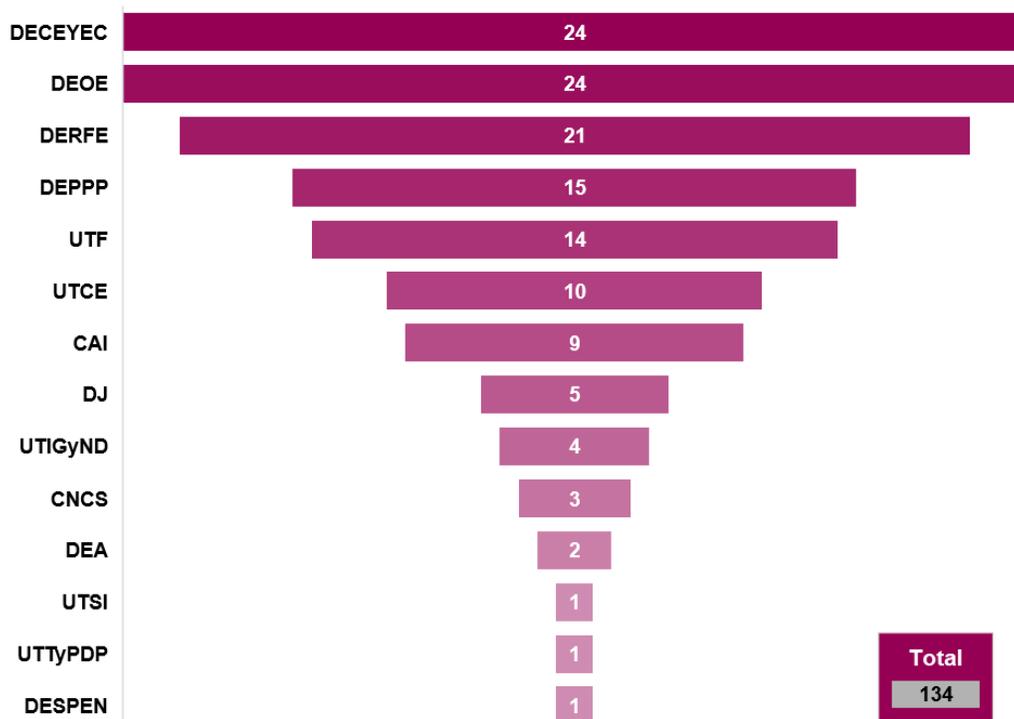

1.2.1 Actividades en ejecución, en tiempo

Por su parte, de las 134 actividades en ejecución, 130 (97.01%) se ejecutan conforme a las fechas establecidas, el desagregado por cada UR se muestra en la Gráfica 4.


Gráfica 4
Distribución absoluta del total de actividades en ejecución por UR del PlyCPEF 2023-2024

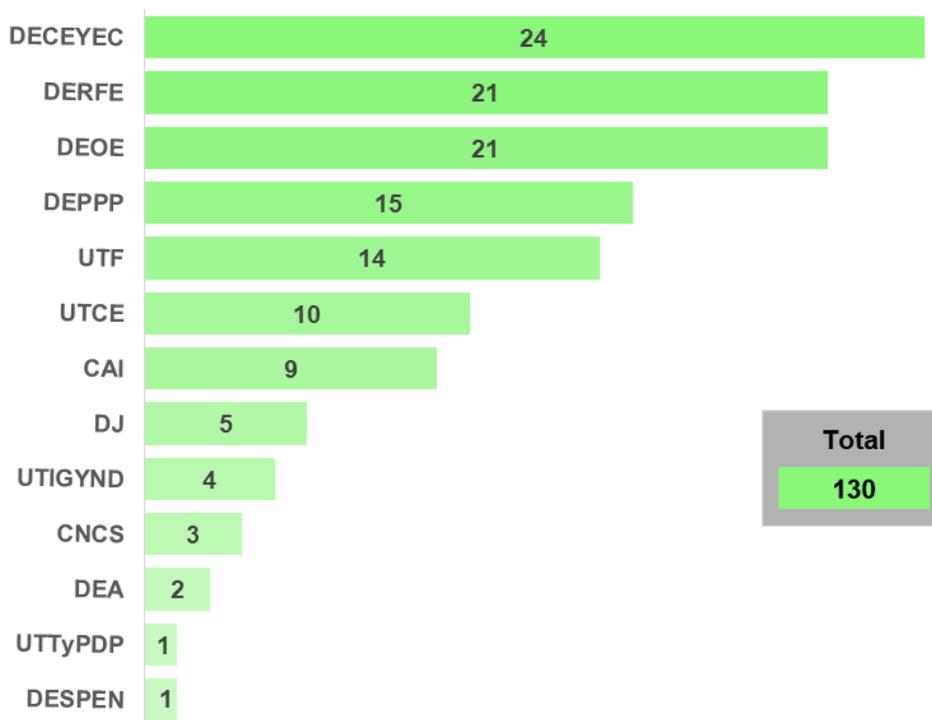

1.2.2 Actividades en ejecución desfasadas

De las 134 actividades que se encuentran en ejecución, 4 (2.99%) se encuentran con estatus de desfasadas respecto al periodo programado (Gráfica 5).

Gráfica 5
Distribución absoluta del total de actividades desfasadas por UR del PlyCPEF 2023-2024

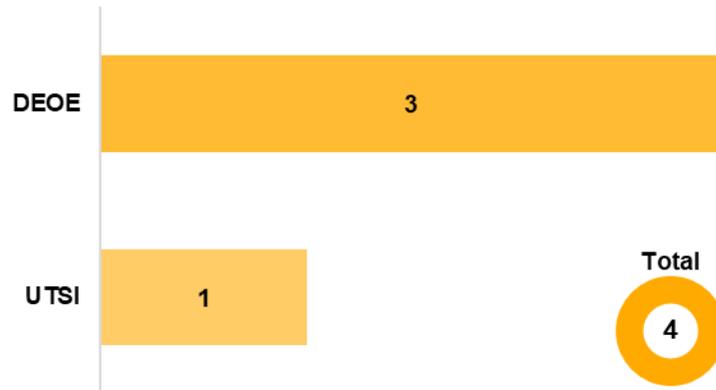

De las actividades que se encuentran con desfase, en el Cuadro 1 se describen las causas que lo originan, y en los casos en que sea procedente, las medidas adoptadas para llevarlas a término.

Cuadro 1
Total de actividades desfasadas por UR del PlyCPEF 2023-2024

DEOE	
Actividad	Descripción desfase
Elaborar y someter el proyecto de Acuerdo sobre la instalación de oficinas municipales al Consejo General a propuesta de la Junta General Ejecutiva.	El 06 de noviembre de 2023 se aprobó en la sesión de JGE el Acuerdo por el cual se propone al CG del Instituto el establecimiento de 50 oficinas municipales distribuidas en 19 entidades federativas y 36 distritos electorales federales, para el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024 y, en su caso, para las elecciones extraordinarias que se deriven del mismo. Por lo que su presentación se tiene prevista en la próxima sesión que celebre el CG.
Dar seguimiento a las gestiones que realicen las juntas locales, para la firma de Convenios de Colaboración con las autoridades escolares de la entidad que corresponda.	Todas las JLE revisaron el modelo de Convenio propuesto por la DEOE; 29 informan haber establecido comunicación con la Autoridad Educativa o el Gobierno local, 18 indican haber llevado a cabo al menos 1 reunión para discutir el Convenio; en 13 entidades se reportan progresos en la gestión del convenio, quedando únicamente pendiente la firma. BCS. firma del Convenio 11/oct/2023; YUC. reporta que la firma del Convenio se llevará a cabo el día 22/nov/2023; GRO. reporta la continuación en las gestiones, se recibió el oficio CJ/938/2023 por parte de la Consejería Jurídica del estado, en respuesta a la solicitud de análisis y observaciones al proyecto Convenio Marco de apoyo, coordinación y colaboración que celebran el INE, el IEPC-GRO y el gobierno del estado; MOR. informó que la fecha tentativa de firma del Convenio marco con el Gobierno del Estado el 17/nov/2023; ZAC. VOEL reporta que la JLE se encuentra ajustando el modelo de Convenio, y aún no se define fecha para una reunión formal con la Autoridad Educativa del estado para revisar el proyecto; AGS. reporta la intención de firmar un Convenio marco con el Gobierno del estado, pendiente la definición del instrumento o convenio específico en materia de préstamo de planteles educativos; EDOMEX reporta la realización de una reunión con la Gobernadora y la Autoridad Educativa del estado, además de la remisión del proyecto de Convenio para su revisión; COAH. puede presentarse retraso en las gestiones, derivado del cambio de Gobierno
Supervisar la producción de los materiales electorales	Respecto de la adquisición de los sellos ""X"", la empresa adjudicada Dirección Sport, S.A. de C.V, notificó que el 10 de diciembre iniciará con la producción del modelo de sello ""X"", toda vez que, se otorgó el visto bueno para inicio de producción, con base en el análisis de las muestras de materia prima, así como de la propuesta de molde e impresiones 3D del diseño del sello ""X"".

UTSI	
Actividad	Descripción desfase
Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR): Liberar (Producción).	El área usuaria sigue probando el flujo completo para el registro de precandidatos y candidatos, en cuanto a las alertas que debe emitir el SNR cuando la persona a registrarse como precandidato o candidato está en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (RNPS), en cuanto se tenga el visto bueno se procederá a su liberación.

1.2.3 Actividades en riesgo



En el periodo que se informa, **ninguna** actividad fue reportada con riesgos que afecten potencialmente su ejecución o cumplimiento.

1.3 Actividades por iniciar y por concluir

De las 610 actividades que conforman el PlyCPEF 2023-2024, 14 actividades se encuentran próximas a iniciar su ejecución en el periodo del 11 de noviembre a la fecha horizonte del 30 de noviembre, lo que representa un 2.30% respecto al total (Cuadro 2). El detalle puede consultarse en el Anexo 2.

Cuadro 2
Distribución de Actividades por iniciar su ejecución por UR

UR	TOTAL	DECEYEC	DEPPP	DERFE	UTSI
Actividades por concluir	14	3	8	1	2

De las actividades que se tienen previstas concluyan, de acuerdo con la fecha de término que la UR estableció son 12, las cuales se distribuyen de la siguiente forma (Cuadro 3). Se agrega el detalle en el Anexo 3.

Cuadro 3
Distribución de Actividades por concluir su ejecución por UR

Unidad Responsable	TOTAL	DECEYEC	DEOE	DEPPP	DERFE	UTSI
Actividades por concluir	12	5	1	1	3	2

1.4 Actividades que generan acuerdos o que dependen de aprobación de órganos desconcentrados

Se tienen programadas 57 actividades para aprobación de un acuerdo. Derivado de ello, al momento se cuenta con la aprobación de 32 (56.14%) acuerdos acumulados (Cuadro 4). Durante el periodo que se reporta se aprobaron 11 acuerdos de los cuales siete fueron aprobados por CG, tres por la CCOE y uno por el Comité de Radio y Televisión. El listado de los acuerdos aprobados con las URL para su consulta, se ubican en el Anexo 4.

Cuadro 4
Distribución del número de acuerdos aprobados por UR PlyCPEF 2023-2024

UR	TOTAL	CAI	DECEYEC	DEOE	DEPPP	UTF	DERFE	UTSI
Acuerdos Aprobados	32	1	1	7	14	1	4	4

1.5 Estrategia de control de cambios

De acuerdo con la Metodología de seguimiento, las UR tienen la posibilidad de gestionar los procesos de cambio, incorporación y desincorporación en función de las necesidades que imponga el proceso. En tal sentido, durante el periodo analizado se desincorporaron dos actividades: por parte de la DERFE (1) y la DEOE (1), las cuales se detallan a continuación (Cuadro 5):

Cuadro 5
Actividades Desincorporadas Del PlyCPEF 2023 – 2024

ID	Actividad	UR	Dictamen	Justificación
558	Entregar la LNEVA definitiva para escrutinio y cómputo.	DERFE	Procedente	<p>La actividad fue registrada retomando términos de lineamientos previos que sí consideraban en forma específica la impresión de la LNEVA para escrutinio y cómputo.</p> <p>La desincorporación fue solicitada una vez que fue aprobado el acuerdo INE/CG436/2023 por el que se aprueban los Lineamientos para la organización del Voto Anticipado en el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024 en sus nuevos términos.</p> <p>Por lo anterior, procede la solicitud al estar sustentada en el acuerdo.</p>
408	Presentar el informe a la Secretaría Ejecutiva, la Comisión de Capacitación y Organización Electoral (CCOE) y, al CG sobre los escenarios previstos por los consejos distritales y el estimado de recursos que será requerido.	DEOE	Procedente	<p>Procede la solicitud de desincorporación debido a que la actividad 451 se modificó en términos de redacción y el contenido se ha duplicado con la actividad referida y con base en los lineamientos aprobados por la CCOE.</p>

Conclusiones

En el lapso del presente informe, que contempla el periodo del 07 de octubre al 10 de noviembre de 2023, se analizaron 224 actividades, que equivalen al (36.72%) respecto a las 610 actividades que integran el PlyCPEF 2023-2024.

De las 224 actividades analizadas, 134 se encuentran en ejecución y 90 han concluido, de estas últimas, 43 corresponden al periodo reportado. 130 actividades se desarrollan dentro del periodo establecido y cuatro fueron reportadas con desfase por las UR.

En el periodo comprendido, las UR no reportaron actividades que presenten riesgo en su cumplimiento.

Durante el periodo que se reporta, fueron aprobados 11 acuerdos, por lo que a la fecha de corte se acumulan 32 acuerdos aprobados de los 57 que forman parte de las actividades del PlyCPEF 2023-2024.

Finalmente, para el periodo del 11 al 30 de noviembre de 2023, se tiene previsto que den inicio 14 actividades y 12 actividades estarán concluyendo dentro de este periodo.

Anexo 1. Relación de actividades concluidas

ID	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Entregable	Valoración de la UR
15	Fortalecimiento de la Educación Cívica y Participación Ciudadana	Evaluación de Estrategias Campañas Institucionales, Educación Cívica y Participación Ciudadana	de Socializar la propuesta del Programa de Promoción de la Participación Ciudadana en el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024 a Órganos Desconcentrados y Comité de Planeación Institucional	DECEYE C	Informe	Se socializó la propuesta del PPPCPEC 23-24 a los órganos desconcentrados. A través de las personas titulares de las Vocalías de Capacitación Electoral y Educación Cívica de las JLE se recibieron observaciones, mismas que se atendieron y se impactaron. En el mismo sentido, el 20 de octubre se socializó la propuesta del PPPCPEC 23-24 al Comité de Planeación Institucional, el cual emitió observaciones al Programa, mismas que se atendieron y se impactaron.
17	Voto de las Personas en Prisión Preventiva	Lineamientos y Modelo de operación del Voto de las Personas en Prisión Preventiva	Someter a aprobación de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral el Lineamiento y Modelo Operación del Voto de las Personas en Prisión Preventiva	DEOE	Proyecto Acuerdo	de En la sesión extraordinaria de la CCOE celebrada el 27 de octubre de 2023, se aprobaron los anteproyectos de Acuerdo, Lineamientos, Modelo de Operación y documentación electoral del VPPP.
75	Acreditación de las y los representantes generales y ante mesas directivas de casilla de los partidos políticos y candidaturas independientes.	Seguimiento a través del Sistema correspondiente, de los registros de solicitudes, sustituciones y acreditación de las y los representantes generales y ante mesas directivas de casilla de los partidos políticos y candidaturas independientes.	Elaborar y someter a consideración del Consejo General el Modelo para la operación del Sistema de registro de solicitudes, sustituciones y acreditación de las y los representantes generales y ante MDC de los PP y CI	DEOE	Proyecto Acuerdo	de El día 12 de octubre del presente año, se puso a consideración del CG el Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el modelo para la operación del sistema de registro de solicitudes, sustituciones y acreditación de representaciones generales y ante mesas directivas de casilla de los partidos políticos y candidaturas independientes para el proceso electoral concurrente 2023-2024 y, en su caso, para los procesos extraordinarios que deriven del mismo; así como la modificación del anexo 9.2 del RE, mismo que fue aprobado por unanimidad. Derivado de lo anterior, se da por concluida la actividad.
79	Preparación y ejecución del cómputo de las Elecciones	Coordinación y seguimiento a la celebración de las sesiones de cómputos distritales	Elaborar los lineamientos para la sesión especial de cómputos distritales del Proceso Electoral 2023-2024.	DEOE	Lineamientos	En sesión extraordinaria del CG del Instituto celebrada el 3 de noviembre de 2023, se aprobaron los Lineamientos para la preparación y desarrollo de los cómputos distritales, de entidad federativa y de circunscripción del proceso electoral federal 2023 -2024.

ID	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Entregable	Valoración de la UR
84	Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Diseño de la Estrategia de Integración de Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Elaborar los contenidos de los materiales didácticos y de apoyo dirigidos a SE y CAE de la Primera Etapa de Capacitación.	DECEYE C	Archivo electrónico	Los materiales didácticos y de apoyo dirigidos a SE y CAE para la 1ª etapa de capacitación, fueron aprobados por la CCOE en la 3a sesión extraordinaria llevada a cabo el 27 de octubre de 2023, y son los siguientes: <ul style="list-style-type: none"> • Guía para la y el Supervisor Electoral. • Guía para la y el Capacitador-Asistente Electoral. • Rotafolio de la Jornada Electoral. • Carta-notificación. • Hoja de datos para la capacitación a las y los ciudadanos sorteados. • Información básica para las y los ciudadanos sorteados.
86	Fortalecimiento de la Educación Cívica y Participación Ciudadana	Evaluación de Estrategias de Campañas Institucionales, Educación Cívica y Participación Ciudadana	Presentar el Programa de Promoción de la Participación Ciudadana en el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024 a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral.	DECEYE C	Documento	El 27 de octubre de 2023 en la tercera Sesión Extraordinaria de la CCOE, se presentó el Programa de Promoción de la Participación Ciudadana en el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024.
92	Voto de las Personas en Prisión Preventiva	Lineamientos y Modelo de operación del Voto de las Personas en Prisión Preventiva	Someter a aprobación del Consejo General, el proyecto de acuerdo del Lineamiento y Modelo Operación del Voto de las Personas en Prisión Preventiva	DEOE	Acuerdo	En sesión extraordinaria del CG del Instituto celebrada el 3 de noviembre de 2023, se aprobaron los Lineamientos y el Modelo de Operación del Voto de las Personas en Prisión Preventiva.
100	Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Diseño de la Estrategia de Integración de Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Elaborar los contenidos de la Guía de estudio para aspirantes a SE y CAE	DECEYE C	Archivo electrónico	Se concluyó con la elaboración de los contenidos de la Guía de estudio para aspirantes a SE y CAE.
128	Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Diseño de la Estrategia de Integración de Mesas Receptoras de Votación y	Revisar y validar el material didáctico para la capacitación a personas Observadoras Electorales	DECEYE C	Archivo electrónico	Se concluyó con la revisión de las Guías elaboradas por los OPL, asimismo se otorgó el Visto Bueno mediante oficio a todas las entidades.

ID	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Entregable	Valoración de la UR
		Capacitación Electoral				
141	Administración de los Tiempos del Estado en Radio y Televisión en Periodo Ordinario	Asignación de los Tiempos en Radio y Televisión y Gestión de Transmisiones	Elaborar y someter a consideración del Comité de Radio y Televisión el acuerdo por el que se determine el alcance y modalidad del monitoreo para la verificación del cumplimiento de las pautas de transmisión, incluida la multiprogramación y su retransmisión	DEPPP	Acuerdo	Se aprobó en la 10a. Sesión Ordinaria de Comité de Radio y Televisión, cebrada el 27 de octubre de 2023. Se le asignó la clave INE/ACRT/44/2023
147	Operación del PREP	Logística Suministros Materiales	y de PREP Federal 2023-2024: Aprobación por la Comisión de Capacitación y Organización Electoral para someter a consideración del Consejo General el acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y los Centros de Captura y Verificación del PREP	UTSI	Acuerdo	El acuerdo fue aprobado en la Comisión de Capacitación y Organización Electoral.
148	Operación del PREP	Logística Suministros Materiales	y de PREP Federal 2023-2024: Aprobación por la Comisión de Capacitación y Organización Electoral para someter a consideración del Consejo General el acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo y	UTSI	Acuerdo	El acuerdo fue aprobado en la Comisión de Capacitación y Organización Electoral.

ID	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Entregable	Valoración de la UR
			consideraciones generales del PREP			
150	Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Diseño de la Estrategia de Integración de Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	la Coordinar la elaboración de la propuesta de Listado de Secciones de Estrategias Diferenciadas y Secciones Ordinarias con Excepción del Ruta de Visita en los distritos que lo requieran	DECEYE C	Otro	Las Vocalías de Capacitación Electoral y Educación Cívica de las 300 Juntas Distritales Ejecutivas del país, concluyeron la elaboración de los Listados de propuestas de Secciones con Estrategias Diferenciadas y Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita.
151	Fortalecimiento de la Educación Cívica y Participación Ciudadana	Evaluación de Estrategias de Campañas Institucionales, Educación Cívica y Participación Ciudadana	de Presentar el Programa de Promoción de la Participación Ciudadana en el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024 a Consejo General	DECEYE C	Informe	El 3 de noviembre de 2023 en Sesión Extraordinaria del CG se presentó el Proyecto de Acuerdo del CG del Instituto por el que se aprueba el Programa de Promoción de la Participación Ciudadana para el Proceso Electoral Concurrente 2023 -2024.
158	Administración de los Tiempos del Estado en Radio y Televisión en Periodo Ordinario	Asignación de los Tiempos en Materia Electoral en Radio y Televisión y Gestión de Transmisiones	Realizar pruebas de funcionamiento del Sistema de Monitoreo de Noticiarios y Portal del Monitoreo con los Centros de Verificación y Monitoreo y la Institución de Educación Superior seleccionada para realizar el monitoreo, previo al periodo de precampaña	DEPPP	Reporte	Se concluyó la prueba de funcionamiento del Sistema de Monitoreo de Noticiarios y Portal del Monitoreo con personal del Instituto y la Institución de Educación Superior 25 de octubre.
159	Administración de los Tiempos del Estado en Radio y Televisión en Periodo Ordinario	Asignación de los Tiempos en Materia Electoral en Radio y Televisión y Gestión de Transmisiones	Llevar a cabo la capacitación sobre el uso del Sistema de Monitoreo de Noticiarios con la Institución de Educación Superior y hacer entrega de la guía de usuario del mismo, previo al periodo de precampaña	DEPPP	Reporte	Se realizó la capacitación sobre el sistema y la entrega de las guías de uso del mismo.

ID	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Entregable	Valoración de la UR
162	Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Diseño de la Estrategia de Integración de Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	la Dar seguimiento a la recepción de material didáctico dirigido a la capacitación a personas Observadoras Electorales entregado por el OPL	DECEYE C	Archivo electrónico	Se remitieron materiales para capacitar a las personas interesadas en participar como Observador/a Electoral mediante la circular INE/DECEYEC/030/2023.
163	Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Diseño de la Estrategia de Integración de Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	la Dar seguimiento de la distribución de material didáctico para capacitar a Personas Observadoras Electorales	DECEYE C	Otro	Se remitieron materiales a las JLE mediante circular INE/DECEYEC/030/2023.
166	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	Sistema de Mecanismos de Garantía de Calidad de la aplicación de los procedimientos de reclutamiento, selección y contratación de las y los SE y CAE: Verificar y validar los Componentes (Pruebas de aceptación).	UTSI	Oficio / Circular	Se liberó para el área requirente el 12 de octubre, para su inicio de operación el 5 de noviembre.
167	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	Sistema de Ubicación de Casillas: Verificar y validar los Componentes (Pruebas de aceptación).	UTSI	Oficio / Circular	Se enviaron los insumos al área requirente para realizar las pruebas de aceptación del 1 al 7 de noviembre de 2023.
179	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas: Liberar (Producción).	UTSI	Oficio / Circular	El sistema se liberó el 1 de octubre de acuerdo con las fechas indicadas en el oficio INE/DECEYEC/DCE/0385/2023.
180	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita: Verificar y validar los Componentes (Pruebas de aceptación).	UTSI	Oficio / Circular	EL sistema se liberó para el área requirente el 8 de septiembre, para su inicio de operación el 1 de octubre, de acuerdo con las fechas del oficio INE/DECEYEC/DCE/0385/2023

ID	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Entregable	Valoración de la UR
181	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	Sistema de Reclutamiento y Seguimiento a Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores Asistentes: Liberar (Producción).	UTSI	Oficio / Circular	El sistema se liberó a producción el 16 de octubre, de acuerdo con las fechas indicadas en el oficio INE/DECEyEC/DCE/0385/2023
182	Administración de los Tiempos del Estado en Radio y Televisión en Periodo Ordinario	Asignación de los Tiempos en Materia Electoral en Radio y Televisión y Gestión de Transmisiones	Firmar el convenio con la Institución de Educación Superior seleccionada que realizará el Monitoreo de Noticiarios apoyado en el Sistema de Monitoreo de Noticiarios	DEPPP	Convenio	Se suscribió el Convenio con la Universidad Autónoma de Nuevo León el 17 de octubre de 2023 en la ciudad de Monterrey
183	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	Sistema de Reclutamiento en Línea: Verificar y validar los Componentes (Pruebas de aceptación).	UTSI	Oficio / Circular	Los simulacros se realizaron el 9 y 10 de octubre para iniciar su operación el 16 de octubre.
184	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR): Verificar y validar los Componentes (Pruebas de aceptación).	UTSI	Oficio / Circular	Las pruebas de aceptación se realizarán del 1 al 6 de noviembre de 2023, una vez terminadas y con el visto bueno del área requirente se procederá a iniciar operación.
185	Administración de los Tiempos del Estado en Radio y Televisión en Periodo Ordinario	Asignación de los Tiempos en Materia Electoral en Radio y Televisión y Gestión de Transmisiones	Liberar el Sistema de Monitoreo de Noticiarios	DEPPP	Reporte	Se liberó el sistema de monitoreo de noticiarios
187	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	Sistema de Observadores Electorales: Liberar (Producción).	UTSI	Oficio / Circular	El sistema se liberó para operación de acuerdo con la fecha indicada en la circular INE / DEOE-DECEYEC-UTF-UTSI / 001 / 2023.

ID	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Entregable	Valoración de la UR
190	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	Sistema de Sesiones de Consejo: Liberar (Producción).	UTSI	Oficio / Circular	El sistema inició operación de acuerdo a la fecha indicada en la circular INE / DEOE-DECEYEC-UTF-UTSI / 001 / 2023.
192	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	Sistema de Reclutamiento en Línea: Liberar (Producción).	UTSI	Oficio / Circular	El sistema inició operación el 16 de octubre, de acuerdo con la fecha indicada en la Circular INE/DECEYEC-UTSI/011/2023
193	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	Sistema de Mecanismos de Garantía de Calidad de la aplicación de los procedimientos de reclutamiento, selección y contratación de las y los SE y CAE: Liberar (Producción).	UTSI	Oficio / Circular	El sistema entró en operación el 5 de noviembre, acorde a la fecha indicada en circular INE/DECEYEC-UTSI/012/2023.
195	Conteos Rápidos Institucionales	Ejecución y Emisión de Resultados del Conteo Rápido	Elaborar y someter a consideración del CG el Proyecto de Acuerdo por el que se dispone la creación del Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos para los Procesos Electorales Federal y Locales 2023-2024.	DERFE	Acuerdo	El 26 de octubre de 2023, se aprobó el Acuerdo INE/CG588/2023, por el que se determina la realización del Conteo Rápido para las Elecciones Ordinarias de Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, Senadurías y Diputaciones Federales, Gobernatura en Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Jefatura de Gobierno en la Ciudad de México, a fin de conocer las tendencias de los resultados de la votación el día de la Jornada Electoral de los Procesos Electorales Federal y Locales 2023-2024; y, se aprueba la Creación e Integración del Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos 2023-2024. Actividad concluida antes de iniciar.

ID	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Entregable	Valoración de la UR
200	Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero	Capacitación Electoral Integración Mesas Escrutinio Cómputo MEC	Elaborar el proyecto de Acuerdo de la Junta General por el que se aprueben los elementos que integran el PEP (sobre voto e instructivo) que se enviará a la ciudadanía que eligió la modalidad postal.	DERFE	Acuerdo	El 26 de octubre de 2023, se aprobó el Acuerdo INE/CG589/2023, del diseño y el contenido de los elementos que conforman el Paquete Electoral Postal para el Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero en los Procesos Electorales Federal y Locales Concurrentes 2023-2024. Actividad concluida antes de iniciar.
204	Operación del PREP	Logística Suministros Materiales	y de PREP Federal 2023-2024: Aprobación por el Consejo General del acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y los Centros de Captura y Verificación del PREP	UTSI	Acuerdo	El 3 de noviembre se aprobó el acuerdo por parte del Consejo General.
205	Operación del PREP	Logística Suministros Materiales	y de PREP Federal 2023-2024: Aprobación por el Consejo General del acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo y consideraciones generales del PREP	UTSI	Acuerdo	El 3 de noviembre se aprobó el acuerdo por parte del Consejo General.
210	Integración y funcionamiento de los Consejos Locales y Distritales	Supervisión y seguimiento a la integración de los Órganos Desconcentrados temporales	y Dar seguimiento a sesión de instalación de los Consejos Locales.	DEOE	Informe	El 1 de noviembre de 2023 se celebraron las sesiones de instalación de los 32 Consejos Locales del INE del país, conforme al plazo establecido por el CG del Instituto en el Acuerdo INE/CG540/2023. Mediante informe ejecutivo sobre las sesiones de instalación de los Consejos Locales para el Proceso Electoral Federal 2023-2024, se dio cuenta al CG y a la Secretaría Ejecutiva del INE sobre la instalación de los órganos delegacionales temporales.

ID	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Entregable	Valoración de la UR
224	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña: Verificar y validar los Componentes (Pruebas de aceptación).	UTSI	Oficio / Circular	Las pruebas de aceptación para los módulos de Distribución y Temporalidad, Registro Contable y Administración se realizaron del 18 de septiembre al 6 de octubre, para Precampaña Ordinaria PEC 2023-2024.
228	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita: Liberar (Producción).	UTSI	Oficio / Circular	El sistema se liberó el 1 de octubre, acorde a la fecha indicada en la Circular INE / DECEYEC-UTSI / 009 / 2023
239	Conformación del Padrón Electoral y Credencialización	Emisión de Listas Nominales Electores	Elaborar y someter a consideración del CG el proyecto de Acuerdo para aprobar los Lineamientos para la conformación de la Lista Nominal del Electorado con Voto Anticipado.	DERFE	Acuerdo	El 28 de septiembre de 2023, se aprobó el Acuerdo INE/CG542/2023, por el que se aprueban los Lineamientos para la Conformación de la Lista Nominal del Electorado con Voto Anticipado para el Proceso Electoral Federal y los Procesos Electorales Locales Concurrentes 2023-2024. La actividad concluyó antes de su inicio.
250	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	Sistema de Administración de Dispositivos Móviles: Verificar y validar los Componentes (Pruebas de aceptación)	UTSI	Oficio / Circular	Las pruebas de aceptación se realizaron del 16 al 20 de octubre, sin incidentes mayores reportados.
251	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	Sistema de Administración de Dispositivos Móviles: Liberar (Producción).	UTSI	Oficio / Circular	El 3 de noviembre fueron liberadas en ambiente productivo las funcionalidades correspondientes al sprint 3 del Sistema de Administración de Dispositivos Móviles v3.1.
289	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña: Liberar (Producción).	UTSI	Oficio / Circular	La liberación a producción de Precampaña Ordinaria PEC 2023-2024 se realizó el 26 de octubre de 2023, para los módulos de Administración y Apoyo Ciudadano y/o precampaña.

ID	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Entregable	Valoración de la UR
383	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia: Verificar y validar los Componentes (Pruebas de aceptación).	UTSI	Oficio / Circular	Se liberó al área requirente para iniciar las primeras pruebas, en preparación de los simulacros que se llevará el 13 de diciembre de 2023.

Anexo 2. Relación de actividades por iniciar en el PlyCPEF 2023-2024

ID	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Fecha de Inicio
188	Administración de los Tiempos del Estado en Radio y Televisión en Periodo Ordinario	Asignación de los Tiempos en Materia Electoral en Radio y Televisión y Gestión de Transmisiones	Elaborar y enviar la lista de avisos de los materiales que ingresan en la orden de transmisión respectiva	DEPPP	13/11/2023
189	Administración de los Tiempos del Estado en Radio y Televisión en Periodo Ordinario	Asignación de los Tiempos en Materia Electoral en Radio y Televisión y Gestión de Transmisiones	Localizar instrucciones electrónicas de transmisión de promocionales y estrategias generadas por los actores políticos y autoridades electorales mediante el sistema electrónico	DEPPP	13/11/2023
201	Administración de los Tiempos del Estado en Radio y Televisión en Periodo Ordinario	Asignación de los Tiempos en Materia Electoral en Radio y Televisión y Gestión de Transmisiones	Asignar en las órdenes de transmisión (documento donde se precisa el material a transmitir), los materiales de los actores políticos traducidos a otras lenguas distintas al español	DEPPP	13/11/2023
202	Administración de los Tiempos del Estado en Radio y Televisión en Periodo Ordinario	Asignación de los Tiempos en Materia Electoral en Radio y Televisión y Gestión de Transmisiones	Clasificar el material traducido a idiomas diferentes al español en las entidades y etapas correspondientes en el sistema de electrónico.	DEPPP	13/11/2023
215	Registro de Plataformas Electorales, Coaliciones, Acuerdos de Participación y Candidaturas	Revisión del Cumplimiento de los Requisitos de Plataformas Electorales, Coaliciones o Acuerdos de Participación y Candidaturas	Recibir, revisar y analizar la documentación presentada por los Partidos Políticos que soliciten el registro de una Coalición, así como elaborar los Anteproyectos de Resolución respectivos	DEPPP	20/11/2023
216	Registro de Plataformas Electorales, Coaliciones, Acuerdos de Participación y Candidaturas	Revisión del Cumplimiento de los Requisitos de Plataformas Electorales, Coaliciones o Acuerdos de Participación y Candidaturas	Recibir, revisar y analizar, la documentación presentada por las Agrupaciones Políticas que soliciten el registro de un Acuerdo de Participación, así como elaborar los Proyectos de Resolución respectivos	DEPPP	20/11/2023

ID	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Fecha de Inicio
225	Administración de los Tiempos del Estado en Radio y Televisión en Periodo Ordinario	Asignación de los Tiempos en Materia Electoral en Radio y Televisión y Gestión de Transmisiones	Elaborar y publicar los informes de los resultados del monitoreo de noticieros durante el periodo de precampaña conforme a la metodología aprobada	DEPPP	12/11/2023
226	Administración de los Tiempos del Estado en Radio y Televisión en Periodo Ordinario	Asignación de los Tiempos en Materia Electoral en Radio y Televisión y Gestión de Transmisiones	Elaborar y publicar los Informes estatales de monitoreo en el portal de Informes de monitoreo	DEPPP	12/11/2023
227	Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Diseño de la Estrategia de Integración de Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Conformar ARE y ZORE (JDE)	DECEYEC	16/11/2023
229	Conformación del Padrón Electoral y Credencialización	Determinación de la Calidad y Validez del Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores	Elaborar y someter a consideración de la Comisión del Registro Federal de Electores y la Comisión Nacional de Vigilancia el Programa de Trabajo del Comité Técnico de Evaluación del Padrón Electoral 2023-2024.	DERFE	20/11/2023
230	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	Sistema Integral de Fiscalización – Campaña: Verificar y validar los Componentes (Pruebas de aceptación)	UTSI	22/11/2023
231	Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Diseño de la Estrategia de Integración de Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Recibir y reproducir el Examen de conocimientos, habilidades y actitudes en Juntas Locales Ejecutivas	DECEYEC	22/11/2023
232	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	Sistema de Ubicación de Casillas: Liberar (Producción).	UTSI	17/11/2023
233	Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Diseño de la Estrategia de Integración de Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Recibir y distribuir el Examen de conocimientos, habilidades y actitudes a Juntas Distritales Ejecutivas	DECEYEC	30/11/2023

Anexo 3. Relación de actividades por concluir en el PlyCPEF 2023-2024

ID	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Fecha de Término
85	Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Diseño de la Estrategia de Integración de Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Elaborar los modelos del material didáctico de cada uno de los OPL, dirigido a las y los funcionarios de casilla, para la incorporación de especificidades de las elecciones locales para la Segunda Etapa de Capacitación Electoral.	DECEYEC	30/11/2023
138	Asignación de Diputaciones y Senadurías por el Principio de Representación Proporcional	Ejecución del Mecanismo para la Aplicación de la Fórmula de Asignación de Diputaciones y Senadurías por el Principio de Representación Proporcional	Elaborar y someter a consideración del Consejo General el Proyecto de Acuerdo por el que se determina el mecanismo para la aplicación de la fórmula de asignación de Senadurías y Diputaciones por el principio de Representación Proporcional que correspondan a los Partidos Políticos Nacionales con base en los resultados que obtengan en la Jornada Electoral	DEPPP	30/11/2023
149	Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Diseño de la Estrategia de Integración de Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Coordinar reuniones regionales de preparación del Proceso Electoral 2023-2024 en materia de integración de Mesas Directivas de Casilla y capacitación electoral	DECEYEC	30/11/2023
153	Conformación del Padrón Electoral y Credencialización	Determinación de la Calidad y Validez del Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores	Dar seguimiento a las actividades del Comité Técnico de Evaluación del Padrón Electoral encaminadas a la definición de su programa de trabajo.	DERFE	30/11/2023
172	Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Diseño de la Estrategia de Integración de Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Difundir la convocatoria de SE y CAE (JDE)	DECEYEC	28/11/2023
173	Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Diseño de la Estrategia de Integración de Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Recibir las solicitudes y documentos de las y los aspirantes a SE y CAE (JDE)	DECEYEC	28/11/2023

ID	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Fecha de Término
175	Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Diseño de la Estrategia de Integración de Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Impartir la plática de inducción a las y los aspirantes a SE y CAE (JDE)	DECEYEC	28/11/2023
207	Integración y funcionamiento de los Consejos Locales y Distritales	Supervisión y seguimiento a la integración de los Órganos Desconcentrados temporales	Dar seguimiento a la designación de los consejeros Electorales que integren los Consejos Distritales del INE	DEOE	30/11/2023
213	Conformación del Padrón Electoral y Credencialización	Captación de Trámites	Solicitar la SSPE de las relaciones de PPP (Base de Datos nominativa e información biométrica) con corte al 31/12/2023	DERFE	11/11/2023
214	Conformación del Padrón Electoral y Credencialización	Captación de Trámites	Solicitar a la DO CECyRD de las relaciones de PVA (Base de Datos nominativa) con corte al 31/12/2023	DERFE	11/11/2023
230	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	Sistema Integral de Fiscalización – Campaña: Verificar y validar los Componentes (Pruebas de aceptación).	UTSI	22/11/2023
232	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	Sistema de Ubicación de Casillas: Liberar (Producción).	UTSI	17/11/2023

Anexo 4. Relación de acuerdos aprobados programados en el PlyCPEF 2023-2024

UR	Acuerdos	Fecha de aprobación	Núm. de Acuerdo	URL
DEOE	Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el modelo para la operación del sistema de registro de solicitudes, sustituciones y acreditación de representaciones generales y ante mesas directivas de casilla de los partidos políticos y candidaturas independientes para el proceso electoral concurrente 2023-2024 y, en su caso, para los procesos extraordinarios que deriven del mismo; así como la modificación del Anexo 9.2 del Reglamento de Elecciones. (CCOE)	12/10/2023	INE/CG560/2023	https://repositoriodocumental.ine.mx/mlui/handle/123456789/153537
DERFE	Acuerdo por el que se dispone la creación del Comité Técnico de Evaluación del Padrón Electoral para el Proceso Electoral Federal 2023-2024.	26/10/2023	INE/CG587/2023	https://repositoriodocumental.ine.mx/mlui/handle/123456789/154394
DERFE	Acuerdo por el que se dispone la creación del Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos para los Procesos Electorales Federal y Locales 2023-2024.	26/10/2023	INE/CG588/2023	https://repositoriodocumental.ine.mx/mlui/handle/123456789/154322
DERFE	Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban el diseño y el contenido de los elementos que conforman el paquete electoral postal para el voto de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero en los procesos electorales federal y locales concurrentes 2023-2024.	26/10/2023	INE/CG589/2023	https://repositoriodocumental.ine.mx/mlui/handle/123456789/154324
DEPPP	Acuerdo por el que se determine el alcance y modalidad del monitoreo que establece el inciso p) numeral 2 del art. 6 del Reglamento de Radio y Televisión.	27/10/2023	INE/ACRT/44/2023	https://repositoriodocumental.ine.mx/mlui/handle/123456789/154376
DEOE	Anteproyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los Lineamientos, el Modelo de Operación y la Documentación Electoral para la Organización del Voto de las Personas en Prisión Preventiva en el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024, en cumplimiento a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dictada en el expediente SUP-JDC 352/2018 y su acumulado.	27/10/2023	Aprobado en Sesión Extraordinaria del 27 de octubre de la CCOE.	

UR	Acuerdos	Fecha de aprobación	Núm. de Acuerdo	URL
UTSI	Anteproyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba: el Proceso Técnico Operativo y consideraciones generales para la operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares para el Proceso Electoral Federal 2023-2024.	27/10/2023	Aprobado en Sesión Extraordinaria del 27 de octubre de la CCOE.	
UTSI	Anteproyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se determina la ubicación y se instruye la instalación y habilitación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y de los Centros de Captura y Verificación del Programa de Resultados Electorales Preliminares para el Proceso Electoral Federal 2023- 2024 y, se instruye los Consejos Locales y Distritales a dar seguimiento y supervisión a las labores que se realicen en los Centros de Acopio y Transmisión de Datos.	27/10/2023	Aprobado en Sesión Extraordinaria del 27 de octubre de la CCOE.	
DEOE	Acuerdo por el que se aprueban los Lineamientos, el Modelo de Operación y la Documentación Electoral para la organización del VPPP en el PEC 2023 - 2024.	03/11/2023	INE/CG602/2023	https://repositoriodocumental.ine.mx/mlui/handle/123456789/155633
UTSI	Acuerdo por el que se aprueba: el Proceso Técnico Operativo y consideraciones generales para la operación del PREP para el PEF 2023 - 2024.	03/11/2023	INE/CG605/2023	https://repositoriodocumental.ine.mx/mlui/handle/123456789/155635
UTSI	Acuerdo por el que se determina la ubicación y se instruye la instalación y habilitación de los centros de acopio y transmisión de datos y de los centros de captura y verificación del PREP para el PEF 2023-2024.	03/11/2023	INE/CG606/2023	https://repositoriodocumental.ine.mx/mlui/handle/123456789/155636
