



Tercer Informe Parcial

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2023-2024

Diciembre 2023

Índice

Glosario	1
Introducción	3
1. Análisis cuantitativo y cualitativo	4
1.1 Actividades concluidas	5
1.2 Actividades en ejecución.....	6
1.2.1 Actividades en ejecución, en tiempo	7
1.2.2 Actividades en ejecución desfasadas	8
1.2.3 Actividades en riesgo.....	13
1.3 Actividades por iniciar y por concluir	13
1.4 Actividades que generan acuerdos o que dependen de aprobación de órganos desconcentrados	14
Conclusiones	15

Glosario

CG / Consejo General	Consejo General del Instituto Nacional Electoral
CAE	Capacitador/a Asistente Electoral
CAI	Coordinación de Asuntos Internacionales
CCOE	Comisión de Capacitación y Organización Electoral
CNCS	Coordinación Nacional de Comunicación Social
DEA	Dirección Ejecutiva de Administración
DECEyEC	Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
DEOE	Dirección Ejecutiva de Organización Electoral
DEPPP	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos
DERFE	Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores
DESPEN	Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional
DJ	Dirección Jurídica
Instituto/INE	Instituto Nacional Electoral
JD	Junta Distrital Ejecutiva
Junta/JGE	Junta General Ejecutiva
LGIPE	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
Metodología de Seguimiento	Metodología para el Seguimiento al Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2023-2024
OPL	Organismo(s) Público(s) Local(es)
PEF	Proceso Electoral Federal
PEL	Proceso Electoral Local
PlyCPEF 2023 - 2024	Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2023-2024
RE	Reglamento de Elecciones
SE	Supervisor/a Electoral
UR	Unidades Responsables: Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas del INE
UTCE	Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral

UTF	Unidad Técnica de Fiscalización
UTIGyND	Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación
UTSI	Unidad Técnica de Servicios de Informática
UTTyPDP	Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales

Introducción

El 20 de julio de 2023, previo al inicio del Proceso Electoral Federal 2023-2024, el Consejo General, mediante Acuerdo INE/CG441/2023 aprobó el PlyCPEF 2023-2024 a propuesta de la Junta.

En cumplimiento al punto segundo del acuerdo referido, el 18 de septiembre la DEOE presentó ante las y los integrantes de la CCOE la Metodología de Seguimiento, que permitirá llevar el control y seguimiento de las actividades, así como la presentación de los informes correspondientes ante el Consejo General.

En dicho documento se establece que la DEOE elaborará informes mensuales, con las actividades que forman parte del PlyCPEF 2023-2024, detallando el estatus en el que se encuentran: concluidas, en ejecución (en tiempo, desfasadas y en riesgo), así como las actividades que están próximas a concluir y las que están por iniciar, para su presentación a los integrantes de la CCOE.

La fuente de información es la reportada por cada una de las UR en el aplicativo de seguimiento en forma semanal, quienes emiten sus propias valoraciones. Este informe da cuenta del periodo del 11 de noviembre al 08 de diciembre de 2023.

De conformidad con lo establecido en la Metodología de Seguimiento, el Informe se actualizará al corte más próximo a la sesión de CG en que se presentará.

Tercer informe parcial del Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2023-2024. Actividades Correspondientes al periodo del 11 de noviembre al 08 de diciembre de 2023.


1. Análisis cuantitativo y cualitativo

El PlyCPEF 2023-2024 fue aprobado por CG con un total de 612 actividades, al periodo que se reporta, fueron procedentes dos solicitudes de desincorporación, por lo que, a la fecha de corte del presente documento, el PlyCPEF lo integran un total de 610 actividades.

Al periodo, se tiene el siguiente avance general:

- 108 (17.70%) actividades están concluidas, 142 (23.28%) actividades están en ejecución y 360 (59.02%) actividades no han iniciado (Gráfica 1).

Gráfica 1
Distribución relativa y absoluta del avance general de actividades del PlyCPEF 2023-2024

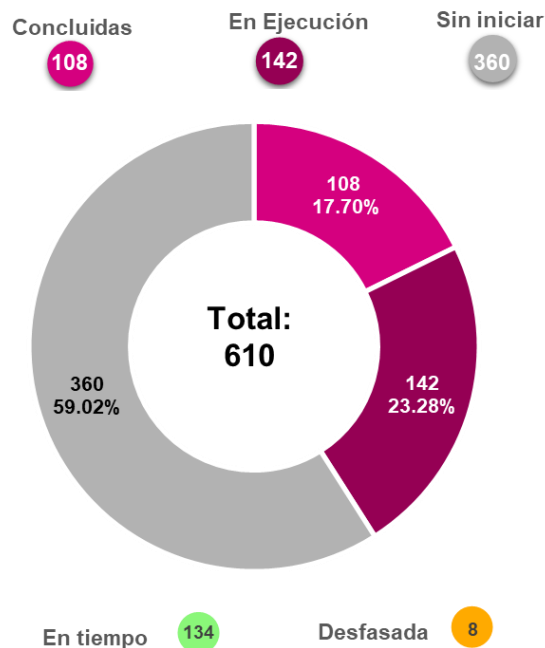


1.1 Actividades concluidas

De las 610 actividades se ha concluido un acumulado de 108 actividades, lo que representa 17.70% del total de actividades programadas.

Dentro del periodo que se reporta concluyeron 18 actividades. Por UR destacan la DECEYEC con nueve (50.00%), la DEOE con tres (16.67%), la UTSI y la DEPPP con dos (11.11%) cada una, los porcentajes se calculan respecto al total de actividades del periodo (Gráfica 2). El detalle de las actividades concluidas se muestra en el Anexo 1.


Gráfica 2
Distribución absoluta de actividades concluidas por UR del PlyCPEF 2023-2024

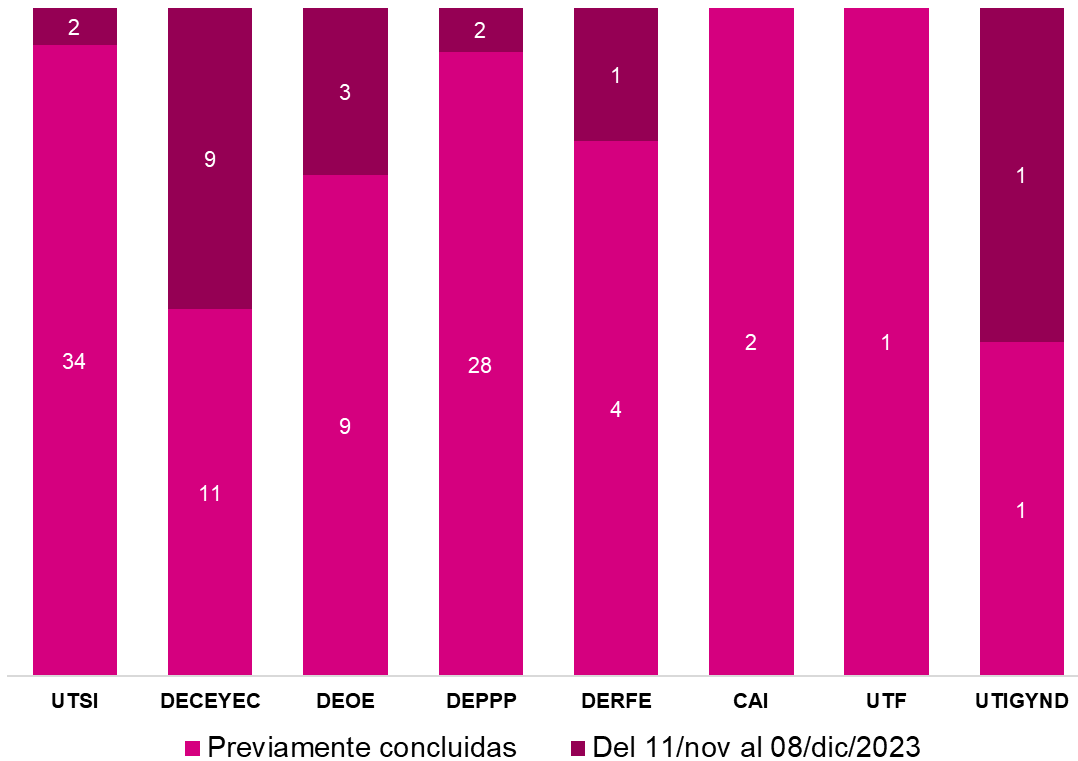

1.2 Actividades en ejecución

Al momento se encuentran en ejecución 142 actividades. El número de actividades en ejecución por UR se muestran en la Gráfica 3, donde destacan con mayor número de actividades en este estatus, la DEOE con 25 (17.61%), la DERFE con 23 (16.20%), la DEPPP con 22 (15.49%) y la DECEYEC con 20 (14.08%).


Gráfica 3
Total de actividades en ejecución por UR del PlyCPEF 2023-2024

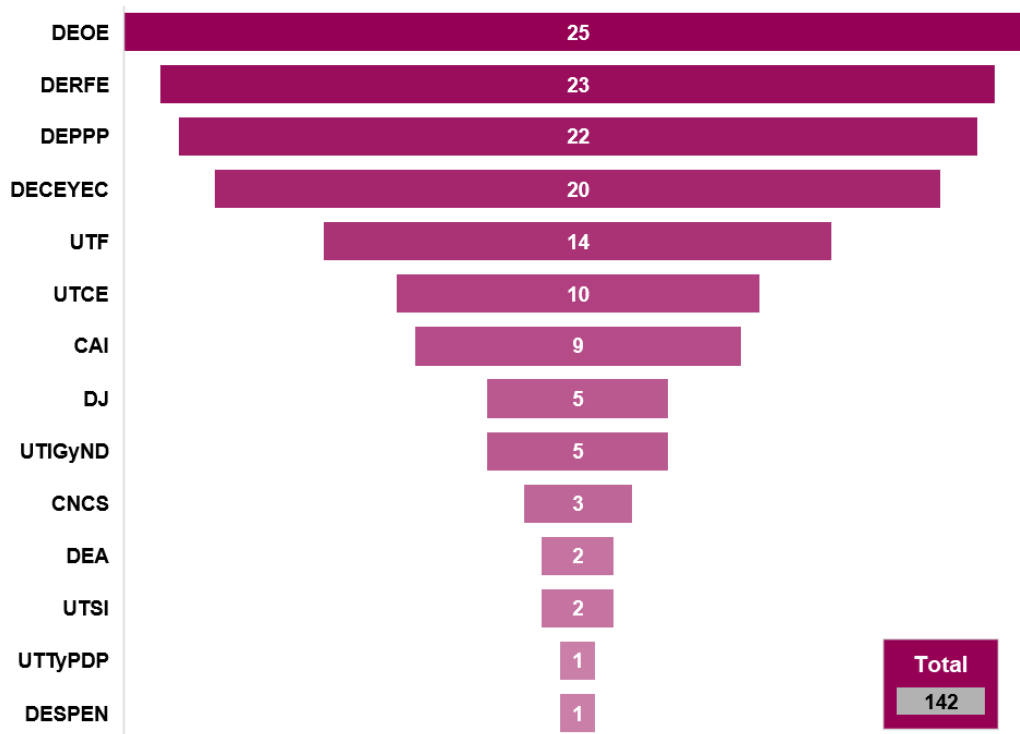

1.2.1 Actividades en ejecución, en tiempo

Por su parte, de las 142 actividades en ejecución, 134 (94.37%) se llevan a cabo conforme a las fechas establecidas, el desgregado por cada UR se muestra en la Gráfica 4.


Gráfica 4
Distribución absoluta del total de actividades en tiempo por UR del PlyCPEF 2023-2024

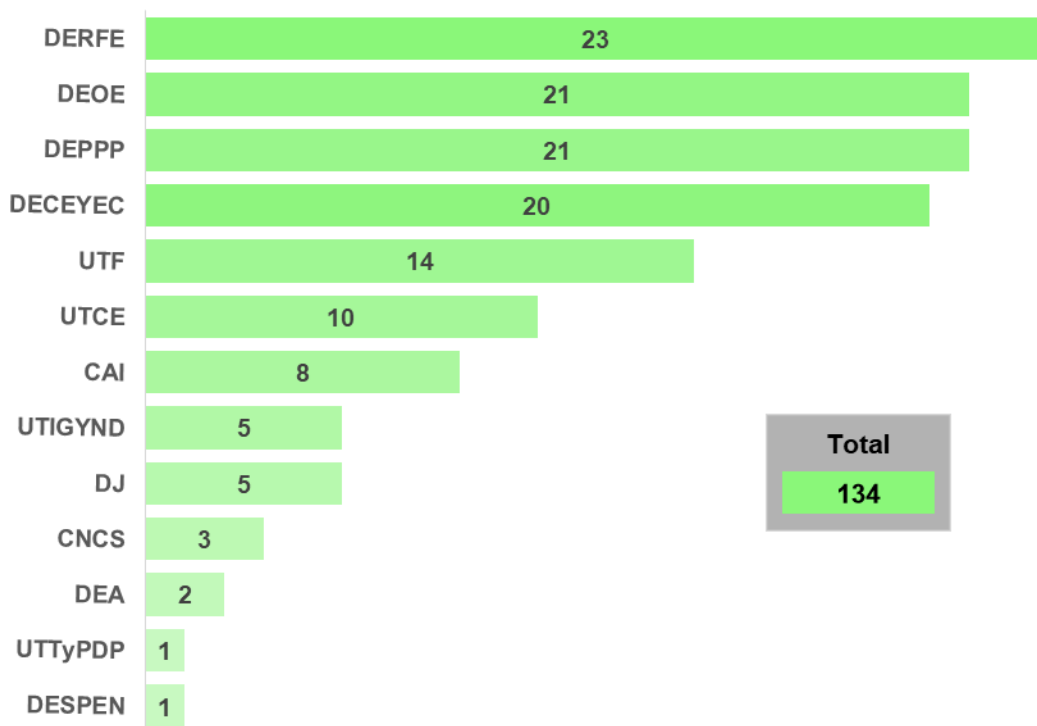

1.2.2 Actividades en ejecución desfasadas

De las 142 actividades que se encuentran en ejecución, ocho (5.63%) se encuentran con estatus de desfasadas respecto al periodo programado (Gráfica 5).

Gráfica 5
Distribución absoluta del total de actividades desfasadas por UR del PlyCPEF 2023-2024

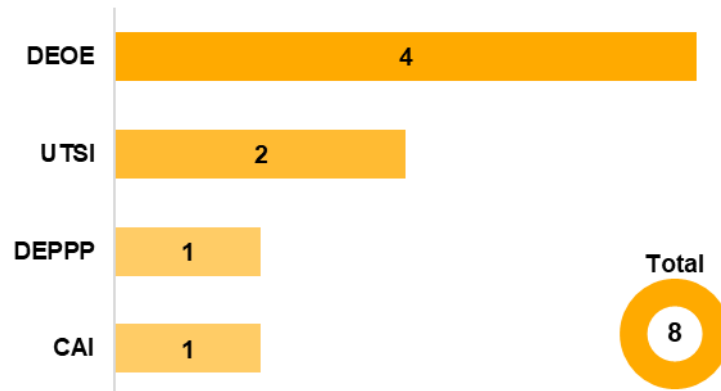

De las actividades que se encuentran con desfase, en el Cuadro 1 se describen las causas que lo originan, y en los casos en que sea procedente, las medidas adoptadas para llevarlas a término.

Cuadro 1
Total de actividades desfasadas por UR del PlyCPEF 2023-2024

CAI	
Actividad	Descripción desfase
Suscribir un instrumento de colaboración con la instancia internacional responsable de la operación del Fondo de Apoyo para la Observación Electoral 2024	Derivado de que la Junta General Ejecutiva en su sesión del 11 de diciembre de 2023, aprobó modificaciones a la Cartera Institucional de Proyectos del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2024, particularmente ajustando el presupuesto del proyecto específico "D050310 Fondo de apoyo para la observación electoral y el acompañamiento técnico", se estaría a la espera de la resolución que el Consejo General tome sobre este proyecto en próxima sesión.
DEOE	
Actividad	Descripción desfase
Supervisar la producción de la documentación electoral	El 5 de diciembre de 2023 se sostuvo una reunión de coordinación con TGM, en la que se acordó que la DEOE le actualizaría los criterios de dotación de la documentación sin emblemas con los que se hará toda la producción. También se acordó que TGM proporcionaría los datos de ubicación de los fabricantes de porta gafetes y bolsas, así como las pruebas de color de avisos, sobres, bolsas, carteles y otros documentos sin emblemas. En esa misma fecha se recibieron dos muestras de papel auto copiante que pasaron las pruebas de transmisión de escritura y será el papel que se utilice para la producción de actas, así como las muestras de fibras ópticas visibles e invisibles para seleccionar las que se incorporarán en el papel seguridad de las boletas. El 6 de diciembre la DEOE remitió a TGM la actualización de los criterios de dotación, junto con las especificaciones y calendarios de producción.
Supervisar la producción de los materiales electorales	Sellos "X": Concluyó el proceso de templado de las piezas metálicas que integrarán el molde e inició la calibración de figuras. La producción se desarrolla de acuerdo con lo programado. Marcadoras de credenciales y de los dados marcadores: Derivado de la omisión de la empresa adjudicada de entregar oportunamente la opinión de cumplimientos fiscales y ante la falta de formalización del contrato correspondiente, el 5 de diciembre de 2023 se llevó a cabo la primera audiencia de conciliación, en la cual se acordó atender la solicitud de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios (DRMS) de la DEA, de contar con información relativa al avance de la empresa en cuanto a la producción y el cumplimiento de la fecha de entrega. El 6 de diciembre se acudió a las instalaciones del proveedor para verificar el avance y el resultado se hizo del conocimiento del OIC, de la DRMS y de la Dirección Jurídica. Asimismo, se difirió la audiencia de conciliación para el 8 de diciembre de 2023; en el Acta de la Audiencia, se acordó celebrar un Convenio de Conciliación para formalizar las obligaciones derivadas del fallo adjudicado a favor de la empresa Productos Metálicos Alfil, S.A. de C.V, correspondiente a la

	<p>producción de marcadoras de credenciales y dados marcadores, de la Licitación Pública Nacional Presencial LP-INE-037/2023, con lo que se da por resuelta la solicitud de conciliación solicitada por dicha empresa.</p> <p>Por otra parte, el 6 de diciembre de 2023 inició la producción de los marcadores de boletas y de los sujetadores de marcador. Respecto de los materiales adjudicados a Talleres Gráficos de México, el 6 de diciembre de 2023, inició la producción de la urna de Presidencia y de la caja paquete electoral. Está pendiente que TGM entregue las muestras para visto bueno para inicio de producción de los materiales restantes.</p>
<p>Llevar a cabo el almacenamiento de la documentación y materiales electorales en el Centro Logístico de Distribución de la DEOE</p>	<p>El 1 de diciembre inició el contrato de arrendamiento del inmueble que se utilizaría como Centro Logístico de Distribución ubicado en Jilotepec, Méx.; sin embargo, el propietario, por medio de la inmobiliaria, informó que tuvo cita el 30 de noviembre para recibir el permiso del concesionario de la autopista Arco Norte para tener acceso por esa vía hacia el inmueble y que no se lo entregaron, dándole nueva cita para el 7 de diciembre, la cual no se llevó a cabo. Se ha estado en comunicación con la inmobiliaria para saber del avance del trámite, informando ésta que desde el 2 de diciembre no ha podido tener comunicación con el propietario. Previendo la posible cancelación del arrendamiento del inmueble ubicado en Jilotepec, la Dirección de Obras y Conservación (DOC) de la DEA y la Dirección de Estadística y Documentación Electoral (DEDE) de la DEOE, reiniciaron las acciones de búsqueda del inmueble el 4 de diciembre. En este sentido, la inmobiliaria "Cabiedes Bienes Raíces Industriales" ofreció un inmueble ubicado en Tultitlán, Méx. en el parque industrial denominado Tule 3, que cuenta con 10,200 m2 construidos y cubre todos los requerimientos del Anexo técnico elaborado por la DEOE, por lo que se considera una opción viable. El representante de la inmobiliaria tuvo contacto telefónico con el propietario y le solicitó la documentación requerida por el Instituto para su revisión por parte de la DOC, misma que enviará la inmobiliaria en cuanto la entregue el propietario. Cabe señalar que se tiene como fecha límite el 16 de enero de 2024 para iniciar el arrendamiento, pero previendo alguna eventualidad para la contratación del segundo inmueble, se ha solicitado a la DECEyEC el uso de su bodega para los documentos y materiales que se recibirán en este mes de diciembre.</p>
<p>Dar seguimiento a las gestiones que realicen las juntas locales, para la firma de Convenios de Colaboración con las autoridades escolares de la entidad que corresponda.</p>	<p>10 estados. concluyeron la firma del Convenio (Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Querétaro, Sonora, Tlaxcala, Yucatán, Jalisco y Nuevo León). Chiapas reporta el Convenio firmado, pero aún no se lo han entregado. 6 entidades (Baja California, Colima, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, y Veracruz) tienen fecha de firma entre el 06 y el 15 de dic. de 2023. Guerrero, agendó la firma para el 10 de enero de 2024, en un acto protocolario</p>

	<p>con la asistencia de la Presidenta del INE. En Puebla, Tabasco y Tamaulipas, están en espera de fecha para firma. Por lo que refiere al Estado de México el Vocal Ejecutivo Local informa que seguirán insistiendo en la firma de convenio, ya que se tenía concretada la firma del mismo el 01 de diciembre el cual fue cancelado. En Morelos, aunque se firmó el Convenio Marco con el Gobierno del estado, aún no se firma la adenda para préstamo de planteles. el área responsable envió un comunicado el día 06 de dic., para conocer los motivos; la JLE reporta que el 8 de dic. de 2023 estarán remitiendo el proyecto de adenda al OPL y al Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), no requieren apoyo para acelerar gestiones y prevén que la firma la realizarían la 1ra semana de enero del 2024; no reportan riesgos en la realización de las salidas de las JDE para los recorridos. El día 07 de diciembre se envió un comunicado a nueve entidades a efecto de acelerar las gestiones y en su caso conocer si existe algún riesgo en la firma de convenios que siguen en revisión por parte los órganos institucionales o la autoridad educativa; en este sentido, Aguascalientes, Coahuila, y Quintana Roo, prevén que la firma se realizará entre el 11 y 15 de diciembre de 2023. En Campeche el convenio ya fue firmado por el secretario de la entidad; sin embargo, falta la firma del área de finanzas del estado. En Michoacán se tiene prevista la firma en la segunda quincena de diciembre. En la Ciudad de México se estima que la firma se realice en el mes de enero. En Hidalgo se está a la espera de las observaciones del IEEH. En Nayarit y Zacatecas el convenio está en revisión por parte del Gobierno Local.</p>
DEPPP	
Actividad	Descripción desfase
<p>Recibir, revisar y analizar la documentación presentada por los Partidos Políticos que soliciten el registro de una Coalición, así como elaborar los Anteproyectos de Resolución respectivos</p>	<p>Se presentaron a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos el 05 de diciembre de 2023, se solicitó bajar para mayor análisis y se discutirán el 12 de diciembre y en CG el 15 de diciembre.</p>
UTSI	
Actividad	Descripción desfase
<p>Sistema Integral de Fiscalización – Campaña: Verificar y validar los Componentes (Pruebas de aceptación).</p>	<p>Aún está en proceso de formalización la documentación con el nuevo plan de trabajo con la fecha de inicio de las pruebas para el 06 de febrero de 2024, en cuanto se tengan firmados los documentos se realizará la solicitud de cambio en el Plan Integral y Calendario.</p>
<p>Sistema de Voto Electrónico por Internet (SIVEI): Envío a DEOE de Formatos Únicos</p>	<p>Se remitieron a DEOE los Formatos Únicos de siete de nueve entidades. En espera de la atención de las observaciones por parte de los OPL de Morelos y Estado de México.</p>

de boleta electoral electrónica y documentación para modalidad electrónica (PEF y PEL)	
--	--

1.2.3 Actividades en riesgo



El proyecto del Fondo de Apoyo para la Observación Electoral se encuentra en proceso de revisión derivado de la propuesta de ajuste a su presupuesto hecho por la Junta General Ejecutiva, en su sesión del 11 de diciembre de 2023.

1.3 Actividades por iniciar y por concluir

De las 610 actividades que conforman el PlyCPEF 2023-2024, cuatro actividades se encuentran próximas a iniciar su ejecución en el periodo del 09 de diciembre a la fecha horizonte del 31 de diciembre, lo que representa un 0.66% respecto al total (Cuadro 2). El detalle puede consultarse en el Anexo 2.

Cuadro 2
Distribución de Actividades por iniciar su ejecución por UR

Unidad Responsable	TOTAL	DECEYEC	UTSI
Actividades por iniciar	4	3	1

De las actividades que se tienen previstas concluyan, de acuerdo con la fecha de término que cada UR estableció son 20, las cuales se distribuyen de la siguiente forma (Cuadro 3) (se agrega el detalle en el Anexo 3):

Cuadro 3
Distribución de Actividades por concluir su ejecución por UR

Unidad Responsable	TOTAL	DEA	DECEYEC	DEOE	DEPPP	DERFE	UTF	UTSI
Actividades por concluir	20	1	3	3	5	6	1	1

1.4 Actividades que generan acuerdos o que dependen de aprobación de órganos desconcentrados

Se tienen programadas 57 actividades para aprobación de un acuerdo. Derivado de ello, al momento se cuenta con la aprobación acumulada de 34 (59.65%) acuerdos (Cuadro 4). Durante el periodo que se reporta se aprobaron dos acuerdos por el CG, cuyo enlace para su consulta se ubica en el Anexo 4.

Cuadro 4
Distribución del número acumulado de acuerdos aprobados por UR

UR	TOTAL	CAI	DECEYEC	DEOE	DEPPP	UTF	DERFE	UTSI
Acuerdos Aprobados	34	1	1	8	15	1	4	4

Conclusiones

En el lapso del presente informe, que contempla el periodo del 11 de noviembre al 08 de diciembre de 2023, se analizaron 250 actividades, que equivalen al (40.98%) respecto a las 610 actividades que integran el PlyCPEF 2023-2024.

De las 250 actividades analizadas, 142 se encuentran en ejecución y 108 han concluido; de éstas últimas, 18 corresponden al periodo reportado. 134 actividades se desarrollan dentro del periodo establecido y ocho fueron reportadas con desfase por las UR.

En el periodo comprendido, la CAI reportó que una actividad presenta riesgo en su cumplimiento.

Durante el periodo reportado, se aprobaron dos acuerdos, por lo que a la fecha de corte se acumulan 34 acuerdos aprobados de los 57 que forman parte de las actividades del PlyCPEF 2023-2024.

Finalmente, para el periodo del 09 al 31 de diciembre de 2023, se tiene previsto que den inicio cuatro actividades y 20 actividades concluirán dentro de este mismo periodo.

Anexo 1. Relación de actividades concluidas

ID	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Entregable	Valoración de la UR
61	Gestión de la Política de Igualdad de Género y No Discriminación	Transversalización, Vinculación e Investigación en Materia de IGyND	Analizar la posible actualización de los Lineamientos para que los partidos políticos nacionales y, en su caso, los partidos políticos locales, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género.	UTIGYND	Reporte	El día jueves 7 de diciembre en sesión del CG se aprobó el acuerdo INE/CG647/2023 Por el que se aprueba el procedimiento para constatar que las personas candidatas no hayan incurrido en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 38, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o del artículo 442 bis, en relación con el 456, numeral 1, inciso c), fracción III de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el Proceso Electoral Federal 2023-2024. Por lo que se da cumplimiento al tema en cuestión.
76	Instalación y Operación de Oficinas Municipales	Preparación de las oficinas de municipales	Elaborar y someter el proyecto de Acuerdo sobre la instalación de oficinas municipales al Consejo General a propuesta de la Junta General Ejecutiva.	DEOE	Proyecto de Acuerdo	El 16 de noviembre del presente año, se aprobó en sesión de CG, el Acuerdo para el establecimiento de 50 oficinas municipales distribuidas en 19 entidades federativas y 36 distritos electorales federales, para el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024 y, en su caso, para las elecciones extraordinarias que se deriven del mismo, a propuesta de la JGE.
85	Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Diseño de la Estrategia de Integración de Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Elaborar los modelos del material didáctico de cada uno de los OPL, dirigido a las y los funcionarios de casilla, para la incorporación de especificidades de las elecciones locales para la Segunda Etapa de Capacitación Electoral.	DECEYEC	Archivo electrónico	En la 1ª sesión ordinaria de la CCOE llevada a cabo el 24 de noviembre de 2023, se presentaron y aprobaron por la referida comisión, los modelos de materiales didácticos dirigidos a las y los funcionarios de casilla, siguientes: <ul style="list-style-type: none"> • Modelo de Instructivo para la y el funcionario de Casilla. elecciones locales • Modelo de Instructivo para la y el funcionario de Casilla Especial. Elecciones Locales • Modelo de Tablero con información

ID	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Entregable	Valoración de la UR
						sobre candidaturas contendientes en las elecciones locales.
136	Actualización de la Geografía Electoral	Integración de Cartografía Electoral	la Generar y proporcionar los catálogos cartográficos federales.	DERFE	Reporte	El 5 de diciembre de 2023, se enviaron mediante correo electrónico a la DECEYEC, DEOE y UTSI, los catálogos cartográficos federales con lo que se dio cumplimiento a la actividad.
138	Asignación de Diputaciones y Senadurías por el Principio de Representación Proporcional	Ejecución del Mecanismo para la Aplicación de la Fórmula de Asignación de Diputaciones y Senadurías por el Principio de Representación Proporcional	Elaborar y someter a consideración del Consejo General el Proyecto de Acuerdo por el que se determina el mecanismo para la aplicación de la fórmula de asignación de Senadurías y Diputaciones por el principio de Representación Proporcional que correspondan a los Partidos Políticos Nacionales con base en los resultados que obtengan en la Jornada Electoral	DEPPP	Acuerdo	Se aprobó el Acuerdo INE/CG645/2023 en la sesión de CG del 7/dic 2023.
149	Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Diseño de la Estrategia de Integración de Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Coordinar reuniones regionales de preparación del Proceso Electoral 2023-2024 en materia de integración de Mesas Directivas de Casilla y capacitación electoral.	DECEYEC	Informe	Se finalizó el pasado 27 de noviembre con el octavo taller, llevado a cabo en el Hotel Royal Pedregal de la Ciudad de México.
172	Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Diseño de la Estrategia de Integración de Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Difundir la convocatoria de SE y CAE (JD).	DECEYEC	Convocatoria	La difusión de la convocatoria para el reclutamiento, selección y contratación de SE y CAE concluyó el 28 de noviembre, a nivel nacional fue difundida a través de 64,785 carteles, 1,025,224 volantes y 38,014 veces por internet y redes sociales, los cuales son los tres principales medios de difusión.
173	Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Diseño de la Estrategia de Integración de Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Recibir las solicitudes y documentos de las y los aspirantes a SE y CAE(JD).	DECEYEC	Otro	El 28 de noviembre finalizó la recepción de solicitudes y documentos de personas aspirantes a SE y CAE. A nivel nacional las juntas distritales ejecutivas recibieron las solicitudes y documentos de 195,780 personas aspirantes.

ID	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Entregable	Valoración de la UR
174	Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Diseño de la Estrategia de Integración de Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Revisar la documentación de las y los aspirantes a SE y CAE (JD)	DECEYEC	Otro	El periodo para la revisión documental finalizó el 4 de diciembre.
175	Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Diseño de la Estrategia de Integración de Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Impartir la plática de inducción a las y los aspirantes a SE y CAE (JD)	DECEYEC	Otro	Al cierre del registro de aspirantes a SE y CAE el 28 de noviembre, 134,050 personas aspirantes visualizaron la cápsula de inducción.
186	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR): Liberar (Producción).	UTSI	Oficio Circular	/ Se realizó el 2 de diciembre la actualización del ambiente de producción del Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos Local, versión 7.0 para poner en operación: Alerta de personas capturadas en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (RNPS). Modificación del Aviso de privacidad Simplificado en el HTML, Centro de ayuda, Formularios. Ajustes derivados de Habilitación de Diputación migrante MR.
207	Integración y funcionamiento de los Consejos Locales y Distritales	Supervisión y seguimiento a la integración de los Órganos Desconcentrados temporales	Dar seguimiento a la designación de los consejeros Electorales que integren los Consejos Distritales del INE.	DEOE	Informe	El 20 de noviembre de 2023 sesionaron de forma extraordinaria los 32 Consejos Locales para aprobar los acuerdos con la designación y/o ratificación de los Consejos Distritales respectivos, con lo cual se cumple anticipadamente con la actividad.
216	Registro de Plataformas Electorales, Coaliciones, Acuerdos de Participación y Candidaturas	de Revisión del Cumplimiento de los Requisitos de Plataformas Electorales, Coaliciones o Acuerdos de Participación y Candidaturas	Recibir, revisar y analizar, la documentación presentada por las Agrupaciones Políticas que soliciten el registro de un Acuerdo de Participación, así como elaborar los Proyectos de Resolución respectivos	DEPPP	Resolución	Se aprobaron 4 proyectos de resolución en la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos el 05 de diciembre de 2023 y en CG el 07 de diciembre.

ID	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Entregable	Valoración de la UR
231	Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Diseño de la Estrategia de Integración de Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Recibir y reproducir el Examen de conocimientos, habilidades y actitudes en Juntas Locales Ejecutivas	DECEYEC	Otro	El 22 de diciembre la DECEYEC envió los exámenes de conocimientos, habilidades y actitudes a las personas titulares de la Vocalía Ejecutiva Local para que inicien con su reproducción. El 1 de diciembre concluyó el periodo para que las JLE finalicen con la reproducción de los exámenes.
232	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	Sistema de Ubicación de Casillas: Liberar (Producción).	UTSI	Oficio Circular	/ El 16 de noviembre se envió correo electrónico al usuario, indicando que a partir del 17 de noviembre se pondrá en operación en sistema, de acuerdo a la circular INE-DEOE-DECEYEC-UTF-UTSI-001-2023.
233	Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Diseño de la Estrategia de Integración de Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Recibir y distribuir el Examen de conocimientos, habilidades y actitudes a Juntas Distritales Ejecutivas	DECEYEC	Otro	El 22 de noviembre la DECEYEC envió vía correo electrónico los exámenes de conocimientos, habilidades y actitudes a las personas titulares de las Vocalías Ejecutivas Locales para que inicien con su reproducción. El 1 de diciembre concluyó el periodo para que las JLE finalicen con la reproducción de los exámenes. Las 32 JLE enviaron a la DECEYEC el Segundo diagnóstico del examen en línea de las JDE bajo su responsabilidad.

ID	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Entregable	Valoración de la UR
240	Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Diseño de la Estrategia de Integración de Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Sortear el mes del calendario por parte del Consejo General	DECEYEC	Convocatoria	<p>En cumplimiento de lo mandatado por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artículo 254, párrafo 1, inciso a), así como de lo establecido en la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2023-2024, en su Programa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral, apartado Primera etapa de capacitación electoral (sensibilización), se establece que el CG, sorteará un mes del calendario que junto con el que le siga en su orden serán tomados como base para la insaculación a la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla.</p> <p>Por lo anterior, el CG en su sesión extraordinaria celebrada el día 7 de diciembre de 2023, sorteó el mes calendario resultando el mes de "marzo".</p>
242	Integración y funcionamiento de los Consejos Locales y Distritales	Supervisión y seguimiento a la integración de los Órganos Desconcentrados temporales	Dar seguimiento a sesión de instalación de los Consejos Distritales.	DEOE	Informe	<p>El 1 de diciembre de 2023 celebraron su sesión de instalación los 300 Consejos Distritales del Instituto, lo cual se informó a la CCOE</p>

Anexo 2. Relación de actividades por iniciar en el PlyCPEF 2023-2024

ID	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Fecha de Inicio
246	Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Diseño de la Estrategia de Integración de Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Llevar a cabo la aplicación del Examen de conocimientos, habilidades y actitudes (JDE).	DECEYEC	09/12/2023
247	Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Diseño de la Estrategia de Integración de Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Entrega del listado de propuestas de Secciones de Estrategias Diferenciadas y Secciones con Cambio a la Propuesta de la Ruta de Visita (SCPRV) al Consejo Distrital.	DECEYEC	10/12/2023
248	Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Diseño de la Estrategia de Integración de Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Llevar a cabo las entrevistas para seleccionar a SE (JDE).	DECEYEC	12/12/2023
249	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	Sistema de Validación de Cuentas de Usuario de SE y CAE: Verificar y validar los Componentes (Pruebas de aceptación).	UTSI	16/12/2023

Anexo 3. Relación de actividades por concluir en el PlyCPEF 2023-2024

ID	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Fecha de Término
18	Gestión por Procesos	Coordinación de Gestión por Procesos	Elaborar acuerdos de autorización para el arrendamiento de inmuebles. Elaborar acuerdos de autorización para adecuaciones de inmuebles.	DEA	31/12/2023
246	Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Diseño de la Estrategia de Integración de Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Llevar a cabo la aplicación del Examen de conocimientos, habilidades y actitudes (JD).	DECEYEC	10/12/2023
247	Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Diseño de la Estrategia de Integración de Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Entrega del listado de propuestas de Secciones de Estrategias Diferenciadas y Secciones con Cambio a la Propuesta de la Ruta de Visita al Consejo Distrital.	DECEYEC	10/12/2023
248	Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Diseño de la Estrategia de Integración de Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Llevar a cabo las entrevistas para seleccionar a SE (JD).	DECEYEC	19/12/2023
384	Voto de las Personas en Prisión Preventiva	Determinación del número de Personas en Prisión Preventiva	Solicitar la relación de personas en prisión preventiva recluidas en los centros penitenciarios participantes.	DEOE	16/12/2023
95	Planeación, aprobación y operación de los mecanismos de recolección de la Documentación Electoral al Término de la Jornada Electoral	Elaboración de la Guía para la Planeación e implementación de los mecanismos de recolección	Elaborar y remitir a los consejos distritales del INE, la Guía y cronograma para la planeación e implementación de los mecanismos de recolección.	DEOE	20/12/2023
96	Integración y Difusión de la Estadística Electoral	Difusión y Presentación de Resultados de la Estadística Electoral	Elaborar el planteamiento inicial de requerimientos y propuesta de actualización del Sistema de Consulta de Resultados Electorales Federales y Locales.	DEOE	31/12/2023
140	Registro de Plataformas Electorales, Coaliciones,	Revisión del Cumplimiento de los Requisitos de Plataformas	Verificar que los métodos de selección, que en su momento sean informados por los Partidos	DEPPP	31/12/2023

ID	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Fecha de Término
	Acuerdos de Participación y Candidaturas	Electorales, Coaliciones o Acuerdos de Participación y Candidaturas	Políticos, se encuentren apegados a lo señalado en el Acuerdo del Consejo General respectivo, así como a la Ley Electoral y a la normativa interna de cada partido, y en su oportunidad rendir un Informe al Consejo General.		
66	Administración de los Tiempos del Estado en Radio y Televisión Periodo Ordinario	Asignación de los Tiempos en Materia Electoral en Radio y Televisión y Gestión de Transmisiones	Elaborar los modelos de pauta para la transmisión de mensajes en radio y televisión de partidos políticos y candidaturas independientes.	DEPPP	31/12/2023
67	Administración de los Tiempos del Estado en Radio y Televisión Periodo Ordinario	Asignación de los Tiempos en Materia Electoral en Radio y Televisión y Gestión de Transmisiones	Elaborar y someter a consideración del Comité de Radio y Televisión el Acuerdo por el que se aprueban los modelos de distribución del tiempo asignado a los partidos políticos nacionales y locales, así como las pautas de transmisión de mensajes en radio y televisión que corresponden a los partidos políticos y candidaturas independientes.	DEPPP	31/12/2023
69	Administración de los Tiempos del Estado en Radio y Televisión Periodo Ordinario	Asignación de los Tiempos en Materia Electoral en Radio y Televisión y Gestión de Transmisiones	Notificar las pautas para la transmisión de mensajes a las emisoras de radio y canales televisión que integran el Catálogo de medios para el Proceso Electoral Federal 2023-2024.	DEPPP	31/12/2023
70	Administración de los Tiempos del Estado en Radio y Televisión Periodo Ordinario	Asignación de los Tiempos en Materia Electoral en Radio y Televisión y Gestión de Transmisiones	Notificar a las autoridades que mandate el Acuerdo de pautas para la transmisión de mensajes en radio y televisión de partidos políticos, candidaturas independientes y autoridades electorales.	DEPPP	31/12/2023
214	Conformación del Padrón Electoral y Credencialización	Captación de Trámites	Solicitar a la Dirección de Operaciones, Centro de Cómputo y Resguardo Documental de las relaciones de Personas con Voto	DERFE	11/12/2023

ID	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Fecha de Término
			Anticipado (Base de Datos nominativa) con corte al 31/12/2023.		
153	Conformación del Padrón Electoral y Credencialización	Determinación de la Calidad y Validez del Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores	Dar seguimiento a las actividades del Comité Técnico de Evaluación del Padrón Electoral encaminadas a la definición de su programa de trabajo.	DERFE	14/12/2023
229	Conformación del Padrón Electoral y Credencialización	Determinación de la Calidad y Validez del Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores	Elaborar y someter a consideración de la Comisión del Registro Federal de Electores y la Comisión Nacional de Vigilancia el Programa de Trabajo del Comité Técnico de Evaluación del Padrón Electoral 2023-2024.	DERFE	15/12/2023
213	Conformación del Padrón Electoral y Credencialización	Captación de Trámites	Solicitar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana la relación de Personas en Prisión Preventiva (Base de Datos nominativa e información biométrica) con corte al 31/12/2023.	DERFE	16/12/2023
196	Conformación del Padrón Electoral y Credencialización	Emisión de Listas Nominales de Electores	Entregar la Lista Nominal de Electores a la UTSI para la preparación del sistema durante el mes de diciembre con corte al 30 de noviembre de 2023.	DERFE	31/12/2023
238	Conformación del Padrón Electoral y Credencialización	Emisión de Listas Nominales de Electores	Elaborar y someter a consideración del CG el proyecto de Acuerdo para aprobar los Lineamientos para la conformación de la Lista Nominal del Electorado en Prisión Preventiva.	DERFE	31/12/2023
16	Fiscalización del Proceso Electoral	Fiscalización de Apoyo Ciudadano, Precampaña, Campaña y Observadores Electorales	Presentar a la Comisión de Fiscalización un programa de trabajo de la fiscalización de apoyo de la ciudadanía y precampañas de manera conjunta, mismo que deberá incluir la estrategia de	UTF	15/12/2023

ID	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Fecha de Término
249	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	capacitación, asesoría y acompañamiento a los partidos políticos, a las precandidaturas, así como a las y los aspirantes a una candidatura independiente. Sistema de Validación de Cuentas de Usuario de SE y CAE: Verificar y validar los Componentes (Pruebas de aceptación).	UTSI	16/12/2023

Anexo 4. Relación de acuerdos aprobados programados en el PlyCPEF 2023-2024

UR	Acuerdos	Fecha de aprobación	Núm. de Acuerdo	URL
DEOE	Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el establecimiento de 50 oficinas municipales distribuidas en 19 entidades federativas y 36 distritos electorales federales, para el proceso electoral concurrente 2023-2024 y, en su caso, para las elecciones extraordinarias que se deriven del mismo, a propuesta de la Junta General Ejecutiva.	16/11/2023	INE/CG613/2023	https://repositoriodocumental.ine.mx/mlui/handle/123456789/156818
DEPPP	Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se determina el mecanismo para la aplicación de la fórmula de asignación de las curules y los escaños por el principio de representación proporcional en el Congreso de la Unión, que correspondan a los Partidos Políticos Nacionales con base en los resultados que obtengan en la Jornada Electoral a celebrarse el dos de junio de dos mil veinticuatro. (Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos)	07/12/2023	INE/CG645/2023	https://repositoriodocumental.ine.mx/mlui/handle/123456789/152751
