



Cuarto Informe Parcial

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2023-2024

Enero 2024

Índice

Glosario	2
Introducción	4
1. Análisis cuantitativo y cualitativo	5
1.1 Actividades concluidas	6
1.2 Actividades en ejecución	7
1.2.1 Actividades en ejecución, en tiempo	8
1.2.2 Actividades en ejecución desfasadas	9
1.2.3 Actividades en riesgo	13
1.3 Actividades por iniciar y por concluir	13
Conclusiones	15

Glosario

CG / Consejo General	Consejo General del Instituto Nacional Electoral
CAE	Capacitador/a Asistente Electoral
CAI	Coordinación de Asuntos Internacionales
CCOE	Comisión de Capacitación y Organización Electoral
CNCS	Coordinación Nacional de Comunicación Social
DEA	Dirección Ejecutiva de Administración
DECEYEC	Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
DEOE	Dirección Ejecutiva de Organización Electoral
DEPPP	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos
DERFE	Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores
DESPEN	Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional
DJ	Dirección Jurídica
Instituto/INE	Instituto Nacional Electoral
JD	Junta Distrital Ejecutiva
Junta/JGE	Junta General Ejecutiva
LGIPE	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
Metodología de Seguimiento	Metodología para el Seguimiento al Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2023-2024
OPL	Organismo(s) Público(s) Local(es)
PEF	Proceso Electoral Federal
PEL	Proceso Electoral Local
PlyCPEF 2023 - 2024	Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2023-2024
RE	Reglamento de Elecciones
SE	Supervisor/a Electoral
UR	Unidades Responsables: Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas del INE
UTCE	Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral

UTF	Unidad Técnica de Fiscalización
UTIGyND	Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación
UTSI	Unidad Técnica de Servicios de Informática
UTTyPDP	Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales

Introducción

El 20 de julio de 2023, previo al inicio del Proceso Electoral Federal 2023-2024, el Consejo General, mediante Acuerdo INE/CG441/2023 aprobó el PlyCPEF 2023-2024 a propuesta de la Junta.

En cumplimiento al punto segundo del acuerdo referido, el 18 de septiembre la DEOE presentó ante las y los integrantes de la CCOE la Metodología de Seguimiento, que permitirá llevar el control y seguimiento de las actividades, así como la presentación de los informes correspondientes ante el Consejo General.

En dicho documento se establece que la DEOE elaborará informes mensuales, con las actividades que forman parte del PlyCPEF 2023-2024, detallando el estatus en el que se encuentran: concluidas, en ejecución (en tiempo, desfasadas y en riesgo), así como las actividades que están próximas a concluir y las que están por iniciar, para su presentación a los integrantes de la CCOE.

La fuente de información es la reportada por cada una de las UR en el aplicativo de seguimiento en forma semanal, quienes emiten sus propias valoraciones. Este informe da cuenta del periodo del 09 de diciembre de 2023 al 12 de enero de 2024.

De conformidad con lo establecido en la Metodología de Seguimiento, el Informe se actualizará al corte más próximo a la sesión de CG en que se presentará.

Cuarto informe parcial del Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2023-2024. Actividades correspondientes al periodo del 09 de diciembre de 2023 al 12 de enero de 2024.


1. Análisis cuantitativo y cualitativo

El PlyCPEF 2023-2024 fue aprobado por CG con un total de 612 actividades, al periodo que se reporta, fueron procedentes dos solicitudes de desincorporación, por lo que, a la fecha de corte del presente documento, al PlyCPEF lo integran un total de 610 actividades.

Al periodo, se tiene el siguiente avance general:

- 141 (23.11%) actividades están concluidas, 149 (24.43%) actividades están en ejecución y 320 (52.46%) actividades no han iniciado (Gráfica 1).

Gráfica 1
Distribución relativa y absoluta del avance general de actividades del PlyCPEF 2023-2024

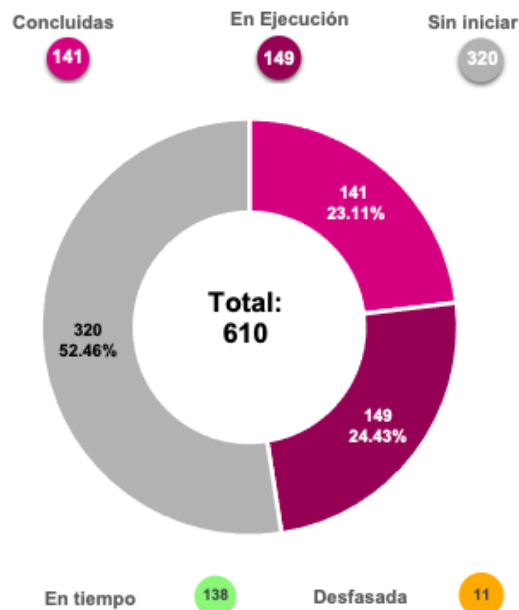


1.1 Actividades concluidas

De las 610 actividades se ha concluido un acumulado de 141 actividades, lo que representa 23.11% del total de actividades programadas.

Dentro del periodo que se reporta concluyeron 33 actividades. Por UR concluyeron conforme a lo siguiente, la UTSI con nueve (27.27%), la DECEYEC y la DERFE con siete (21.21%) cada una, la DEPPP con seis (18.18%), la DEOE con 3 (9.10%) y DEA con una (3.03%). Los porcentajes se calculan respecto al total de actividades del periodo (Gráfica 2). El detalle de las actividades concluidas se muestra en el Anexo 1.


Gráfica 2
Distribución absoluta de actividades concluidas por UR del PlyCPEF 2023-2024

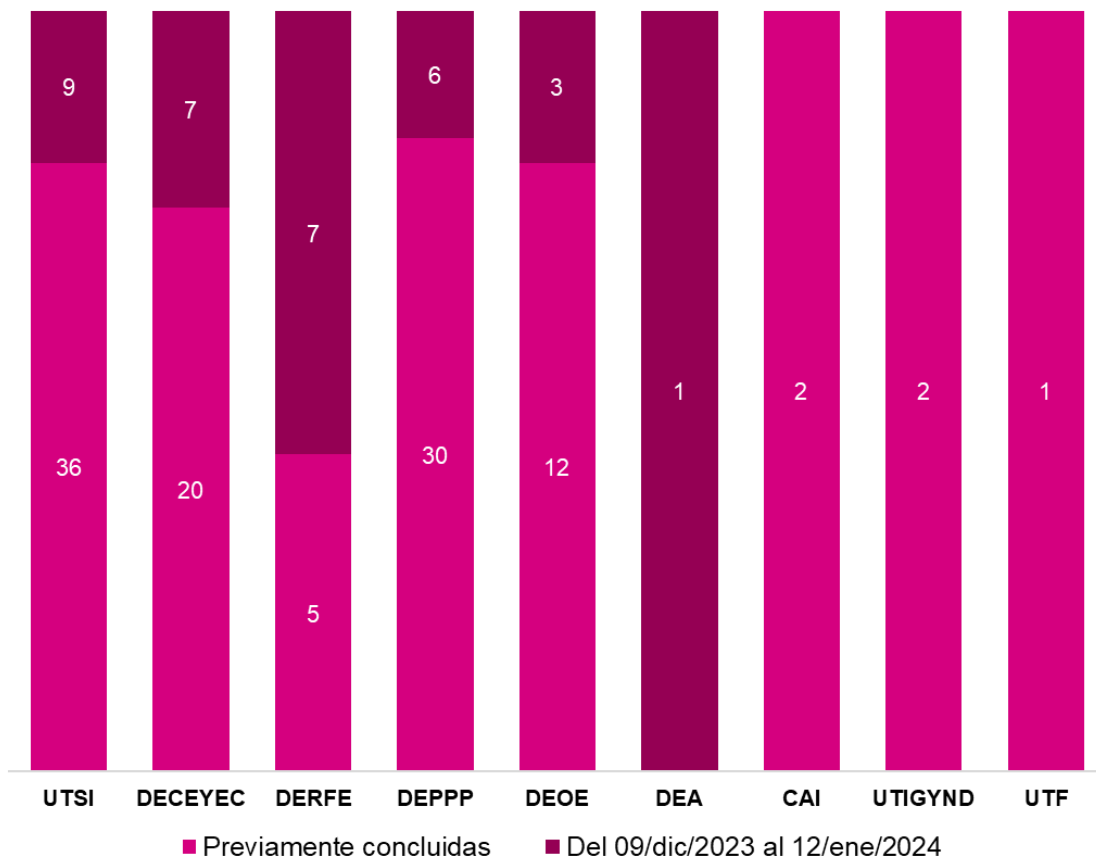

1.2 Actividades en ejecución

Al momento se encuentran en ejecución 149 actividades. El número de actividades en ejecución por UR se muestran en la Gráfica 3, donde destacan con mayor número de actividades en este estatus, la DEOE con 31 (20.81%), la DERFE con 23 (15.44%), la DEPPP con 21 (14.09%), la UTF con 19 (12.75%) y la DECEYEC con 17 (11.41%).


Gráfica 3
Total de actividades en ejecución por UR del PlyCPEF 2023-2024

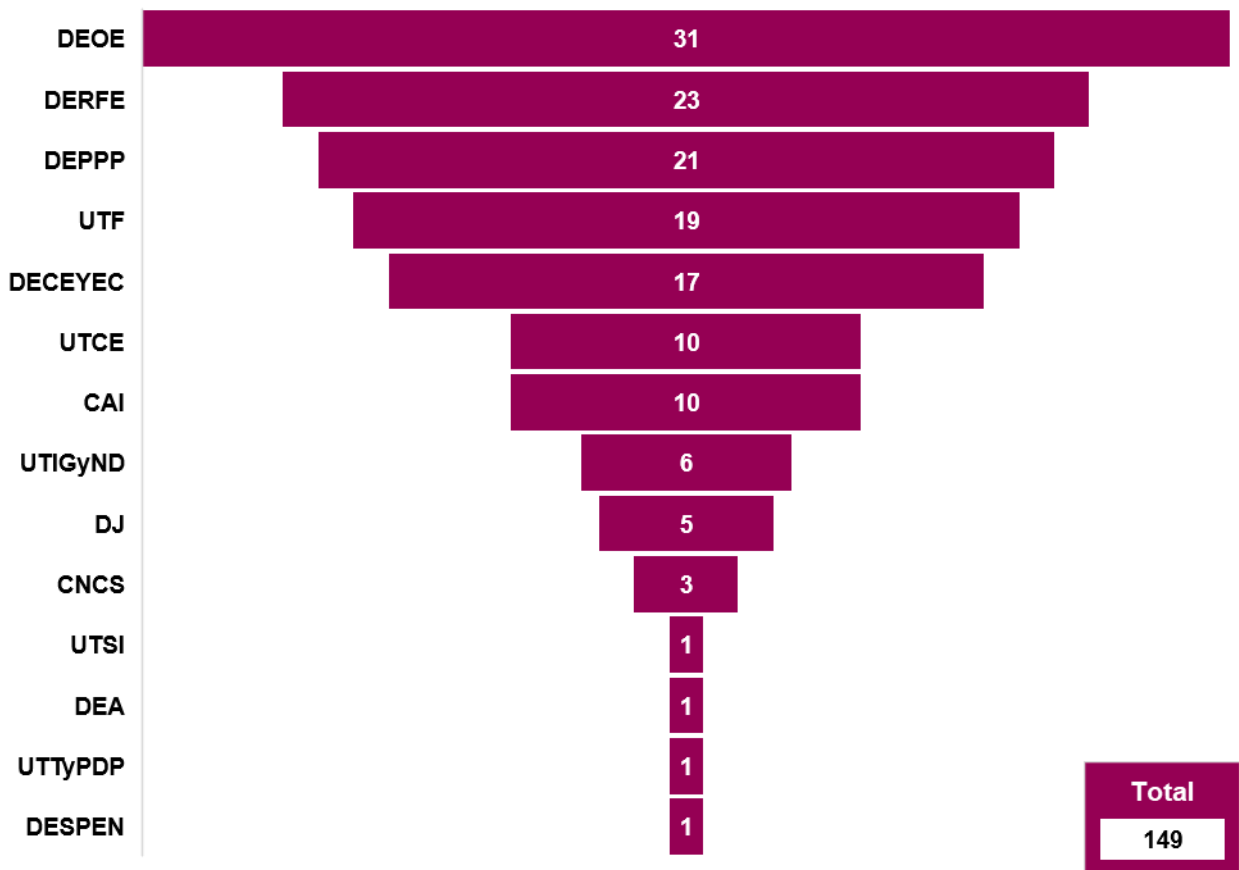

1.2.1 Actividades en ejecución, en tiempo

Por su parte, de las 149 actividades en ejecución, 138 (92.62%) se llevan a cabo conforme a las fechas establecidas, el desgregado por cada UR se muestra en la Gráfica 4.


Gráfica 4
Distribución absoluta del total de actividades en tiempo por UR del PlyCPEF 2023-2024

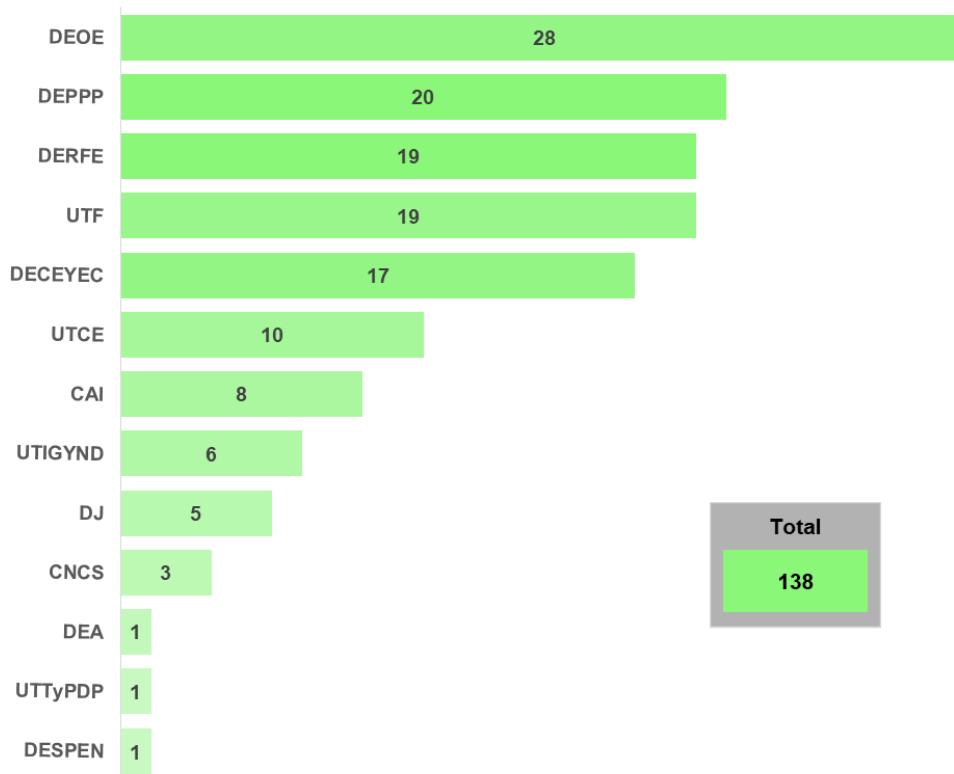

1.2.2 Actividades en ejecución desfasadas

De las 149 actividades que se encuentran en ejecución, 11 (7.38%) se encuentran con estatus de desfasadas respecto al periodo programado (Gráfica 5).

Gráfica 5
 Distribución absoluta del total de actividades desfasadas por UR del PlyCPEF 2023-2024

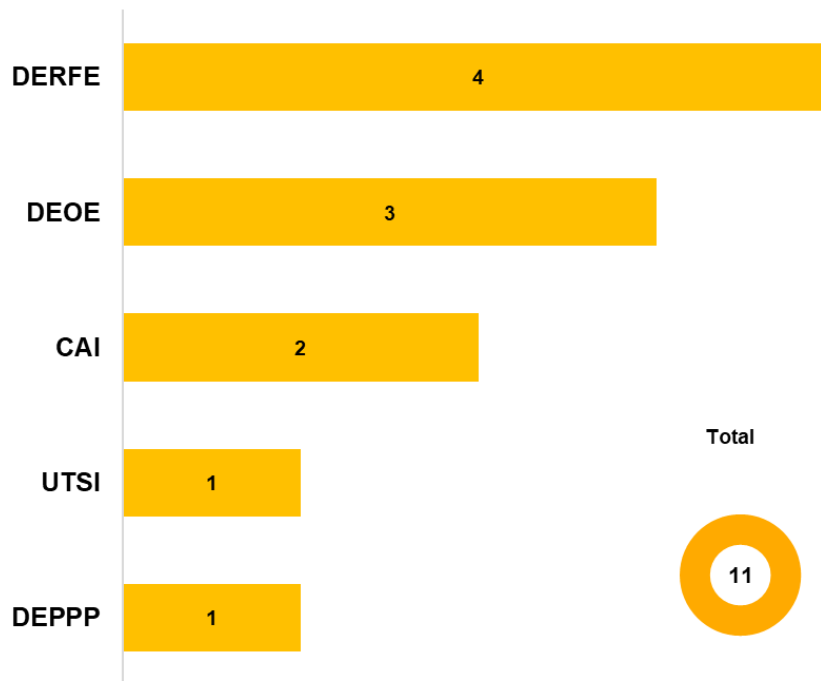

De las actividades que se encuentran con desfase, en el Cuadro 1 se describen las causas que lo originan, y en los casos en que sea procedente, las medidas adoptadas para llevarlas a término.

Cuadro 1
Total de actividades desfasadas por UR del PlyCPEF 2023-2024


CAI	
Actividad	Descripción desfase
Suscribir un instrumento de colaboración con la instancia internacional responsable de la operación del Fondo de Apoyo para la Observación Electoral 2024	Derivado del Acuerdo del Consejo General INE/CG683/2023 del pasado 15 de diciembre, la Coordinación de Asuntos Internacionales solicitará a la Junta General Ejecutiva la reactivación, así como financiamiento, del proyecto específico "D050310 Fondo de apoyo para la observación electoral y el acompañamiento técnico". En este momento, se está realizando un ajuste para dar cumplimiento a los resolutivos sexto, séptimo y octavo del mencionado Acuerdo.
Entregar los recursos a la instancia internacional responsable de la administración y operación	En espera la aprobación para la reactivación del proyecto, así como el ajuste a su presupuesto, del proyecto específico "D050310 Fondo de apoyo para la observación electoral y el acompañamiento técnico" por parte de la Junta General Ejecutiva.
DEOE	
Actividad	Descripción desfase
Supervisar la producción de la documentación electoral	<p>El 10 de enero de 2024 se sostuvo una reunión de trabajo con el impresor Talleres Gráficos de México (TGM) para hacer una revisión de los avances en la producción de la documentación sin emblemas. TGM indicó que ya se produjeron los "porta gafetes" y "etiquetas de colores de identificación cromática para empaque" e inició la impresión de los sobres. También entregó el calendario de producción y entregas del papel seguridad de las boletas, en el que se incluye un evento de arranque con la posible participación de autoridades superiores del Instituto.</p> <p>El 11 de enero de 2024 se sostuvo una reunión en las instalaciones de integración de materiales, con la línea de apoyo que produce los "Avisos de localización de casilla", en la que se comentaron algunos aspectos de las especificaciones y quedó de entregar las muestras definitivas para visto bueno. Además, presentó muestras de bolsas impresas que propone para la producción de las requeridas para la elección federal, entregará las muestras con las dimensiones requeridas entre el 15 y 16 de enero e iniciar con la producción con el visto bueno a pie de máquina.</p>
Supervisar la producción de los materiales electorales	<p>"Sello X": Se continúa con las pruebas de inyección para la adecuada calibración del molde, con el propósito de obtener las muestras que serán analizadas, para efectos del otorgamiento del visto bueno para inicio de producción de los sellos "X". Se estima que ésta inicie durante la segunda quincena de enero de 2024.</p> <p>"Marcadores de boletas" y de los "sujetadores de marcador": la producción continúa de acuerdo con lo programado.</p> <p>Materiales electorales que se adjudicaron a TGM, continúa la producción de las urnas de Presidencia, Senadurías y Diputaciones Federales, así como de las "mamparas especiales" y de las "cajas</p>

	<p>paquete electoral". Asimismo, está pendiente que TGM entregue las muestras para visto bueno para inicio de producción, de los siguientes materiales: "cinta de seguridad", "cajas paquete electoral Votomex" y "charolas contenedoras de sobres Votomex".</p>
<p>Dar seguimiento a las gestiones que realicen las juntas locales, para la firma de Convenios de Colaboración con las autoridades escolares de la entidad que corresponda.</p>	<ul style="list-style-type: none"> -25 entidades firmaron el Convenio firmado: BC., BCS, Camp., Coah., Col., Chis., Chih., Dgo., Gto., Hgo., Jal., Méx., Nay., NL, Oax., Pue., Qro., QRoo., SLP, Sin., Son., Tab., Tlaxc., Ver., Yuc. - Mich. Se solventaron las observaciones, se propuso la firma para el 30 de enero. - Tamps. Se está en espera de la fecha por parte de Gobierno del Estado. - Gro. por motivos de agenda del Gobierno Local, ajenos a la Junta Local Ejecutiva, no se efectuó el acto protocolario de firma del convenio de colaboración, coordinación y apoyo entre el gobierno del estado de Guerrero, el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de la entidad, programado para el día 10 de enero del presente año, sin embargo, se espera firmar el documento durante la semana en curso. - CDMX, el convenio se encuentra en la coordinación de Asuntos Jurídicos del gobierno local para la revisión y observación. - Zac. la JLE reporta que se encuentra en revisión por parte de la Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado. - Ags. firmó un Convenio Marco con el Gobierno y está en proceso de firma un convenio específico o adenda en materia de casillas. Se prevé su firma en el mes de enero. - Morelos firmó un Convenio Marco con el Gobierno y está en proceso de firmar un convenio específico o adenda en materia de casillas. Concluirá la firma de la adenda en marzo de 2024, cuando sean aprobados los listados de ubicación de casillas por los Consejo Distritales. <p>Las juntas locales ejecutivas de las entidades faltantes reportaron no considerar riesgo en las actividades de casillas.</p>
DEPPP	
Actividad	Descripción desfase
<p>Generar y cargar los testigos de grabación del monitoreo de noticieros para que la Institución de Educación Superior seleccionada aplique la metodología durante el periodo de precampaña.</p>	<p>Se ha realizado la entrega de testigos a la Universidad Autónoma de Nuevo León con corte al 11 de enero de 2024 conforme al catálogo aprobado, quedando pendiente la carga de los testigos de grabación.</p>

DERFE	
Actividad	Descripción desfase
Obtener los resultados de 1er VSR, VPPP	<p>Con corte a la fecha, se recibieron por parte de la Dirección de Productos y Servicios Electorales (DPSE) 7,404 registros para efectuar la Verificación de Situación Registral (VSR), los cuales se atendieron en su totalidad, resultando 5,335 con candidatos localizados en la base de datos del Padrón Electoral, y 2,069 sin candidatos.</p> <p>Se han presentado desfases en la entrega de información de las Personas en Prisión Preventiva por parte de los CEFERESOS y CERESOS, por lo que, la actividad no concluyó en el plazo establecido, se estima concluir en este mes de enero de 2024. Por otra parte, se tiene conocimiento que, a la fecha, no se encuentran firmados los Convenios de Colaboración entre el Instituto y las autoridades penitenciarias.</p>
Disponer del insumo para la LNEPP para la 1er Verificación de Situación Registral (VSR)	<p>Con corte a la fecha, del avance que se lleva en la integración y revisión de información recibida en la DERFE, se ha dispuesto un total de 7,409 registros, para que se lleve a cabo la VSR, información que corresponde a 6 entidades</p> <p>Se han presentado desfases en la entrega de información de las Personas en Prisión Preventiva por parte de los CEFERESOS y CERESOS, por lo que, la actividad no concluyó en el plazo establecido, se estima concluir en este mes de enero de 2024. Por otra parte, se tiene conocimiento que, a la fecha, no se encuentran firmados los Convenios de Colaboración entre el Instituto y las autoridades penitenciarias.</p>
Integrar y revisar la información de las Personas en Prisión Preventiva proporcionada por la SSPE	<p>Con corte a la fecha, se lleva a cabo la integración y revisión de los 45,195 registros que corresponden a los CERESOS de 27 entidades de un total de 31.</p> <p>En lo que respecta a la información de los CEFERESOS, se está integrando y revisando la información de la totalidad de las 14 entidades (6,077 registros), en razón que se siguen actualizando los datos biométricos y las fichas antropométricas.</p> <p>Se han presentado desfases en la entrega de información de las Personas en Prisión Preventiva por parte de los CEFERESOS y CERESOS, por lo que, la actividad no concluyó en el plazo establecido, se estima concluir en este mes de enero de 2024. Por otra parte, se tiene conocimiento que, a la fecha, no se encuentran firmados los Convenios de Colaboración entre el Instituto y las autoridades penitenciarias.</p>
Recibir la información de la SSPE de las PPP (Base de Datos nominativa e información biométrica)	<p>Con corte a la fecha se tiene un preliminar de 45,195 registros de Personas en Prisión Preventiva (PPP) correspondiente a CERESOS de 27 entidades de un total de 31, información que ha sido remitida por las Juntas Locales Ejecutivas.</p> <p>En lo que respecta a la recepción de información de los CEFERESOS, se tiene un preliminar de 6,077 registros de Personas en Prisión Preventiva correspondiente a la totalidad de</p>

	<p>las 14 entidades. Se sigue actualizando los datos biométricos y fichas antropométricas para concluir con la información.</p> <p>Se han presentado desfases en la entrega de información de las Personas en Prisión Preventiva por parte de los CEFERESOS y CERESOS, por lo que, la actividad no concluyó en el plazo establecido, se estima concluir en este mes de enero de 2024. Por otra parte, se tiene conocimiento que, a la fecha, no se encuentran firmados los Convenios de Colaboración entre el Instituto y las autoridades penitenciarias.</p>
UTSI	
Actividad	Descripción desfase
Sistema Integral de Fiscalización – Campaña: Verificar y validar los Componentes (Pruebas de aceptación).	De acuerdo con las solicitudes de cambio realizadas por el área usuaria, estas fueron analizadas por la Dirección de Sistemas, por lo que se ajustaron los paquetes de trabajo y la fecha de inicio de las pruebas de aceptación -de común acuerdo con el área usuaria- se ajustó para el 6 de febrero de 2024.

1.2.3 Actividades en riesgo

	<p>Actividad: <i>Suscribir un instrumento de colaboración con la instancia internacional responsable de la operación del Fondo de Apoyo para la Observación Electoral 2024</i></p>
	<p>Valoración: En proceso de preparación de los documentos administrativos que acompañarán la solicitud del Acuerdo para la reactivación del proyecto del Fondo de Apoyo para la Observación Electoral en la Cartera Institucional de Proyectos 2024, que en su caso aprobará la JGE durante el mes de enero.</p>
	<p>Actividad: <i>Entregar los recursos a la instancia internacional responsable de la administración y operación</i></p> <p>Valoración: La determinación del monto del recurso que será aprobado definirá la fecha de designación del mismo.</p>

1.3 Actividades por iniciar y por concluir

De las 610 actividades que conforman el PlyCPEF 2023-2024, 36 actividades se encuentran próximas a iniciar su ejecución en el periodo del 13 de enero a la fecha horizonte del 31 de enero, lo que representa un 5.90% respecto al total (Cuadro 2). El detalle puede consultarse en el Anexo 2.

Cuadro 2
Distribución de Actividades por iniciar su ejecución por UR

Unidad Responsable	TOTAL	UTSI	DECEYEC	DERFE	DEOE	UTF	CNCS
Actividades por iniciar	36	9	9	8	6	3	1

De las actividades que se tienen previstas concluyan, de acuerdo con la fecha de término que cada UR estableció son 32, las cuales se distribuyen de la siguiente forma (Cuadro 3) (se agrega el detalle en el Anexo 3):

Cuadro 3
Distribución de Actividades por concluir su ejecución por UR

Unidad Responsable	TOTAL	UTSI	DECEYEC	DERFE	DEPPP	DEOE	UTF	CAI
Actividades por concluir	32	9	7	6	4	3	2	1

1.4 Actividades que generan acuerdos o que dependen de aprobación de órganos desconcentrados

Se tienen programadas 57 actividades para aprobación de un acuerdo. Derivado de ello, al momento se cuenta con la aprobación acumulada de 36 (63.16%) acuerdos (Cuadro 4). Durante el periodo que se reporta se aprobaron dos acuerdos, uno por el CG y otro mediante 4 bloques del Comité de Radio y Televisión cuyo enlace para su consulta se ubica en el Anexo 4.

Cuadro 4
Distribución del número acumulado de acuerdos aprobados por UR

UR	TOTAL	CAI	DECEYEC	DEOE	DEPPP	UTF	DERFE	UTSI
Acuerdos Aprobados	36	1	1	8	16	1	5	4

Conclusiones

En el lapso del presente informe, que contempla el periodo del 09 de diciembre de 2023 al 12 de enero de 2024, se analizaron 290 actividades, que equivalen al (47.54%) respecto a las 610 actividades que integran el PlyCPEF 2023-2024.

De las 290 actividades analizadas, 149 se encuentran en ejecución y 141 han concluido; de éstas últimas, 33 corresponden al periodo reportado, 138 actividades se desarrollan dentro del periodo establecido y 11 fueron reportadas con desfase por las UR.

En el periodo comprendido, la CAI reportó que dos actividades presentan riesgo en su cumplimiento.

Durante el periodo reportado, se aprobaron dos acuerdos, por lo que a la fecha de corte se acumulan 36 acuerdos aprobados de los 57 que forman parte de las actividades del PlyCPEF 2023-2024.

Finalmente, para el periodo del 13 al 31 de enero de 2024, se tiene previsto que den inicio 36 actividades y que concluyan 32 actividades dentro de ese mismo periodo.

Anexo 1. Relación de actividades concluidas

ID	Proceso	Subproceso	UR	Actividad	Entregable	Valoración de la UR
18	Gestión por Procesos	Coordinación de Gestión por Procesos	DEA	Elaborar acuerdos de autorización para el arrendamiento de inmuebles. Elaborar acuerdos de autorización para adecuaciones de inmuebles.	Informe	Se atendió el 100% de las solicitudes enviadas por las JLE, JDE, DRMS y DP a la DOC y que, cumplieron con la norma aplicable El avance financiero describe los recursos ministrados, así como la devolución de recursos no ejercidos por algunas Juntas que, sin embargo, una vez sean conciliados los montos con la totalidad de las Juntas, Dirección de Obras y Conservación y Dirección de Recursos Financieros, se obtendrá el importe total de los recursos ejercidos por Distribución
83	Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero	Capacitación Electoral e Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo MEC	DECEYEC	Diseñar, producir y distribuir los materiales didácticos y de apoyo para la primera etapa de capacitación del VMRE a la JLE de la CDMX	Archivo electrónico	Los materiales didácticos y de apoyo producidos de la Primera Etapa de Capacitación Electoral aprobados por la Comisión de Capacitación y Organización Electoral se entregaron a la JLE de la CDMX el 11 de enero de 2023.
164	Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero	Capacitación Electoral e Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo MEC	DECEYEC	Elaborar los contenidos para la capacitación en el portal de las y los observadoras electorales	Archivo electrónico	Ya se encuentran en el Portal de Observadores y Observadoras Electorales los materiales de capacitación de dichas figuras.

ID	Proceso	Subproceso	UR	Actividad	Entregable	Valoración de la UR
227	Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Diseño de la Estrategia de Integración de Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	DECEYEC	Conformar ARE y ZORE (JDE)	Otro	Se realizó la conformación de ARE y ZORE en las 300 JDE.
246	Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Diseño de la Estrategia de Integración de Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	DECEYEC	Llevar a cabo la aplicación del Examen de conocimientos, habilidades y actitudes (JDE)	Otro	Los días 9 y 10 de diciembre, se aplicó el examen de conocimientos, habilidades y actitudes con corte al 14 de diciembre, 91,366 personas aspirantes se presentaron al Examen.
247	Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Diseño de la Estrategia de Integración de Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	DECEYEC	Entrega del listado de propuestas de Secciones de Estrategias Diferenciadas (SED) y Secciones con Cambio a la Propuesta de la Ruta de Visita (SCPRV) al CD	Otro	Las JDE entregaron el Listado de propuestas de SED y SCPRV a las y los integrantes del CD para su revisión y análisis (en gabinete y campo), a fin de que realicen observaciones a la JDE, en caso de considerarlo pertinente.
248	Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Diseño de la Estrategia de Integración de Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	DECEYEC	Llevar a cabo las entrevistas para seleccionar a SE (JDE)	Otro	Con corte al 20 de diciembre, 20,142 personas aspirantes fueron entrevistadas a nivel nacional para la figura de SE.

ID	Proceso	Subproceso	UR	Actividad	Entregable	Valoración de la UR
267	Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Diseño de la Estrategia de Integración de Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	DECEYEC	Llevar a cabo las entrevistas para seleccionar a CAE (JDE)	Otro	Con corte al 11 de enero, 73,276 personas aspirantes fueron entrevistadas a nivel nacional para la figura de CAE.
95	Planeación, aprobación y operación de los mecanismos de recolección de la Documentación Electoral al Término de la Jornada Electoral	Elaboración de la Guía para la Planeación e implementación de los mecanismos de recolección	DEOE	Elaborar y remitir a los consejos distritales del INE, la Guía y cronograma para la planeación e implementación de los mecanismos de recolección	Manual / Guía	Mediante la circular INE/DEOE/0119/2023, se remitió a las Vocalías Ejecutivas de las Juntas Locales el Documento de apoyo (guía) para la planeación, instrumentación y seguimiento de los Mecanismos de Recolección para el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024, en los que se dan a conocer las fechas y responsables que darán cumplimiento de manera sistemática a las actividades de preparación, aprobación, funcionamiento y seguimiento de los Mecanismos de Recolección, para el traslado y entrega de paquetes electorales en los órganos competentes del INE y los OPL. Con la solicitud de hacerlos del conocimiento de la Vocalía de Organización Electoral de la Junta Local, así como de los órganos subdelegacionales que coordinan.
96	Integración y Difusión de la Estadística Electoral	Difusión y Presentación de Resultados de la Estadística Electoral	DEOE	Elaborar el planteamiento inicial de requerimientos y propuesta de actualización del Sistema de Consulta de Resultados Electorales Federales y Locales	Propuesta	Se concluyó el reporte con las propuestas de actualizaciones, tanto del Sistema de Consulta de la Estadística Electoral (SICEE) como del chatbot Votobot, para la versión que contendrá los resultados del PEC 2023-2024.

ID	Proceso	Subproceso	UR	Actividad	Entregable	Valoración de la UR
384	Voto de las Personas en Prisión Preventiva	Determinación del número de Personas en Prisión Preventiva	DEOE	Solicitar la relación de personas en prisión preventiva reclusas en los centros penitenciarios participantes.	Oficio / Circular	Se entregó en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) el oficio de solicitud de la información, relativa a la relación de personas en prisión preventiva reclusas en los centros penitenciarios.
66	Administración de los Tiempos del Estado en Radio y Televisión en Periodo Ordinario	Asignación de los Tiempos en Materia Electoral en Radio y Televisión y Gestión de Transmisiones	DEPPP	Elaborar los modelos de pauta para la transmisión de mensajes en radio y televisión de partidos políticos y candidaturas independientes	Archivo electrónico	Se elaboraron los modelos de pauta para la transmisión de partidos políticos, tanto para las seis entidades que iniciaron proceso electoral local en el mes de noviembre, ocho que inician en diciembre de 2023 y dieciocho que iniciarán en enero de 2024.
67	Administración de los Tiempos del Estado en Radio y Televisión en Periodo Ordinario	Asignación de los Tiempos en Materia Electoral en Radio y Televisión y Gestión de Transmisiones	DEPPP	Elaborar y someter a consideración del Comité de Radio y Televisión el Acuerdo por el que se aprueban los modelos de distribución del tiempo asignado a los partidos políticos nacionales y locales, así como las pautas de transmisión de mensajes en radio y televisión que corresponden a los partidos políticos y candidaturas independientes	Acuerdo	Se elaboraron los modelos de pauta de partidos políticos nacionales y locales, así como las pautas integradas para el proceso electoral federal y 23 entidades coincidentes con el local. El primer bloque fue aprobado mediante Acuerdos con números: INE/ACRT/34/2023 al INE/ACRT/40/2023. Se modificaron las pautas del proceso electoral federal y las seis entidades del bloque 1, mediante Acuerdos identificados con las claves: INE/ACRT/45/2023 al INE/ACRT/51/2023. Asimismo, se aprobaron las pautas de ocho entidades correspondientes al segundo bloque mediante los Acuerdos INE/ACRT/52/2023 al INE/ACRT/59/2023. El tercer bloque de modelos y pautas, conformado por 9 entidades, fue aprobado mediante los Acuerdos INE/ACRT/61/2023 al INE/ACRT/69/2023 El cuarto bloque de modelos y pautas, conformado por 9 entidades, fue aprobado mediante los

ID	Proceso	Subproceso	UR	Actividad	Entregable	Valoración de la UR
						Acuerdos INE/ACRT/77/2023 al INE/ACRT/85/2023.
69	Administración de los Tiempos del Estado en Radio y Televisión en Periodo Ordinario	Asignación de los Tiempos en Materia Electoral en Radio y Televisión y Gestión de Transmisiones	DEPPP	Notificar las pautas para la transmisión de mensajes a las emisoras de radio y canales televisión que integran el Catálogo de medios para el Proceso Electoral Federal 2023-2024	Oficio / Circular	Han sido notificadas las pautas de Procesos Electorales Locales coincidentes con el Proceso Electoral Federal 2023-2024 de las treinta y dos entidades del país.
70	Administración de los Tiempos del Estado en Radio y Televisión en Periodo Ordinario	Asignación de los Tiempos en Materia Electoral en Radio y Televisión y Gestión de Transmisiones	DEPPP	Notificar a las autoridades que mandate el Acuerdo de pautas para la transmisión de mensajes en radio y televisión de partidos políticos, candidaturas independientes y autoridades electorales	Oficio / Circular	Han sido notificadas las pautas de Procesos Electorales Locales coincidentes con el Proceso Electoral Federal 2023-2024 de las treinta y dos entidades del país.
140	Registro de Plataformas Electorales, Coaliciones, Acuerdos de Participación y Candidaturas	Revisión del Cumplimiento de los Requisitos de Plataformas Electorales, Coaliciones o Acuerdos de Participación y Candidaturas	DEPPP	Verificar que los métodos de selección, que en su momento sean informados por los Partidos Políticos, se encuentren apegados a lo señalado en el Acuerdo del Consejo General respectivo, así como a la Ley Electoral y a la normativa interna de cada partido, y en su oportunidad rendir un	Informe	Informe presentado en la CPPP el 12 de diciembre de 2023 y se presentó en Sesión Ordinaria del CG el 15 de diciembre.

ID	Proceso	Subproceso	UR	Actividad	Entregable	Valoración de la UR
				Informe al Consejo General		
215	Registro de Plataformas Electorales, Coaliciones, Acuerdos de Participación y Candidaturas	Revisión del Cumplimiento de los Requisitos de Plataformas Electorales, Coaliciones o Acuerdos de Participación y Candidaturas	DEPPP	Recibir, revisar y analizar la documentación presentada por los Partidos Políticos que soliciten el registro de una Coalición, así como elaborar los Anteproyectos de Resolución respectivos	Resolución	Informe presentado en la CPPP el 12 de diciembre de 2023 y se presentó en Sesión Ordinaria del CG el 15 de diciembre.
153	Conformación del Padrón Electoral y Credencialización	Determinación de la Calidad y Validez del Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores	DERFE	Dar seguimiento a las actividades del Comité Técnico de Evaluación del Padrón Electoral encaminadas a la definición de su programa de trabajo.	Documento	El 15 de diciembre de 2023, en sesión ordinaria del Consejo General, se presentó el Programa de Trabajo del Comité Técnico de Evaluación del Padrón Electoral 2023-2024, previo acuerdo de la Comisión del Registro Federal de Electores.
196	Conformación del Padrón Electoral y Credencialización	Emisión de Listas Nominales de Electores	DERFE	Entregar la Lista Nominal de Electores a la UTSI para la preparación del sistema durante el mes de diciembre con corte al 30 de noviembre de 2023.	Oficio / Circular	Con fecha 6 de diciembre de 2023, con la participación de personal de la Oficialía Electoral, de la DECEYEC, UTSI y de la DERFE, se llevó a cabo el acto para disponer el insumo de la LNE a la UTSI, conformado por un total de 96,939,220 registros, con el propósito de llevar a cabo las pruebas de operación del Sistema de Primera Insaculación.

ID	Proceso	Subproceso	UR	Actividad	Entregable	Valoración de la UR
213	Conformación del Padrón Electoral y Credencialización	Captación de Trámites	DERFE	Solicitar la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) de las relaciones de Personas en Prisión Preventiva (PPP) (Base de Datos nominativa e información biométrica) con corte al 31/12/2023	Oficio / Circular	En cumplimiento a lo establecido en los "Lineamientos para la conformación de la Lista Nominal de Electores en Prisión Preventiva para el Proceso Electoral Federal y los Procesos Electorales Locales 2023-2024" en su numeral 10, mediante Oficio INE/CPT/DPSE/1546/2023, se solicitó a la DEOE la relación nominativa, fichas de registro e información biométrica de Personas en Prisión Preventiva con corte al 31 de diciembre de 2023.
214	Conformación del Padrón Electoral y Credencialización	Captación de Trámites	DERFE	Solicitar a la Dirección de Operaciones (DO) del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECyRD). las relaciones de PVA (Base de Datos nominativa) con corte al 31/12/2023	Oficio / Circular	Se solicitó la generación de la información con corte al 31 de diciembre de 2023, a DO-CECyRD mediante oficio número: INE/CPT/DPSE/1529/2023
229	Conformación del Padrón Electoral y Credencialización	Determinación de la Calidad y Validez del Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores	DERFE	Elaborar y someter a consideración de la Comisión del Registro Federal de Electores y la Comisión Nacional de Vigilancia el Programa de Trabajo del Comité Técnico de Evaluación del Padrón Electoral 2023-2024.	Documento	"El 1 de diciembre de 2023 se llevó a cabo la reunión con las representaciones partidistas en la Comisión Nacional de Vigilancia en la que las y los Asesores del Comité presentaron sus propuestas de estudios con el fin de retroalimentar e incorporar sus inquietudes al plan de trabajo. El 11 de diciembre de 2023 se aprobó por unanimidad en la Comisión del Registro Federal de Electores el Programa de Trabajo del COTEPE para su presentación al Consejo General el 15 de diciembre en sesión ordinaria."

ID	Proceso	Subproceso	UR	Actividad	Entregable	Valoración de la UR
238	Conformación del Padrón Electoral y Credencialización	Emisión de Listas Nominales de Electores	DERFE	Elaborar y someter a consideración del CG el proyecto de Acuerdo para aprobar los Lineamientos para la conformación de la Lista Nominal del Electorado en Prisión Preventiva.	Acuerdo	En sesión ordinaria del Consejo General del 15 de diciembre de 2023, se aprobó el Acuerdo de los "Lineamientos para la conformación de la Lista Nominal de Electores en prisión preventiva para el proceso electoral federal y los procesos electorales locales 2023-2024" y sus anexos.
271	Conformación del Padrón Electoral y Credencialización	Captación de Trámites	DERFE	Recibir la información de la Dirección de Operaciones (DO) del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECyRD) de las PVA (Base de Datos nominativa)	Correo electrónico	Se recibió por parte de DO CECyRD la base de datos nominativa de personas con voto anticipado.
245	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	UTSI	Sistema de Voto Electrónico por Internet (SIVEI): Envío a DEOE de Formatos Únicos de boleta electoral electrónica y documentación para modalidad electrónica (PEF y PEL)	Informe	Se recibieron y remitieron a DEOE los Formatos Únicos de Morelos y Estado de México faltantes.
249	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	UTSI	Sistema de Validación de Cuentas de Usuario de SE y CAE: Verificar y validar los Componentes (Pruebas de aceptación).	Oficio / Circular	Las pruebas de aceptación por parte del área usuaria se realizaron de acuerdo a lo planeado, sin incidentes relevantes que reportar.

ID	Proceso	Subproceso	UR	Actividad	Entregable	Valoración de la UR
256	Gestión de TIC	Administración de Proyectos de TIC	UTSI	Sistema de Cómputos Distritales: Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC (Requerimientos de Servicio de TIC).	Documento	Se recibieron los requerimientos para el sistema por parte del área usuaria, los cuales son el insumo para que una vez analizados se generen los paquetes de trabajo y el plan de trabajo.
257	Gestión de TIC	Administración de Proyectos de TIC	UTSI	Sistema de Cómputos Web: Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC (Requerimientos de Servicio de TIC).	Documento	Se recibieron los requerimientos para el sistema por parte del área usuaria, los cuales son el insumo para que una vez analizados se generen los paquetes de trabajo y el plan de trabajo.
258	Gestión de TIC	Administración de Proyectos de TIC	UTSI	Sistema de Registro de Actas: Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC (Requerimientos de Servicio de TIC).	Documento	Se recibieron los requerimientos para el sistema por parte del área usuaria, los cuales son el insumo para que una vez analizados se generen los paquetes de trabajo y el plan de trabajo.
259	Gestión de TIC	Administración de Proyectos de TIC	UTSI	Sistema de Cómputos Tribunal: Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC (Requerimientos de Servicio de TIC).	Documento	Se recibieron los requerimientos para el sistema por parte del área usuaria, los cuales son el insumo para que una vez analizados se generen los paquetes de trabajo y el plan de trabajo.
268	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	UTSI	Sistema de Validación de Cuentas de Usuario de SE y CAE: Liberar (Producción).	Oficio / Circular	El sistema inició operación de acuerdo a la fecha acordada con el área usuaria.
277	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	UTSI	Sistema Conoce a tu SE y CAE: Verificar y validar los Componentes (Pruebas de aceptación).	Oficio / Circular	Las pruebas iniciaron el 4 de diciembre de 2023, actualmente se están revisando los últimos hallazgos del usuario.
278	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	UTSI	Sistema de Sustitución de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores Asistentes	Oficio / Circular	Se dio inicio las pruebas de acceso y simulacros, que se llevarán a cabo los días 8 y 10 de enero de 2023.

ID	Proceso	Subproceso	UR	Actividad	Entregable	Valoración de la UR
				Electoral: Verificar y validar los Componentes (Pruebas de aceptación).		

Anexo 2. Relación de actividades por iniciar en el PlyCPEF 2023-2024

ID	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Fecha de Inicio
320	Atención a medios de comunicación	Realización del taller nacional de periodistas	Organizar talleres que faciliten la cobertura que realizan los medios de comunicación con respecto a las actividades que realiza el INE antes, durante y después de la Jornada Electoral, para contribuir a la conformación de una opinión pública informada y mejorar la comprensión de las y los representantes de los medios de comunicación	CNCS	29/01/2024
287	Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Diseño de la Estrategia de Integración de Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Designar a las y los SE por parte del CD	DECEYEC	13/01/2024
288	Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Diseño de la Estrategia de Integración de Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Designar a las y los CAE por parte del CD	DECEYEC	13/01/2024
297	Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Diseño de la Estrategia de Integración de Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Revisar, corregir y validar los materiales didácticos elaborados por los OPL para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla	DECEYEC	15/01/2024
299	Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Diseño de la Estrategia de Integración de Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Remitir, vía correo electrónico, las llaves digitales definitivas a los titulares de las Vocalías Ejecutivas y de Capacitación Electoral y Educación Cívica de las juntas distritales ejecutivas a efecto de llevar a cabo el Proceso de 1a insaculación	DECEYEC	15/01/2024
301	Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Diseño de la Estrategia de Integración de Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Coordinar los trabajos de las y los SE en todo su periodo de contratación (JDE)	DECEYEC	16/01/2024
302	Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Diseño de la Estrategia de Integración de Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Evaluar el desempeño de las figuras de SE (JDE)	DECEYEC	16/01/2024
313	Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Diseño de la Estrategia de Integración de Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Coordinar los trabajos de las y los CAE en todo su periodo de contratación (JDE)	DECEYEC	24/01/2024

ID	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Fecha de Inicio
314	Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Diseño de la Estrategia de Integración de Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Evaluar el desempeño de las figuras de CAE (JDE)	DECEYEC	24/01/2024
316	Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Diseño de la Estrategia de Integración de Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Atender las solicitudes para nuevas convocatorias (DECEYEC)	DECEYEC	25/01/2024
290	Asistencia Electoral	Programa de Asistencia Electoral	Dar seguimiento al cumplimiento de las actividades del Programa de Asistencia Electoral	DEOE	14/01/2024
293	Implementación y Operación del SIJE	Elaboración de Documentos Normativos	Elaborar el Manual de Operación del SIJE y presentarlo ante la comisión que corresponda	DEOE	15/01/2024
295	Gestión para la Ubicación, Equipamiento y Acondicionamiento de Casillas Electorales	Ubicación, Equipamiento y Acondicionamiento de Casillas	Dar seguimiento a los recorridos de las Juntas Ejecutivas por las secciones de los distritos para localizar los domicilios donde se ubicarán las casillas	DEOE	15/01/2024
296	Gestión para la Ubicación, Equipamiento y Acondicionamiento de Casillas Electorales	Ubicación, Equipamiento y Acondicionamiento de Casillas	Dar seguimiento al equipamiento y acondicionamiento de los domicilios para instalar las casillas electorales.	DEOE	15/01/2024
385	Voto Anticipado en Territorio Nacional	Generación de invitaciones	Elaborar y remitir a las juntas locales ejecutivas las invitaciones a las personas interesadas para participar en el voto anticipado en territorio nacional	DEOE	27/01/2024
423	Voto de las Personas en Prisión Preventiva	Generación de invitaciones	Elaborar las invitaciones personalizadas para su entrega a las personas en prisión preventiva.	DEOE	23/01/2024
272	Conformación del Padrón Electoral y Credencialización	Captación de Trámites	Generar y enviar las SIILNEVA a las JLE.	DERFE	27/01/2024
292	Conteos Rápidos Institucionales	Ejecución y Emisión de Resultados del Conteo Rápido	Dar seguimiento a la operación del Comité Técnico Asesor para el Conteo Rápido.	DERFE	15/01/2024
294	Conformación del Padrón Electoral y Credencialización	Determinación de la Calidad y Validez del Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores	Realizar recorrido cartográfico, operativo de campo, estimar indicadores y elaborar el Informe de Resultados de la Verificación Nacional Muestral 2023-2024.	DERFE	15/01/2024
306	Conformación del Padrón Electoral y Credencialización	Emisión de Listas Nominales de Electores	Generar y proporcionar los archivos de la Lista Nominal para realizar la insaculación del 13% de los ciudadanos de cada sección electoral que obtuvieron su Credencial para Votar con Fotografía, con corte al 15 de enero de 2024.	DERFE	22/01/2024

ID	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Fecha de Inicio	
307	Conformación del Padrón Electoral y Credencialización	Emisión de Listas Nominales de Electores	Generar la Lista Nominal de Electores para Revisión.	DERFE	23/01/2024	
308	Conformación del Padrón Electoral y Credencialización	Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar	Informar a la Comisión Nacional de Vigilancia sobre el número de Credenciales para Votar que serán generadas, producto de una resolución favorable de una Instancia Administrativa o una Demanda de Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano.	DERFE	23/01/2024	
309	Conformación del Padrón Electoral y Credencialización	Emisión de Listas Nominales de Electores	Generar y enviar las SIILNEPP a las JLE.	DERFE	23/01/2024	
322	Conformación del Padrón Electoral y Credencialización	Captación de Trámites	Recibir los formatos de SIILNEPP firmados por las PPP, archivos, PDF y originales.	DERFE	26/01/2024	
304	Fiscalización del Proceso Electoral	Fiscalización Ciudadano, Campaña y Electorales	de Apoyo Precampaña, Observadores	Notificar a los partidos políticos, y a las y los aspirantes a candidaturas independientes, la existencia de errores u omisiones en los informes de precampaña o apoyo de la ciudadanía.	UTF	21/01/2024
317	Fiscalización del Proceso Electoral	Fiscalización Ciudadano, Campaña y Electorales	de Apoyo Precampaña, Observadores	Recibir de los partidos políticos y aspirantes a candidaturas independientes las respuestas a los oficios de errores y omisiones de precampaña.	UTF	28/01/2024
319	Fiscalización del Proceso Electoral	Fiscalización Ciudadano, Campaña y Electorales	de Apoyo Precampaña, Observadores	Elaborar y someter a consideración de la Comisión de Fiscalización el dictamen y proyecto de resolución relativo a los informes de precampaña y obtención del apoyo de la ciudadanía, y proponer en su caso, las sanciones que procedan conforme a la normatividad aplicable, para su posterior presentación al Consejo General.	UTF	29/01/2024
291	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	Sistema de Primera Insaculación: Verificar y validar los Componentes (Pruebas de aceptación).	UTSI	15/01/2024	
300	Gestión de TIC	Administración de Proyectos de TIC	Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE): Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC (Requerimientos de Servicio de TIC).	UTSI	16/01/2024	

ID	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Fecha de Inicio
305	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	Sistema de Mecanismos de Garantía de Calidad a la Primera Etapa de Capacitación: Verificar y validar los Componentes (Pruebas de aceptación).	UTSI	22/01/2024
312	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	Sistema de Sustitución de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores Asistentes Electorales: Liberar (Producción).	UTSI	24/01/2024
315	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación: Verificar y validar los Componentes (Pruebas de aceptación).	UTSI	25/01/2024
318	Gestión de TIC	Administración de Proyectos de TIC	Sistema de Candidatas y Candidatos, Conóceles: Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC (Requerimientos de Servicio de TIC).	UTSI	29/01/2024
321	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	Sistema Conoce a tu SE y CAE: Liberar (Producción).	UTSI	30/01/2024
323	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores: Verificar y validar los Componentes (Pruebas de aceptación).	UTSI	31/01/2024
390	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia: Liberar (Producción).	UTSI	22/01/2024

Anexo 3. Relación de actividades por concluir en el PlyCPEF 2023-2024

ID	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Fecha de Término	
194	Creación y Seguimiento del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral	Creación del Fondo de Observación Electoral	Apoyo a la	Suscribir un instrumento de colaboración con la instancia internacional responsable de la operación del Fondo de Apoyo para la Observación Electoral 2024	CAI	31/01/24
168	Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Diseño de la Estrategia de Mesas Receptoras de Capacitación Electoral	Integración de Votación y	Reclutar, Seleccionar y contratar a SE y CAE	DECEYEC	13/01/24
169	Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Diseño de la Estrategia de Mesas Receptoras de Capacitación Electoral	Integración de Votación y	Dar seguimiento a las actividades de los Mecanismos de Garantía de calidad del reclutamiento, selección y contratación de SE y CAE del Multisistema ELEC 2024 aplicados por la Junta Local Ejecutiva	DECEYEC	13/01/24
176	Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Diseño de la Estrategia de Mesas Receptoras de Capacitación Electoral	Integración de Votación y	Dar seguimiento a las actividades de los Mecanismos de Garantía de calidad del reclutamiento, selección y contratación de SE y CAE del Multisistema ELEC 2024 aplicados por el Consejo Local	DECEYEC	13/01/24
177	Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Diseño de la Estrategia de Mesas Receptoras de Capacitación Electoral	Integración de Votación y	Dar seguimiento a las actividades de los Mecanismos de Garantía de calidad del reclutamiento, selección y contratación de SE y CAE del Multisistema ELEC 2024 aplicados por el Consejo Distrital	DECEYEC	13/01/24
178	Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Diseño de la Estrategia de Mesas Receptoras de Capacitación Electoral	Integración de Votación y	Dar seguimiento a las actividades de los Mecanismos de Garantía de calidad del reclutamiento, selección y contratación de SE y CAE del Multisistema ELEC 2024 aplicados por Oficinas Centrales	DECEYEC	13/01/24
287	Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Diseño de la Estrategia de Mesas Receptoras de Capacitación Electoral	Integración de Votación y	Designar a las y los SE por parte del CD	DECEYEC	13/01/24
288	Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Diseño de la Estrategia de Mesas Receptoras de Capacitación Electoral	Integración de Votación y	Designar a las y los CAE por parte del CD	DECEYEC	13/01/24

ID	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Fecha de Término
341	Voto Anticipado en Territorio Nacional	Seguimiento a la implementación del Voto Anticipado	Dar seguimiento a la aprobación del acuerdo por el que se autoriza al personal de las JDE, llevar a cabo visitas domiciliarias para entrega de invitaciones, recopilación de solicitudes individuales de inscripción a la Lista Nominal de Electores con Voto Anticipado; y de votación anticipada	DEOE	30/01/24
385	Voto Anticipado en Territorio Nacional	Generación de invitaciones	Elaborar y remitir a las juntas locales ejecutivas las invitaciones a las personas interesadas para participar en el voto anticipado en territorio nacional	DEOE	31/01/24
423	Voto de las Personas en Prisión Preventiva	Generación de invitaciones	Elaborar las invitaciones personalizadas para su entrega a las personas en prisión preventiva.	DEOE	24/01/24
225	Administración de los Tiempos del Estado en Radio y Televisión en Periodo Ordinario	Asignación de los Tiempos en Materia Electoral en Radio y Televisión y Gestión de Transmisiones	Elaborar y publicar los informes de los resultados del monitoreo de noticieros durante el periodo de precampaña conforme a la metodología aprobada	DEPPP	15/01/24
254	Registro de Plataformas Electorales, Coaliciones, Acuerdos de Participación y Candidaturas	Revisión del Cumplimiento de los Requisitos de Plataformas Electorales, Coaliciones o Acuerdos de Participación y Candidaturas	Elaborar y someter a consideración del Consejo General los Proyectos de Acuerdo para registrar las plataformas electorales de los Partidos Políticos, previa revisión y análisis	DEPPP	31/01/24
279	Registro de Plataformas Electorales, Coaliciones, Acuerdos de Participación y Candidaturas	Revisión del Cumplimiento de los Requisitos de Plataformas Electorales, Coaliciones o Acuerdos de Participación y Candidaturas	Difundir con anticipación los plazos para el registro de candidaturas a Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, Senadurías y Diputaciones Federales	DEPPP	15/01/24

ID	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Fecha de Término
298	Administración de los Tiempos del Estado en Radio y Televisión en Periodo Ordinario	Asignación de los Tiempos en Materia Electoral en Radio y Televisión y Gestión de Transmisiones	Para la elaboración del acuerdo que se presentará ante el CG, recibir, analizar y verificar que las solicitudes de los entes públicos se apeguen a los conceptos de salud, educación o protección civil, así como a los criterios jurisdiccionales y administrativos para su difusión, desde el inicio de las campañas y hasta el fin de la jornada electoral, con la finalidad de no vulnerar la prohibición constitucional de difundir propaganda gubernamental en dicho periodo. Asimismo, verificar que las solicitudes se presenten a más tardar con al menos 30 días naturales de anticipación al inicio de las campañas (federales o locales) y que se acompañen del formulario aprobado en el Acuerdo INE/CG03/2017	DEPPP	31/01/24
33	Conformación del Padrón Electoral y Credencialización	Captación de Trámites	Atender los trámites de la ciudadanía que acuden a los Módulos de Atención Ciudadana a inscribirse y para actualizar su situación registral en el Padrón Electoral, durante la Campaña Anual Intensa 2023-2024.	DERFE	22/01/24
234	Actualización de la Geografía Electoral	Georreferenciación Ciudadana	Generar los archivos de conformación de secciones electorales con casilla extraordinaria para la primera insaculación.	DERFE	31/01/24
272	Conformación del Padrón Electoral y Credencialización	Captación de Trámites	Generar y enviar las Solicitudes Individuales de Inscripción a la Lista Nominal del Electorado con Voto Anticipado a las JLE.	DERFE	31/01/24
286	Conformación del Padrón Electoral y Credencialización	Captación de Trámites	Obtener los resultados de Confronta de Biométricos	DERFE	22/01/24

ID	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Fecha de Término
306	Conformación del Padrón Electoral y Credencialización	Emisión de Listas Nominales de Electores	Generar y proporcionar los archivos de la Lista Nominal para realizar la insaculación del 13% de los ciudadanos de cada sección electoral que obtuvieron su Credencial para Votar con Fotografía, con corte al 15 de enero de 2024.	DERFE	26/01/24
309	Conformación del Padrón Electoral y Credencialización	Emisión de Listas Nominales de Electores	Generar y enviar las Solicitudes Individuales de Inscripción a la Lista Nominal del Electorado con Prisión Preventiva a las JLE.	DERFE	24/01/24
13	Fiscalización del Proceso Electoral	Fiscalización de Apoyo Ciudadano, Precampaña, Campaña y Observadores Electorales	Elaborar la planeación estratégica con enfoque de riesgos para la revisión del apoyo ciudadano y precampaña del Proceso Electoral Concurrente de conformidad a los plazos establecidos en los acuerdos emitidos por el Consejo General.	UTF	19/01/24
16	Fiscalización del Proceso Electoral	Fiscalización de Apoyo Ciudadano, Precampaña, Campaña y Observadores Electorales	Presentar a la Comisión de Fiscalización un programa de trabajo de la fiscalización de apoyo de la ciudadanía y precampañas de manera conjunta, mismo que deberá incluir la estrategia de capacitación, asesoría y acompañamiento a los partidos políticos, a las precandidaturas, así como a las y los aspirantes a una candidatura independiente.	UTF	31/01/24
291	Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	Sistema de Primera Insaculación: Verificar y validar los Componentes (Pruebas de aceptación).	UTSI	15/01/24
300	Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Administración de Proyectos de TIC	Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE): Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC (Requerimientos de Servicio de TIC).	UTSI	16/01/24
305	Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	Sistema de Mecanismos de Garantía de Calidad a la Primera Etapa de Capacitación: Verificar y validar los Componentes (Pruebas de aceptación).	UTSI	26/01/24

ID	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Fecha de Término
312	Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	Sistema de Sustitución de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores Asistentes Electorales: Liberar (Producción).	UTSI	24/01/24
315	Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación: Verificar y validar los Componentes (Pruebas de aceptación).	UTSI	25/01/24
318	Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones	Administración de Proyectos de TIC	Sistema de Candidatas y Candidatos, Conóceles: Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC (Requerimientos de Servicio de TIC).	UTSI	29/01/24
321	Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	Sistema Conoce a tu SE y CAE: Liberar (Producción).	UTSI	30/01/24
323	Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores: Verificar y validar los Componentes (Pruebas de aceptación).	UTSI	31/01/24
390	Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia: Liberar (Producción).	UTSI	22/01/24

Anexo 4. Relación de acuerdos aprobados, programados en el PlyCPEF 2023-2024

UR	Acuerdos	Fecha de aprobación	Núm. de Acuerdo	URL
DEPPP	Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se determina el mecanismo para la aplicación de la fórmula de asignación de las curules y los escaños por el principio de representación proporcional en el Congreso de la Unión, que correspondan a los Partidos Políticos Nacionales con base en los resultados que obtengan en la Jornada Electoral a celebrarse el dos de junio de dos mil veinticuatro. (Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos)	11/12/2023	Aprobado mediante 4 bloques.	https://www.ine.mx/9a-sesion-ordinaria-del-comite-de-radio-y-television-26-de-septiembre-de-2023/ https://www.ine.mx/10a-sesion-ordinaria-del-comite-de-radio-y-television-27-de-octubre-de-2023/ https://www.ine.mx/11a-primera-sesion-ordinaria-comite-de-radio-y-television-29-de-noviembre-de-2023/ https://www.ine.mx/10a-sesion-extraordinaria-del-comite-de-radio-y-television-12-de-diciembre-de-2023/
DERFE	Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los “Lineamientos para la conformación de la Lista Nominal de Electores en prisión preventiva para el proceso electoral federal y los procesos electorales locales 2023-2024” y sus anexos. (Comisión del Registro Federal de Electores)	15/12/2023	INE/CG672/2023	https://repositoriodocumental.ine.mx/mlui/handle/123456789/161898
