



Séptimo Informe Parcial

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2023-2024

Abril 2024

Glosario

CG / Consejo General	Consejo General del Instituto Nacional Electoral
CAE	Capacitador/a Asistente Electoral
CAI	Coordinación de Asuntos Internacionales
CCOE	Comisión de Capacitación y Organización Electoral
CNCS	Coordinación Nacional de Comunicación Social
DEA	Dirección Ejecutiva de Administración
DECEYEC	Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
DEOE	Dirección Ejecutiva de Organización Electoral
DEPPP	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos
DERFE	Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores
DESPEN	Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional
DJ	Dirección Jurídica
DO-CECyRD	Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores
Instituto/INE	Instituto Nacional Electoral
JD	Junta Distrital Ejecutiva
Junta/JGE	Junta General Ejecutiva
LGIPE	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
Metodología de Seguimiento	Metodología para el Seguimiento al Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2023-2024
OPL	Organismo(s) Público(s) Local(es)
PEF	Proceso Electoral Federal
PEL	Proceso Electoral Local
PlyCPEF 2023 - 2024	Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2023-2024
RE	Reglamento de Elecciones
SE	Supervisor/a Electoral

TGM	Talleres Gráficos de México
UR	Unidades Responsables: Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas del INE
UTCE	Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral
UTF	Unidad Técnica de Fiscalización
UTIGyND	Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación
UTSI	Unidad Técnica de Servicios de Informática
UTTyPDP	Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales

Índice

Contenido

Glosario	2
Índice	4
Introducción	5
1. Análisis cuantitativo y cualitativo	6
1.1 Actividades concluidas	7
1.2 Actividades en ejecución	8
1.2.1 Actividades en ejecución, en tiempo	9
1.2.2 Actividades en ejecución desfasadas	10
1.2.3 Actividades en riesgo	13
1.3 Actividades por iniciar y por concluir	13
1.4 Actividades que generan acuerdos o que dependen de aprobación de órganos desconcentrados	14
Conclusiones	15

Introducción

El 20 de julio de 2023, previo al inicio del Proceso Electoral Federal 2023-2024, el Consejo General, mediante Acuerdo INE/CG441/2023 aprobó el PlyCPEF 2023-2024 a propuesta de la Junta.

En cumplimiento al punto segundo del acuerdo referido, el 18 de septiembre la DEOE presentó ante las y los integrantes de la CCOE la Metodología de Seguimiento, que permitirá llevar el control y seguimiento de las actividades, así como la presentación de los informes correspondientes ante el Consejo General.

En dicho documento se establece que la DEOE elaborará informes mensuales, con las actividades que forman parte del PlyCPEF 2023-2024, detallando el estatus en el que se encuentran: concluidas, en ejecución (en tiempo, desfasadas y en riesgo), así como las actividades que están próximas a concluir y las que están por iniciar, para su presentación a los integrantes de la CCOE.

El Sexto Informe Parcial, inmediato anterior al que aquí se integra, fue elaborado para su presentación a la CCOE con los avances reportados por las UR para el periodo del 17 de febrero al 15 de marzo, y fue actualizado para su presentación ante CG contemplando el periodo del 17 de febrero al 22 de marzo.

Por lo anterior, el presente informe contempla el avance reportado por las Unidades Responsables abarcando el periodo del 23 de marzo al 19 de abril y, una vez que sea recibido y aprobado por la CCOE, se actualizará a la fecha de corte más cercana a su presentación ante CG en apego a la Metodología de Seguimiento.

La fuente de información es la reportada por cada una de las UR en el aplicativo de seguimiento en forma semanal, quienes emiten sus propias valoraciones.

Séptimo informe parcial del Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2023-2024. Actividades correspondientes al periodo del 23 de marzo al 19 de abril de 2024.


1. Análisis cuantitativo y cualitativo

El PlyCPEF 2023-2024 fue aprobado por CG con un total de 612 actividades, a la fecha de corte del periodo que se reporta, han sido procedentes seis solicitudes de incorporación y tres solicitudes de desincorporación por lo que, a la fecha de corte del presente documento, al PlyCPEF lo integran un total de 615 actividades.

Al periodo, se tiene el siguiente avance general:

- 343 (55.77%) actividades están concluidas, 169 (27.48%) actividades están en ejecución y 103 (16.75%) actividades no han iniciado (Gráfica 1).

Gráfica 1
Distribución relativa y absoluta del avance general de actividades del PlyCPEF 2023-2024

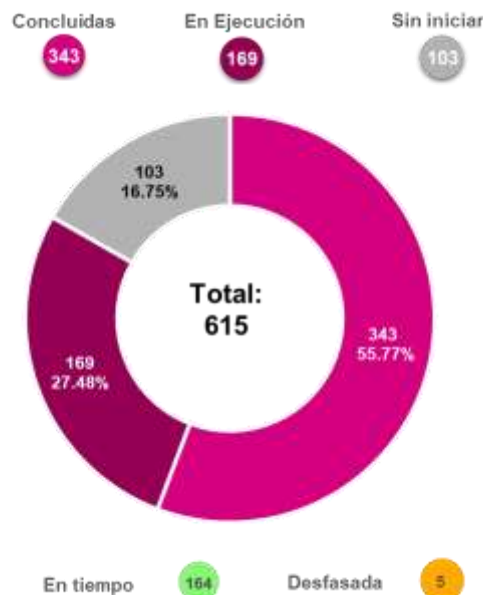


1.1 Actividades concluidas

De las 615 actividades se ha concluido un acumulado de 343 actividades, lo que representa 55.77% del total de actividades programadas.


Dentro del periodo que se reporta concluyeron 72 actividades. Por UR concluyeron conforme a lo siguiente: la DECEYEC con 24 (33.33%), la DERFE con 18 (25.00%), la UTSI con 18 (25.00%), la DEOE con nueve (12.50%), la UTF con dos (2.78%) y la CAI con una (1.39%). Los porcentajes se calculan respecto al total de actividades del periodo (Gráfica 2). El detalle de las actividades concluidas se muestra en el Anexo 1.

Gráfica 2
Distribución absoluta de actividades concluidas por UR del PlyCPEF 2023-2024

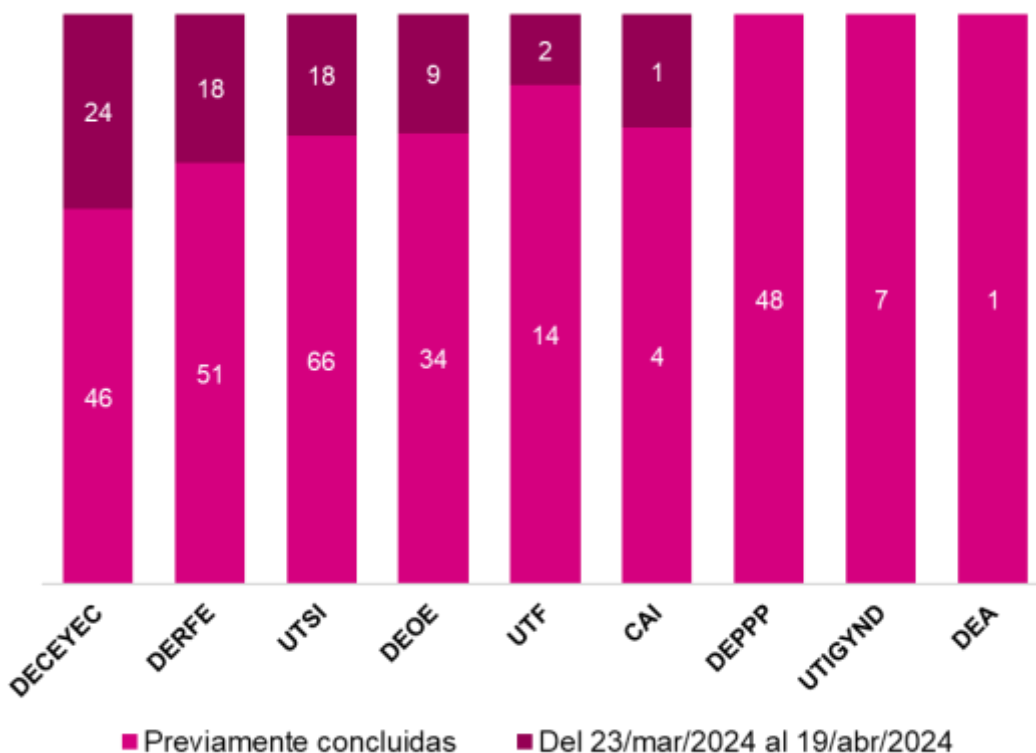

1.2 Actividades en ejecución


Al momento se encuentran en ejecución 169 actividades. El número de actividades en ejecución por UR se muestran en la Gráfica 3, donde destacan con mayor número de actividades en este estatus, la DEOE con 41 (24.26%), la DECEYEC con 29 (17.16%), la DERFE con 23 (13.61%) y la DEPPP con 19 (11.24%).

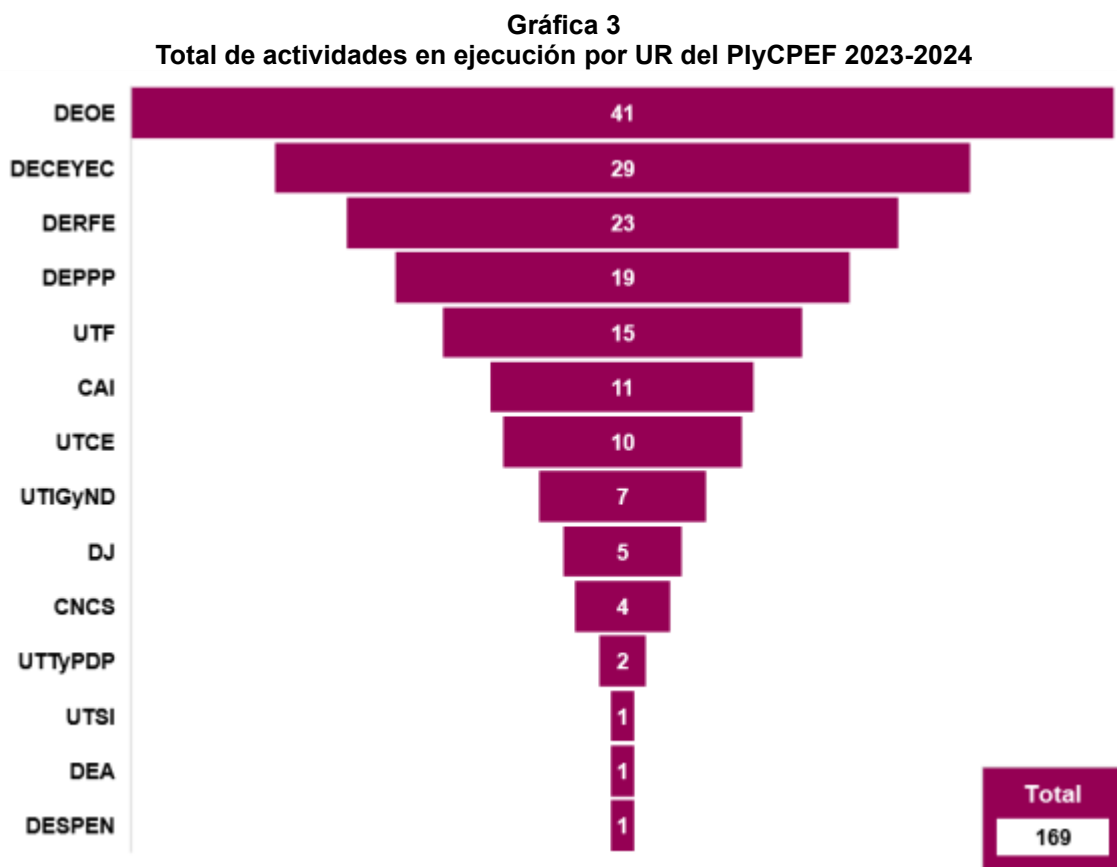

1.2.1 Actividades en ejecución, en tiempo

Por su parte, de las 169 actividades en ejecución, 164 (97.04%) se llevan a cabo conforme a las fechas establecidas, el desagregado por cada UR se muestra en la Gráfica 4.


Gráfica 4
Distribución absoluta del total de actividades en tiempo por UR del PlyCPEF 2023-2024

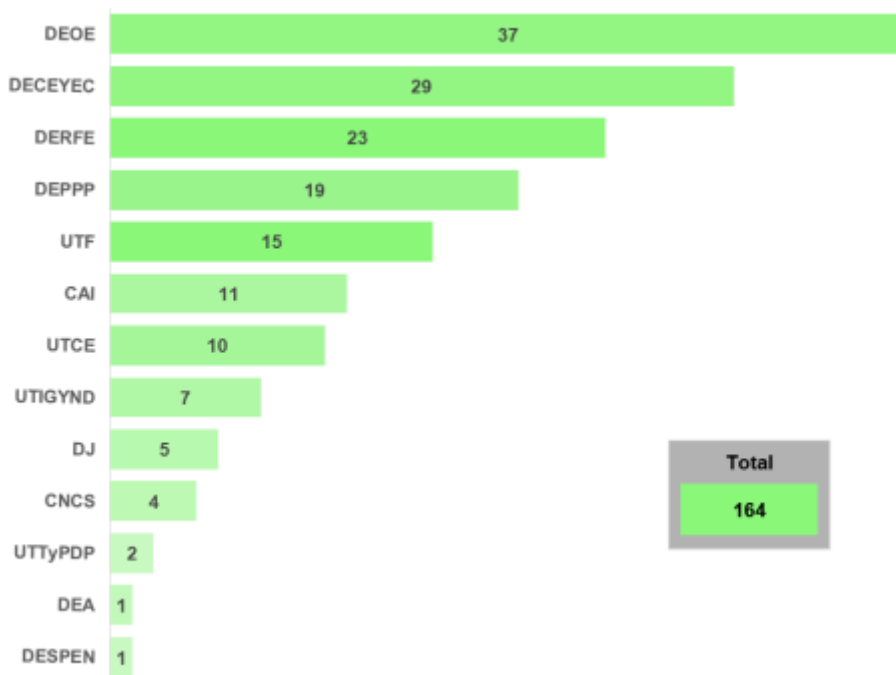

1.2.2 Actividades en ejecución desfasadas

De las 169 actividades que se encuentran en ejecución, cinco (2.96%) se encuentran con estatus de desfasadas respecto al periodo programado (Gráfica 5).

Gráfica 5
Distribución absoluta del total de actividades desfasadas
por UR del PlyCPEF 2023-2024

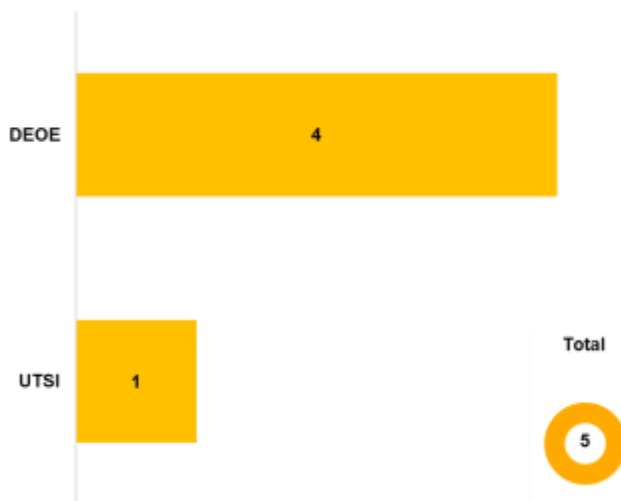

De las actividades que se encuentran con desfase, en el Cuadro 1 se describen las causas que lo originan, y en los casos en que sea procedente, las medidas adoptadas para llevarlas a término.

Cabe señalar que, para el presente corte de información, las actividades reportadas como desfasadas, la unidad responsable correspondiente, no indicó que presenten algún tipo de riesgo potencial que ponga en riesgo su cumplimiento.

Cuadro 1
Total de actividades desfasadas por UR del PlyCPEF 2023-2024

DEOE	
Actividad	Descripción desfase
Dar seguimiento a las gestiones que realicen las juntas locales, para la firma de Convenios de Colaboración con las autoridades escolares de la entidad que corresponda.	31 entidades firmaron los Convenios de Colaboración con las autoridades escolares. Zacatecas continúa como la única entidad pendiente de firma. El Vocal Ejecutivo Local informó, que el Convenio General de Colaboración INE-IEEZ y el Gobierno del Estado, ya fue revisado por la Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado de Zacatecas y señala que se firmará en breve. Reporta que la falta del convenio no ha implicado riesgos para la instalación de casillas en los planteles educativos, afirmando que las actividades del Proceso Electoral están garantizadas.
Realizar las pruebas de captura en el Sistema Informático del Conteo Rápido (SICR)	<p>Durante la semana del 8 al 12 de abril de 2024, se realizaron las prácticas de captura en el Sistema Informático del Conteo Rápido, las cuales tienen como objetivo verificar la precisión y rapidez de captura por parte de las y los capturistas.</p> <p>Durante estas prácticas se identificaron las siguientes incidencias en el funcionamiento del sistema:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Casillas que no confrontaban correctamente los datos. 2. Problemas de acceso al sistema por redireccionamiento en el servidor. 3. Error en la configuración de los reportes a nivel nacional y estatal, ya que no coincidían con la nueva redistribución. 4. Intermitencia del sistema informático del conteo rápido. <p>De todas estas situaciones se levantó caso CAU y se informó a la UTSI para su atención.</p> <p>Respecto a las pruebas de aceptación del Sprint 3 sobre el desarrollo del Sistema Informático del Conteo Rápido, se tenía previsto realizar del 8 al 10 de abril de 2024, sin embargo, se recibieron los insumos por parte de la UTSI hasta el día 17 de abril de 2024 y se remitieron los hallazgos el 19 de abril.</p> <p>Del 15 al 19 de abril las Juntas Distritales, realizaron capturas en el ambiente que se utilizará durante el primer simulacro del Conteo Rápido, las incidencias identificadas en el sistema se reportaron en su momento a la UTSI y se levantó caso CAU.</p> <p>Se programó una prueba de captura adicional, para el día 22 de abril de 2024.</p>
Realizar las pruebas de captura con la herramienta informática del SIJE	Conforme a lo señalado en la Guía para la realización de las pruebas de captura, los días 15 y 16 de abril de 2024 las juntas ejecutivas distritales realizaron pruebas en la versión Web del sistema, reportándose lo siguiente:

	<ul style="list-style-type: none"> • Al inicio de las pruebas el sistema no reflejaba de forma correcta la carga de casillas ni el medio a través del cual se reportaba la información, sin embargo, esto se solucionó durante el día 15 de abril. • Los reportes generados por el sistema presentaron desfases en la actualización de la información. • Se reportó el cierre de sesión a usuarios antes de los 30 minutos de inactividad, además del cierre anticipado de módulos en algunos distritos • Se observaron inconsistencias en los registros de los spool obtenidos (fechas de captura que no corresponden con el día y horario en que se capturó o campos vacíos en los que se debía mostrar algún dato). Asimismo, el spool correspondiente al Segundo Reporte, dejó de generarse conforme a lo solicitado y el día 16 no fue posible contar con el corte de cierre del sistema. El día 17 de abril de 2024 las y los CAE a quienes les fue asignado el reporte de alguna Mesa de Escrutinio y Cómputo (MEC) ingresaron a la App SIJE a fin de realizar pruebas de captura sobre las MEC, sin embargo, debido a que no se visualizaron los módulos correspondientes o las MEC asignadas, no fue posible realizar este ejercicio. Derivado de todo lo anterior, se realizará una prueba adicional de captura, que se llevará a cabo el próximo 23 de abril; en la cual también se probará el sistema de administración de usuarios, para asignar permisos, según el rol correspondiente a cada usuario.
<p>Dotar de los medios de comunicación complementarios a telefonía celular (voz y datos)</p>	<p>Del 15 a 19 de abril se realizó la entrega de los equipos satelitales en las juntas ejecutivas locales de las 19 entidades, asimismo, se llevó a cabo la transferencia de conocimientos.</p> <p>Se solicitó a las entidades la redistribución de los recursos de las juntas ejecutivas locales a las juntas ejecutivas distritales para cubrir los servicios de Telefonía Pública Rural, así como de internet local.</p> <p>Se están llevando a cabo los trámites administrativos ante la DEA, para la transferencia de recursos entre proyectos, para complementar los recursos para telefonía celular, servicio de internet local y, en su caso, telefonía satelital.</p>
UTSI	
Actividad	Descripción desfase
<p>PREP Federal 2023-2024: Habilitar los Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CATD)</p>	<p>Se realizó la dispersión del recurso y únicamente se está en espera de la terminación de las adecuaciones de un CATD.</p>

1.2.3 Actividades en riesgo

Respecto a lo reportado en el Sexto informe parcial, con fecha de corte del 22 de marzo de 2024, la CAI reportaba en riesgo la actividad "Entregar los recursos a la instancia internacional responsable de la administración y operación", donde indicaba en su valoración que "La entrega de documentos es imprescindible para proseguir con la ministración que de suficiencia al proyecto y el socio internacional había solicitado una prórroga para la primera ministración".

En cortes semanales posteriores, la CAI reportó que el Instituto Interamericano de Derechos Humanos entregó la documentación para la primera y segunda ministración de recursos, mismos que la Dirección Ejecutiva de Administración recibió y ordenó ambos pagos. La actividad fue reportada como concluida al corte del 12 de abril de 2024.

Por lo anterior, a la fecha de corte del presente informe, ninguna actividad se reporta en riesgo de acuerdo a las valoraciones de las UR.

1.3 Actividades por iniciar y por concluir

De las 615 actividades que conforman el PlyCPEF 2023-2024, 10 actividades se encuentran próximas a iniciar su ejecución en el periodo del 20 de abril a la fecha horizonte del 30 del mismo mes, lo que representa un 1.63% respecto del total (Cuadro 3). El detalle puede consultarse en el Anexo 2.

Cuadro 3
Distribución de Actividades por iniciar su ejecución por UR

Unidad Responsable	TOTAL	DEOE	UTSI	DERFE
Actividades por iniciar	10	7	2	1

Las actividades que se tiene previsto que concluyan de acuerdo con la fecha de término que cada UR estableció, son 22, las cuales se distribuyen de la siguiente forma (Cuadro 4) (se agrega el detalle en el Anexo 3):

Cuadro 4
Distribución de Actividades por concluir su ejecución por UR

Unidad Responsable	TOTAL	DERFE	DEOE	DECEYEC	UTSI	UTF
Actividades por concluir	22	9	7	2	2	2

1.4 Actividades que generan acuerdos o que dependen de aprobación de órganos desconcentrados

Se tienen programadas 57 actividades para aprobación de un acuerdo. Derivado de ello, al momento se cuenta con la aprobación acumulada de 50 (87.72%) acuerdos (Cuadro 5). Durante el periodo que se reporta se aprobaron tres acuerdos, todos por el CG cuyo enlace para su consulta se ubica en el Anexo 4.

Cuadro 5
Distribución del número acumulado de acuerdos aprobados por UR

UR	TOTAL	CAI	DECEYEC	DEOE	DEPPP	UTF	DERFE	UTSI
Acuerdos Aprobados	50	1	5	10	22	1	7	4

Conclusiones

En el lapso del presente informe, que contempla el periodo del 23 de marzo al 19 de abril de 2024, se analizaron 512 actividades, que equivalen al (83.25%) respecto a las 615 actividades que integran el PlyCPEF 2023-2024.

De las 512 actividades analizadas, 169 se encuentran en ejecución y 343 han concluido; de estas últimas, 72 corresponden al periodo reportado, 164 actividades se desarrollan dentro del periodo establecido y cinco fueron reportadas con desfase por las UR.

A la fecha de corte del periodo que contempla este informe, ninguna actividad se reporta en riesgo de acuerdo con las valoraciones que realiza la UR.

Durante el periodo reportado, se aprobaron tres acuerdos, por lo que a la fecha de corte se acumulan 50 acuerdos aprobados de los 57 que forman parte de las actividades del PlyCPEF 2023-2024.

Finalmente, para el periodo del 20 al 30 de abril de 2024, se tiene previsto que den inicio 10 actividades y que concluyan 22 actividades dentro de ese mismo periodo.

Anexo 1. Relación de actividades concluidas

ID	Proceso	Subproceso	UR	Actividad	Entregable	Valoración de la UR
252	Creación y Seguimiento del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral	Creación del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral	CAI	Entregar los recursos a la instancia internacional responsable de la administración y operación	Comprobant e bancario	La DEA recibió la documentación para procesar la segunda ministración al Instituto Interamericano de Derechos Humanos y se ha ordenado el pago de la segunda ministración para que la transferencia se realice.
146	Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero	Capacitación Electoral e Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo MEC	DECEYEC	Diseñar, producir y distribuir los materiales didácticos y de apoyo para la segunda etapa de capacitación del VMRE a la JLE de la CDMX	Archivo electrónico	Los materiales didácticos y de apoyo para la capacitación electoral del voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero que fueron entregados son: <ul style="list-style-type: none"> • Guía para la y el Funcionario de MEC Postal. • Guía para la y el Funcionario de MEC Postal Única (9 versiones). • Guía para la y el Funcionario de MEC Electrónica. • Listado de actividades de la Jornada Electoral (2 versiones MEC Postal y MEC Postal Única).
156	Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Diseño de la Estrategia de Integración de Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	DECEYEC	Producir y distribuir a las JLE materiales didácticos y de apoyo dirigidos al funcionariado de casilla para la Segunda etapa de Capacitación Electoral	Archivo electrónico	El proveedor TGM a cargo de la impresión y distribución de los materiales didácticos y de apoyo para la segunda etapa de capacitación del Proceso Electoral 2023-2024, concluyó con la distribución a las Juntas Locales Ejecutivas.
157	Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Diseño de la Estrategia de Integración de Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	DECEYEC	Dar seguimiento a la recepción en las JLE, de los materiales didácticos dirigidos al funcionariado de casilla para la Segunda Etapa de Capacitación Electoral, entregados por los OPL	Otro	Se concluyó con la actividad de seguimiento a la recepción de los materiales didácticos dirigidos al funcionariado de casilla de la segunda etapa de capacitación electoral, entregados por los Organismos Públicos Locales a las juntas locales ejecutivas.
170	Gestión de las Mesas Receptoras de	Diseño de la Estrategia de Integración de	DECEYEC	Dar seguimiento de la distribución a las JDE, de los materiales didácticos y de apoyo a cargo del	Otro	Las juntas locales ejecutivas realizaron la entrega de los materiales didácticos y de apoyo

ID	Proceso	Subproceso	UR	Actividad	Entregable	Valoración de la UR
	Votación y Capacitación Electoral	Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral		INE para capacitar al funcionariado de casilla para la Segunda Etapa de Capacitación Electoral		de segunda etapa a las juntas distritales ejecutivas.
171	Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Diseño de la Estrategia de Integración de Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	DECEYEC	Dar seguimiento a las JDE de los materiales didácticos a cargo del OPL dirigidos al funcionariado de casilla en la Segunda Etapa de Capacitación Electoral	Otro	Se concluyó con la actividad de seguimiento a la recepción de los materiales didácticos dirigidos al funcionariado de casilla de la segunda etapa de capacitación electoral, entregados por los Organismos Públicos Locales a las juntas distritales ejecutivas.
350	Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero	Capacitación Electoral e Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo MEC	DECEYEC	Dar seguimiento a la publicación del Listado de ciudadanía designada para integrar MEC del VMRE	Archivo electrónico	Se publicaron la totalidad de los Listados de ciudadanía designada para integrar las MEC del VMRE.
361	Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Diseño de la Estrategia de Integración de Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	DECEYEC	Visitar, notificar y capacitar (sensibilizar) a las personas insaculadas	Archivo electrónico	Se llevó a cabo la visita, notificación y capacitación (sensibilización) de la ciudadanía sorteada de manera simultánea o paralela del 9 de febrero al 31 de marzo de 2024.
362	Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Diseño de la Estrategia de Integración de Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	DECEYEC	Dar seguimiento a las actividades de los Mecanismos de Garantía de calidad de la primera etapa de capacitación electoral del Multisistema ELEC 2024 aplicados por la Junta Local Ejecutiva	Archivo electrónico	El seguimiento y la aplicación de los mecanismos de garantía de calidad al proceso de la primera etapa de capacitación concluyó por parte de la Junta Local Ejecutiva.

ID	Proceso	Subproceso	UR	Actividad	Entregable	Valoración de la UR
363	Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero	Capacitación Electoral e Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo MEC	DECEYEC	Dar seguimiento a la primera etapa de capacitación electoral para integrar las MEC del VMRE (Notificación y registro de ciudadanía sorteada)	Archivo electrónico	Se concluyó la visita, notificación y registro de la ciudadanía insaculada en las juntas distritales ejecutivas 05, 08, 09, 19 y 21 de la Ciudad de México, con corte al 4 de abril se tiene un avance de 7,012 ciudadanos visitados y 1,780 notificados efectivamente.
364	Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Diseño de la Estrategia de Integración de Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	DECEYEC	Propuesta y aprobación de nuevas SED y nuevas SCPRV	Otro	Una vez definidos los resultados de la primera etapa de capacitación electoral, las JDE han propuesto secciones electorales como SED (sólo de Nivel 2) y SCPRV que han sido aprobadas por los CD, en el periodo del 9 de febrero al 31 de marzo de 2024.
365	Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Diseño de la Estrategia de Integración de Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	DECEYEC	Integrar la lista de ciudadanos que fueron capacitados y cumplen con los requisitos legales para desempeñarse como funcionarios de Mesas Directivas de Casilla	Otro	Una vez definidos los resultados de la primera etapa de capacitación electoral, se integró el Listado de ciudadanas y ciudadanos que cumplieron con los requisitos legales para integrar las mesas directivas de casilla.
366	Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Diseño de la Estrategia de Integración de Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	DECEYEC	Dar seguimiento a las actividades de los Mecanismos de Garantía de calidad de la primera etapa de capacitación electoral del Multisistema ELEC 2024 aplicados por el Consejo Local	Archivo electrónico	El seguimiento y la aplicación de los mecanismos de garantía de calidad al proceso de la primera etapa de capacitación concluyó por parte del Consejo Local.
367	Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Diseño de la Estrategia de Integración de Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	DECEYEC	Dar seguimiento a las actividades de los Mecanismos de Garantía de calidad de la primera etapa de capacitación electoral del Multisistema ELEC 2024 aplicados por la Junta Distrital Ejecutiva	Archivo electrónico	El seguimiento y la aplicación de los mecanismos de garantía de calidad al proceso de la primera etapa de capacitación concluyó por parte de la Junta Distrital Ejecutiva.

ID	Proceso	Subproceso	UR	Actividad	Entregable	Valoración de la UR
368	Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Diseño de la Estrategia de Integración de Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	DECEYEC	Dar seguimiento a las actividades de los Mecanismos de Garantía de calidad de la primera etapa de capacitación electoral del Multisistema ELEC 2024 aplicados por el Consejo Distrital	Archivo electrónico	El seguimiento y la aplicación de los mecanismos de garantía de calidad al proceso de la primera etapa de capacitación concluyó por parte del Consejo Distrital.
369	Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Diseño de la Estrategia de Integración de Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	DECEYEC	Dar seguimiento a las actividades de los Mecanismos de Garantía de calidad de la primera etapa de capacitación electoral del Multisistema ELEC 2024 aplicados por Oficinas Centrales	Oficio / Circular	El seguimiento y la aplicación de los mecanismos de garantía de calidad al proceso de la primera etapa de capacitación concluyó por parte de Oficinas Centrales.
370	Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero	Capacitación Electoral e Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo MEC	DECEYEC	Dar seguimiento a la primera etapa de capacitación electoral para integrar las MEC del VMRE por la DECEYEC	Archivo electrónico	Se concluyó la visita, notificación y registro de la ciudadanía insaculada en las juntas distritales ejecutivas 05, 08, 09, 19 y 21 de la Ciudad de México, con corte al 4 de abril se tiene un avance de 7,012 ciudadanía visitada, 1,780 notificada efectivamente, 1,212 capacitada y 1,198 que cumplen con los requisitos legales para ser designados como FMEC.
371	Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero	Capacitación Electoral e Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo MEC	DECEYEC	Dar seguimiento a la primera etapa de capacitación electoral para integrar las MEC del VMRE (Visitar a la ciudadanía sorteada)	Archivo electrónico	Se concluyó la visita, notificación y registro de la ciudadanía insaculada en las juntas distritales ejecutivas 05, 08, 09, 19 y 21 de la Ciudad de México, con corte al 4 de abril se tiene un avance de 7,012 ciudadanos/as visitados/as.
372	Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero	Capacitación Electoral e Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo MEC	DECEYEC	Dar seguimiento a la primera etapa de capacitación electoral para integrar las MEC del VMRE (Capacitar a la Ciudadanía Sorteada)	Archivo electrónico	Se concluyó la visita, notificación y registro de la ciudadanía insaculada en las juntas distritales ejecutivas 05, 08, 09, 19 y 21 de la Ciudad de México, con corte al 4 de abril se tiene un avance de 1,212 ciudadanos/as capacitados/as.

ID	Proceso	Subproceso	UR	Actividad	Entregable	Valoración de la UR
373	Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero	Capacitación Electoral e Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo MEC	DECEYEC	Dar seguimiento a la primera etapa de capacitación electoral para integrar las MEC del VMRE (Consejos Distritales)	Archivo electrónico	Se concluyó la visita, notificación y registro de la ciudadanía insaculada en las juntas distritales ejecutivas 05, 08, 09, 19 y 21 de la Ciudad de México. Con corte al 4 de abril se tiene un avance 7,012 ciudadanía visitada, 1,780 notificada efectivamente, 1,212 capacitada y 1,198 que cumplen con los requisitos legales para ser designados como FMEC.
374	Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero	Capacitación Electoral e Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo MEC	DECEYEC	Dar seguimiento a la primera etapa de capacitación electoral para integrar las MEC del VMRE (Consejo Local)	Archivo electrónico	Se concluyó la visita, notificación y registro de la ciudadanía insaculada en las juntas distritales ejecutivas 05, 08, 09, 19 y 21 de la Ciudad de México. Con corte al 4 de abril se tiene un avance 7,012 ciudadanía visitada, 1,780 notificada efectivamente, 1,212 capacitada y 1,198 que cumplen con los requisitos legales para ser designados como FMEC.
375	Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero	Capacitación Electoral e Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo MEC	DECEYEC	Dar seguimiento a la primera etapa de capacitación electoral para integrar las MEC del VMRE (Juntas Distritales Ejecutivas)	Archivo electrónico	Se concluyó la visita, notificación y registro de la ciudadanía insaculada en las juntas distritales ejecutivas 05, 08, 09, 19 y 21 de la Ciudad de México. Con corte al 4 de abril se tiene un avance 7,012 ciudadanía visitada, 1,780 notificada efectivamente, 1,212 capacitada y 1,198 que cumplen con los requisitos legales para ser designados como FMEC.
376	Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero	Capacitación Electoral e Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo MEC	DECEYEC	Dar seguimiento a la primera etapa de capacitación electoral para integrar las MEC del VMRE (Junta Local Ejecutiva)	Archivo electrónico	Se concluyó la visita, notificación y registro de la ciudadanía insaculada en las juntas distritales ejecutivas 05, 08, 09, 19 y 21 de la Ciudad de México. Con corte al 4 de abril se tiene un avance 7,012 ciudadanía visitada, 1,780 notificada efectivamente, 1,212 capacitada y 1,198 que cumplen con los requisitos legales para ser designados como FMEC.

ID	Proceso	Subproceso	UR	Actividad	Entregable	Valoración de la UR
465	Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero	Capacitación Electoral e Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo MEC	DECEYEC	Dar seguimiento al Proceso de segunda insaculación y designación de funcionariado para las MEC del VMRE.	Archivo electrónico	El 6 de abril de 2024, se realizó el proceso de segunda insaculación para designar a la ciudadanía que integrará las mesas de escrutinio y cómputo que se encargarán de contar y registrar la votación emitida por nuestros connacionales en el extranjero. Participaron las juntas distritales ejecutivas (JDE) 05, 08, 09, 19 y 21 de la Ciudad de México. Se designó a la ciudadanía que integrará las 93 MEC postales, postales únicas y electrónicas que se instalarán en el Local Único en la Ciudad de México.
466	Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Diseño de la Estrategia de Integración de Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	DECEYEC	Ejecutar el Proceso de Segunda Insaculación y Designación de Funcionariado de Mesas Directivas de Casilla conforme con lo señalado en la ECAE 2024	Archivo electrónico	El procedimiento de la segunda insaculación se realizó el 6 de abril de 2024 en sesión conjunta de CD y JDE, a través del Multisistema ELEC2024, en conformidad con el artículo 254, párrafo 1, inciso g) de la LGIPE. En cumplimiento de las atribuciones de cada órgano, se seleccionó, respetando el orden alfabético a partir de la letra sorteada, a las y los nueve ciudadanos que integrarán las MDC (ámbito de los CD); posteriormente, se ordenó y designaron los cargos de conformidad con la escolaridad, de manera horizontal (ámbito de las JDE).
265	Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero	Capacitación Electoral e Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo MEC	DEOE	Realizar la gestión para determinar un local único para el escrutinio y cómputo de los votos emitidos por los mexicanos residentes en el extranjero y presentar el proyecto de acuerdo del CG para su aprobación.	Acuerdo	En sesión extraordinaria del 18 de abril el Consejo General aprobó el local único en el que se realizará el escrutinio y cómputo de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero; así como la logística para el escrutinio y cómputo del voto postal, electrónico por internet y presencial en sedes en el extranjero de las y los mexicanos residentes en el extranjero a desarrollar en el local único, para los procesos electorales federal y locales 2023-2024.

ID	Proceso	Subproceso	UR	Actividad	Entregable	Valoración de la UR
427	Planeación, aprobación y operación de los mecanismos de recolección de la Documentación Electoral al Término de la Jornada Electoral	Supervisión a la elaboración de los Estudios de factibilidad de los mecanismos de recolección	DEOE	Dar seguimiento a la presentación de los estudios de factibilidad, por cada modalidad de mecanismo de recolección, para las elecciones federales y locales	Reporte	El 25 de marzo de 2024, las siguientes entidades presentaron sus estudios de factibilidad ante sus respectivos consejos distritales: Nuevo León, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Oaxaca (2 de 10 distritos) y Yucatán (1 de 6 distritos). De esta forma, se presentaron dichos estudios en 48 distritos del país, que sumados a los 251 distritos que hicieron lo propio el 14 de marzo y a 1 distrito que realizó esta actividad el 16 del mismo mes y año, suman en total 300 distritos electorales federales, por lo que la presentación de los estudios de factibilidad se realizó en su totalidad.
428	Planeación, aprobación y operación de los mecanismos de recolección de la Documentación Electoral al Término de la Jornada Electoral	Supervisión a la elaboración de los Estudios de factibilidad de los mecanismos de recolección	DEOE	Dar seguimiento a la remisión al OPL de los estudios de factibilidad para implementar mecanismos de recolección	Reporte	Del 15 al 28 de marzo de 2024 se entregaron los estudios de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección a los 32 organismos públicos locales.
431	Gestión para la Ubicación, Equipamiento y Acondicionamiento de Casillas Electorales	Ubicación, Equipamiento y Acondicionamiento de Casillas	DEOE	Dar seguimiento a la aprobación de los Consejos Distritales de las listas de ubicación de casillas básicas y contiguas.	Reporte	En las sesiones de los 300 consejos distritales celebradas el 25 de marzo de 2024, se aprobó el número y ubicación de casillas básicas y contiguas, por lo que, a nivel nacional, con corte a las 18:08 horas del 26 de marzo de 2024 se tienen las siguientes cifras: Total de casillas: 170,858. Casillas Básicas: 70,580; Casillas Contiguas: 90,800; Casillas Extraordinarias: 8,300; Casillas Especiales: 1,178.

ID	Proceso	Subproceso	UR	Actividad	Entregable	Valoración de la UR
455	Voto Anticipado en Territorio Nacional	Generación de etiquetas	DEOE	Elaborar y remitir a las juntas locales ejecutivas las etiquetas para la personalización de los sobres paquete electoral de seguridad	Oficio / Circular	La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral remitió vía correo electrónico los archivos cifrados con las etiquetas personalizadas para colocarse en los Sobres Paquete Electoral de Seguridad (SPES) para la Junta Local y los Sobres Paquete Electoral de Seguridad del Voto Anticipado (SPES VA), así como las contraseñas para descifrarlos.
501	Gestión para la Ubicación, Equipamiento y Acondicionamiento de Casillas Electorales	Ubicación, Equipamiento y Acondicionamiento de Casillas	DEOE	Dar seguimiento a la primera publicación de las listas de ubicación e integración de las Mesas Directivas de Casilla, en los edificios y lugares públicos más concurridos del distrito.	Reporte	Los 300 consejos distritales reportaron la realización de la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral.
509	Preparación y ejecución del cómputo de las Elecciones	Preparación del Sistema de Registro de Actas de Escrutinio y Cómputo de Casilla (SRA) y del Sistema de Cómputos Distritales y de Circunscripción	DEOE	Desarrollar el primer Simulacro del Sistema de Registro de Actas de Escrutinio y Cómputo de Casilla (SRA) y del Sistema de Cómputos Distritales y de Circunscripción.	Reporte	Los días 18 y 19 de abril de 2024 se llevaron a cabo los simulacros para probar la funcionalidad de los sistemas informáticos que se implementarán para el desarrollo de los cómputos distritales: Sistema de Registro de Actas y Sistema de Cómputos Distritales, de Entidad Federativa y de Circunscripción. En dichas pruebas se contó con la participación de los 300 distritos electorales y la supervisión de las 32 juntas locales ejecutivas.
534	Voto de las Personas en Prisión Preventiva	Ubicación y determinación del número de MEC que atenderán el Voto de las Personas en Prisión Preventiva	DEOE	Dar seguimiento a la aprobación de las Mesas de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva.	Reporte	Entre el 16 y el 18 de febrero las juntas distritales aprobaron la propuesta del número y ubicación de las mesas de escrutinio y cómputo del voto de las personas en prisión preventiva (MEC VPPP). Con base en esos datos, en la sesión ordinaria de marzo, los consejos distritales aprobaron la instalación y ubicación de 158 MEC VPPP; en tanto que, en la sesión del 6 de abril realizaron la integración de las referidas mesas. Cabe destacar que, el 89% de las mesas se instalarán en los domicilios de los consejos, el 7

ID	Proceso	Subproceso	UR	Actividad	Entregable	Valoración de la UR
						% en escuelas, el 3% en domicilios particulares y el 1% en espacios públicos.
711	Implementación y Operación del SIJE	Elaboración de Documentos Normativos	DEOE	Elaborar el Manual para la recopilación de la información en las modalidades de voto y presentarlo ante la Comisión de Capacitación y Organización Electoral	Manual / Guía	El documento fue aprobado el 5 de abril de 2024, en la Quinta Sesión Extraordinaria de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral.
35	Conformación del Padrón Electoral y Credencialización	Depuración y Reincorporación del Padrón Electoral	DERFE	Realizar los Procedimientos de Defunción, Suspensión de Derechos Políticos, Procedimiento Alternativo, Duplicados y Pérdida de Nacionalidad y aplicar las bajas a la base del Padrón Electoral.	Informe	Derivado de la aplicación de los procedimientos para la depuración del Padrón Electoral y Lista Nominal, se aplicaron 489,033 bajas por defunción; 15,188 por suspensión de derechos; 1,159 por el Procedimiento Alternativo; 1,809 por duplicados y 0 por Pérdida de Nacionalidad.
38	Conformación del Padrón Electoral y Credencialización	Depuración y Reincorporación del Padrón Electoral	DERFE	Reincorporar al Padrón Electoral de ciudadanos rehabilitados en sus derechos políticos por notificación judicial y/o por petición en Módulos de Atención Ciudadana (Preventivo).	Informe	Derivado de la aplicación del "Procedimiento de Reincorporación al Padrón Electoral de ciudadanos Rehabilitados en sus Derechos Políticos por Notificación Judicial" fueron reincorporados 3,867 ciudadanos, y con la aplicación del "Procedimiento de Reincorporación al Padrón Electoral de Ciudadanos Rehabilitados en sus derechos políticos por petición ciudadana 9,333 registros en todo el país.
74	Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero	Recepción y Procesamiento de Solicitudes de Inscripción a la LNERE	DERFE	Registrar y conformar las Listas Nominales de Electores Residentes en el Extranjero	Informe	"Los registros en la Lista Nominal del Electorado en el Extranjero corresponde a 187,388, de los cuales el 64.84% (121,501) corresponden al voto electrónico, el 28.32% (53,069) al voto postal y el 6.84% (12,818) al voto presencial. El 55.11% (103,269) son solicitudes de hombres y el 44.89% (84,119) de mujeres. Los principales países de donde provienen las solicitudes son: Estados Unidos de América, Canadá, España, Alemania y Francia y respecto a la entidad de referencia en la Credencial para Votar encabezan la lista de solicitudes recibidas de las entidades de Ciudad de México, Jalisco, México, Michoacán y Puebla."

ID	Proceso	Subproceso	UR	Actividad	Entregable	Valoración de la UR
199	Conformación del Padrón Electoral y Credencialización	Emisión de Listas Nominales de Electores	DERFE	Entregar de manera mensual los estadísticos del Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores a nivel sección, manzana y distrito electoral de cada Entidad Federativa a la DEOE, DECEYEC y las Vocalías Ejecutivas Locales y Distritales.	Correo electrónico	Se realizó la quinta entrega de estadísticos de PE y LNE Definitiva, a la DEOE el pasado 12 de abril del presente; adicionalmente, se generaron y dispusieron los cortes mensuales de PE y LNE a las JLE y JLD.
253	Conformación del Padrón Electoral y Credencialización	Depuración y Reincorporación del Padrón Electoral	DERFE	Concluir con la verificación de domicilios irregulares.	Informe	En la reunión ordinaria del Grupo de Trabajo Operación en Campo (GTOC) se hizo entrega del documento "Tratamiento de Registros con Datos de Domicilio Presuntamente Irregulares o Falsos. Flujos de Cambios de Domicilio Seleccionados mediante Criterios Estadísticos. Informe del Operativo de Campo, Análisis Registral y Jurídico, Así como, en su caso, la Exclusión de los Registros Determinados con Domicilio Irregular y Notificación a la ciudadanía Involucrada. Abril de 2024"
294	Conformación del Padrón Electoral y Credencialización	Determinación de la Calidad y Validez del Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores	DERFE	Realizar recorrido cartográfico, operativo de campo, estimar indicadores y elaborar el Informe de Resultados de la Verificación Nacional Muestral 2023-2024.	Informe	El lunes 15 de abril se entregaron los Informes de Resultados de las Encuesta de Actualización y Cobertura, se presentaron los Indicadores Nacionales en Comisión del Registro
325	Conteos Rápidos Institucionales	Preparación del Conteo Rápido	DERFE	Elaborar y someter a consideración del CG el Proyecto de Acuerdo por el que se establecen los Criterios Científicos, Operativos y Logísticos para los Conteos Rápidos Institucionales.	Acuerdo	El 18 de abril de 2024, en sesión extraordinaria del Consejo General del INE se aprobaron los "Criterios Científicos, Logísticos y Operativos y el Protocolo de Selección de las Muestras" que propuso el COTECORA para los Conteos Rápidos de los PEF y los PEL 2023-2024 con elección de gubernaturas.

ID	Proceso	Subproceso	UR	Actividad	Entregable	Valoración de la UR
402	Actualización de la Geografía Electoral	Integración de la Cartografía Electoral	DERFE	Generar y proporcionar el catálogo de distritación local.	Reporte	"Con el propósito de facilitar la emisión del voto y la logística electoral, de 2021 a 2023 se realizaron una serie de proyectos para la actualización del Marco Geográfico Electoral. Los programas fueron los siguientes: Distritaciones locales y federal 2021-2022, Reseccionamiento 2021, 2022 y 2023, Integración Seccional 2023, adecuaciones a límites municipales e incorporación de 8 nuevos municipios. Por tal razón se generaron y se proporcionaron los catálogos de distritación local a la Dirección de Productos y Servicios Electorales.
420	Conformación del Padrón Electoral y Credencialización	Captación de Trámites	DERFE	Analizar las observaciones formuladas por los Partidos Políticos a la LNEPP para Revisión.	Correo electrónico	El 8 de marzo de 2024, concluyó el periodo de entrega de observaciones a la LNEPP para Revisión por parte de las representaciones Partidistas, recibándose 529 observaciones por parte del PRD y PAN, las cuales se analizaron y revisaron por áreas de la DERFE para la atención de las mismas, por lo que se está generando el informe correspondiente. Se presentará el informe respectivo a más tardar el 8 de abril de 2024, de acuerdo con lo establecido en Anexo del Acuerdo INE/CG672/2023 y sus Anexos.
421	Conformación del Padrón Electoral y Credencialización	Captación de Trámites	DERFE	Analizar las observaciones formuladas por los Partidos Políticos a la LNEVA para Revisión.	Correo electrónico	El 11 de marzo de 2024, concluyó el periodo de entrega de observaciones a la LNEVA para Revisión por parte de las representaciones Partidistas, recibándose 239 observaciones por parte del PRI y PAN, las cuales se analizaron y revisaron por las áreas de la DERFE para la atención de las mismas, por lo que se está generando el informe correspondiente. Se presentará el informe respectivo a más tardar el 8 de abril de 2024, de acuerdo con lo establecido en Anexo del Acuerdo INE/CG111/2024.

ID	Proceso	Subproceso	UR	Actividad	Entregable	Valoración de la UR
426	Conformación del Padrón Electoral y Credencialización	Determinación de la Calidad y Validez del Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores	DERFE	Integrar el informe final de resultados del Comité Técnico de Evaluación del Padrón Electoral.	Reporte	El lunes 15 de abril las y los Asesores entregaron las versiones extensas y finales de sus estudios, dando por terminado el periodo de elaboración de los mismos. Estos fueron dados a conocer a las y los integrantes de la CRFE.
446	Conformación del Padrón Electoral y Credencialización	Emisión de Listas Nominales de Electores	DERFE	Generar y proporcionar los archivos de la Lista Nominal para la segunda insaculación con fecha de corte al 29 de marzo de 2024.	Oficio / Circular	Se realizó la disposición del insumo de la LNED a la DECEYEC y UTSI para la ejecución del procedimiento para la segunda insaculación (entregando 98,329,591 registros), dicha disposición se realizó conforme a lo acordado el pasado 27 de marzo de 2024 con la DECEYEC y la UTSI a través de la herramienta TEAMS.
448	Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero	Capacitación Electoral e Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo MEC	DERFE	Elaborar proyecto de Acuerdo del Consejo General por el que se determina el número adicional de boletas electorales a imprimir para la ciudadanía que eligió la modalidad postal, así como de su impresión y demás materiales para el ejercicio del VMRE, para su aprobación por la instancia que corresponda.	Acuerdo	El 27 de marzo de 2024, en sesión ordinaria el Consejo General, aprobó el Acuerdo INE/CG329/2024, por el que se aprueba el número adicional de boletas electorales para las elecciones de Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos y Senadurías que se imprimirán para que las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero emitan su voto en el Proceso Electoral Federal 2023-2024, Así como su resguardo y destrucción en los términos del Libro Sexto de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

ID	Proceso	Subproceso	UR	Actividad	Entregable	Valoración de la UR
467	Conformación del Padrón Electoral y Credencialización	Emisión de Listas Nominales de Electores	DERFE	Entregar el Informe del análisis de las observaciones formuladas por los Partidos Políticos al CG del INE y a la Comisión Nacional de Vigilancia, así como de las modificaciones legalmente procedentes.	Informe	"En cumplimiento a lo ordenado en el párrafo 3 del artículo 151 de la LGIPE, así como en el numeral 19 de los "Lineamientos que establecen los plazos y términos para el uso del Padrón Electoral y las Listas Nominales del Electorado para los Procesos Electorales Locales 2023-2024", aprobados mediante el Acuerdo INE/CG433/2023, se informa que mediante diversos oficios de fecha 08 de abril de 2024, la DERFE hizo entrega en tiempo y forma al Consejo General del INE y a la CNV del documento "Informe que rinde la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores respecto del análisis realizado a las observaciones formuladas por los partidos políticos, en términos de lo previsto en el artículo 151 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales". Con el informe se da cuenta de las actividades relativas al análisis, verificación y dictamen técnico y jurídico de cada una de las observaciones formuladas por los partidos políticos, y presentar los resultados sobre la procedencia o improcedencia de las observaciones; así como informar de las modificaciones a las Listas Nominales de Electores a que hubo lugar, derivado de la aplicación de las observaciones que fueron determinadas como procedentes."
468	Conformación del Padrón Electoral y Credencialización	Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar	DERFE	Resguardar las Credenciales para Votar que no fueron recogidas por sus titulares a más tardar el 14 de marzo de 2024.	Otro	Al 8 de abril de 2024, se resguardaron 146,190 credenciales para votar de las y los ciudadanos que realizaron su trámite de inscripción y/o actualización al 22 de enero de 2024; así como la de reposición hasta el 8 de febrero y que no fueron recogidas por sus titulares a más tardar el 14 de marzo de 2024.

ID	Proceso	Subproceso	UR	Actividad	Entregable	Valoración de la UR
471	Conformación del Padrón Electoral y Credencialización	Emisión de Listas Nominales de Electores	DERFE	Generar y entregar el informe de observaciones que en su caso sean formuladas por los Partidos Políticos a la LNEPP para revisión.	Informe	"Se llevó a cabo la generación y entrega del informe respecto del análisis a las observaciones formuladas por las RPP, el cual fue entregado el pasado 8 de abril de 2024 a los integrantes del CG y de la CNV. El informe contenía 529 observaciones formuladas por el PAN y PRD y como resultado del análisis realizado entre la DPSE, DO-CECyRD y la STN sólo 101 observaciones resultaron procedentes. La LNEPP Definitiva quedó conformada por 30,391 registros.
472	Conformación del Padrón Electoral y Credencialización	Emisión de Listas Nominales de Electores	DERFE	Generar y entregar el informe de observaciones que en su caso sean formuladas por los Partidos Políticos a la LNEVA para revisión.	Oficio / Circular	"Se llevó a cabo la generación y entrega del informe respecto del análisis a las observaciones formuladas por las RPP, el cual fue entregado el pasado 08 de abril de 2024 a los integrantes del CG y de la CNV. El informe contenía 239 observaciones formuladas por el PAN y PRI y como resultado del análisis realizado entre la DPSE, DO-CECyRD y la STN únicamente una observación resulto procedente. La LNEVA Definitiva quedó conformada por 4,002 registros.
498	Conformación del Padrón Electoral y Credencialización	Determinación de la Calidad y Validez del Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores	DERFE	Entregar el Informe de Resultados de la Verificación Nacional Muestral 2024 a la Comisión Nacional de Vigilancia y a la Comisión del Registro Federal de Electores.	Informe	El 15 de abril se Presentó el Informe Ejecutivo de los Resultados Nacionales de la Verificación Nacional Muestral 2024 a la Comisión del Registro Federal de Electores y el 10 de abril a la Comisión Nacional de Vigilancia.
222	Fiscalización del Proceso Electoral	Fiscalización de Apoyo Ciudadano, Precampaña, Campaña y Observadores Electorales	UTF	Elaborar la planeación estratégica con enfoque de riesgos para la revisión de la campaña Proceso Electoral Concurrente de conformidad a los plazos establecidos en los acuerdos emitidos por el Consejo General.	Informe	Se diseñó la planeación estratégica implementando políticas de análisis para establecer una calificación de riesgo electoral a los distintos cargos de elección para el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024, con la finalidad de seleccionar los distritos y/o municipios con mayor probabilidad de presentar irregularidades, mediante el "Análisis de Cargos de Riesgo".

ID	Proceso	Subproceso	UR	Actividad	Entregable	Valoración de la UR
319	Fiscalización del Proceso Electoral	Fiscalización de Apoyo Ciudadano, Precampaña, Campaña y Observadores Electorales	UTF	Elaborar y someter a consideración de la Comisión de Fiscalización el dictamen y proyecto de resolución relativo a los informes de precampaña y obtención del apoyo de la ciudadanía, y proponer en su caso, las sanciones que procedan conforme a la normatividad aplicable, para su posterior presentación al Consejo General.	Informe	Se presentaron y aprobaron ante la COF y CG los dictámenes y proyectos de resolución relativo a los informes de precampaña y obtención del apoyo de la ciudadanía.
432	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	UTSI	Sistema de Voto Electrónico por Internet (SIVEI): Realizar Primer Simulacro	Informe	Se llevó a cabo el primer simulacro de Voto Electrónico por Internet, se llevó a cabo del 1 al 5 de abril.
433	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	UTSI	Sistema de Cómputos Distritales: Verificar y validar los Componentes (Pruebas de aceptación).	Oficio / Circular	Se enviaron los insumos y se liberó el ambiente para realizar las pruebas de aceptación, del 26 de marzo al 3 de abril.
434	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	UTSI	Sistema de Cómputos Web: Verificar y validar los Componentes (Pruebas de aceptación).	Oficio / Circular	Se liberó el ambiente para las pruebas de aceptación, que se realizaron del 08 al 12 de marzo de 2024.
436	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	UTSI	Sistema para el Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación: Verificar y validar los Componentes (Pruebas de aceptación).	Oficio / Circular	Se liberó el ambiente para las pruebas de aceptación, que se llevaron a cabo del 21 al 28 de marzo.
437	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	UTSI	Sistema de Mecanismos de Garantía de Calidad a la Segunda Etapa de Capacitación: Verificar y validar los Componentes (Pruebas de aceptación).	Oficio / Circular	Se liberó el ambiente para las pruebas de aceptación, las cuales se realizan del 25 de marzo al 1 de abril.
438	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación	UTSI	Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral:	Oficio / Circular	Se liberó el ambiente para las pruebas de aceptación, que se llevaron a cabo del 14 al 21 de marzo.

ID	Proceso	Subproceso	UR	Actividad	Entregable	Valoración de la UR
		de Soluciones Tecnológicas		Verificar y validar los Componentes (Pruebas de aceptación).		
440	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	UTSI	Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla: Verificar y validar los Componentes (Pruebas de aceptación).	Oficio / Circular	Se liberó el ambiente para las pruebas de aceptación, que se llevaron a cabo del 22 al 27 de marzo.
442	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	UTSI	Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes: Verificar y validar los Componentes (Pruebas de aceptación).	Oficio / Circular	Se liberó el ambiente para las pruebas de aceptación que se llevaron a cabo del 14 al 22 de marzo de 2024.
447	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	UTSI	App Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE): Verificar y validar los Componentes (Pruebas de aceptación).	Oficio / Circular	El 1 de abril se envió por correo electrónico al usuario los insumos necesarios para iniciar con las pruebas de aceptación.
464	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	UTSI	Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral: Liberar (Producción).	Oficio / Circular	El 5 de abril fue liberado en ambiente productivo la App de Simulacros y Prácticas v5.0, que estará operando para el PEC 2023-2024, el cual se estará utilizando a partir del 9 de abril.
469	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	UTSI	Sistema de Segunda Insaculación: Liberar (Producción).	Oficio / Circular	EL proceso de Segunda Insaculación se llevó a cabo el 6 de abril.
470	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	UTSI	Sistema de Identificación para Voto Presencial en el Extranjero (SIVPE): Verificar y validar los Componentes (Pruebas de aceptación).	Oficio / Circular	El 5 de abril se llevaron a cabo pruebas y simulacros de Votación Presencial, en donde se utilizó el SIVPE versión 2.0.2.
474	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	UTSI	Sistema para el Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación: Liberar (Producción).	Oficio / Circular	El sistema fue liberado para iniciar operaciones el 7 de abril.

ID	Proceso	Subproceso	UR	Actividad	Entregable	Valoración de la UR
475	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	UTSI	Sistema de Mecanismos de Garantía de Calidad a la Segunda Etapa de Capacitación: Liberar (Producción).	Oficio / Circular	El sistema inició operaciones el 7 de abril, conforme se indicó en la Circular INE / DECEYEC-UTSI / 002 / 2024.
494	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	UTSI	Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE): Verificar y validar los Componentes (Pruebas de aceptación).	Oficio / Circular	Se llevó a cabo las pruebas de captura, las cuales se efectuaron del 8 al 17 de abril de 2024.
496	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	UTSI	Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla: Liberar (Producción).	Oficio / Circular	El sistema de liberó para operación el 9 de abril, de acuerdo a la Circular INE / DECEYEC-UTSI / 002 / 2024.
506	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	UTSI	Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes: Liberar (Producción).	Oficio / Circular	Se llevó a cabo el inicio de operación del sistema, de acuerdo a los tiempos planeados.
516	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	UTSI	Sistema de Conteo Rápido: Verificar y validar los Componentes (Pruebas de aceptación).	Oficio / Circular	Se liberó el ambiente para la realización de las pruebas de aceptación del 15 al 20 de marzo.

Anexo 2. Relación de actividades por iniciar en el PlyCPEF 2023-2024

ID	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Fecha de Inicio
507	Voto Anticipado en Territorio Nacional	Integración de documentación electoral	Dar seguimiento a la integración de los sobres paquete electoral de seguridad en la junta local ejecutiva	DEOE	23/04/2024
511	Planeación, aprobación y operación de los mecanismos de recolección de la Documentación Electoral al Término de la Jornada Electoral	Supervisión a la aprobación de los mecanismos de recolección	Dar seguimiento a la aprobación de los mecanismos de recolección, y ajustes a los mismos para las elecciones federales y locales	DEOE	22/04/2024
512	Planeación, aprobación y operación de los mecanismos de recolección de la Documentación Electoral al Término de la Jornada Electoral	Capacitación sobre los mecanismos de recolección	Dar seguimiento a la acreditación y sustitución de Representantes de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes ante los mecanismos de recolección	DEOE	23/04/2024
513	Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero	Organización para la Emisión del VMRE	Llevar a cabo la recepción, clasificación y resguardo de los sobres que contienen los votos emitidos por los mexicanos residentes en el extranjero	DEOE	23/04/2024
514	Implementación y Operación del SIJE	Preparación de la Implementación SIJE	Desarrollar el primer simulacro del SIJE	DEOE	25/04/2024
515	Conteos Rápidos Institucionales	Preparación del Conteo Rápido	Realizar el primer simulacro del Conteo Rápido	DEOE	25/04/2024
523	Voto de las Personas en Prisión Preventiva	Designación de observadoras/es electorales	Dar seguimiento a la designación de observadores y observadoras electorales para el voto de las personas en prisión preventiva.	DEOE	22/04/2024
517	Orientación, Atención y Servicios Registrales para la Ciudadanía y Actores Externos	Productos y Servicios Registrales a la Ciudadanía	Configurar el Sistema de Consulta en Casillas Especiales y preparar el Centro de Ayuda y Campus Virtual.	DERFE	29/04/2024
435	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	Sistema de Cómputos Tribunal: Verificar y validar los Componentes (Pruebas de aceptación).	UTSI	29/04/2024
510	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	Sistema de Voto Electrónico por Internet (SIVEI): Realizar Segundo Simulacro	UTSI	22/04/2024

Anexo 3. Relación de actividades por concluir en el PlyCPEF 2023-2024

ID	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Fecha de Término
377	Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero	Capacitación Electoral e Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo MEC	Elaborar el Apartado de Capacitación Electoral e Integración de MEC y MRV del VMRE para el Informe de Primera Etapa de Capacitación Electoral	DECEYEC	30/04/2024
453	Fortalecimiento de la Educación Cívica y Participación Ciudadana	Evaluación de Estrategias de Campañas Institucionales, Educación Cívica y Participación Ciudadana	Presentar el segundo informe de la implementación del Programa de Promoción de la Participación Ciudadana en el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024 a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral	DECEYEC	30/04/2024
387	Comunicación de información para la jornada electoral	Asignación de Medios de Comunicación	Dotar de los medios de comunicación complementarios a telefonía celular (voz y datos)	DEOE	25/04/2024
451	Preparación y ejecución del cómputo de las Elecciones	Previsiones logísticas y de seguridad para el desarrollo de los cómputos distritales	Presentar informe a la Secretaría Ejecutiva, la Comisión de Capacitación y Organización Electoral (CCOE) y, al CG sobre el proceso de planeación realizado por los consejos distritales con las previsiones logísticas y medidas de seguridad para el desarrollo de los cómputos distritales, considerando diversos escenarios, así como los acuerdos aprobados al respecto.	DEOE	30/04/2024
454	Planeación, aprobación y operación de los mecanismos de recolección de la Documentación Electoral al Término de la Jornada Electoral	Supervisión a la elaboración de los Estudios de factibilidad de los mecanismos de recolección	Dar seguimiento a la remisión del OPL al Consejo Local del INE de sus observaciones a los estudios de factibilidad y de la previsión presupuestal para la operación de los mecanismos de recolección de la elección local	DEOE	24/04/2024
507	Voto Anticipado en Territorio Nacional	Integración de documentación electoral	Dar seguimiento a la integración de los sobres paquete electoral de seguridad en la junta local ejecutiva	DEOE	30/04/2024
514	Implementación y Operación del SIJE	Preparación de la Implementación SIJE	Desarrollar el primer simulacro del SIJE	DEOE	25/04/2024
515	Conteos Rápidos Institucionales	Preparación del Conteo Rápido	Realizar el primer simulacro del Conteo Rápido	DEOE	25/04/2024
523	Voto de las Personas en Prisión Preventiva	Designación de observadoras/es electorales	Dar seguimiento a la designación de observadores y observadoras electorales para el voto de las personas en prisión preventiva.	DEOE	29/04/2024

ID	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Fecha de Término
39	Conformación del Padrón Electoral y Credencialización	Emisión de Listas Nominales de Electores	Recibir las solicitudes de expedición de credencial de los ciudadanos que habiendo cumplido los requisitos y trámites no hubiesen obtenido su Credencial para Votar con Fotografía durante el Proceso Electoral Federal 2023-2024.	DERFE	20/04/2024
40	Conformación del Padrón Electoral y Credencialización	Emisión de Listas Nominales de Electores	Recibir y resolver las solicitudes de rectificación de aquellos ciudadanos que habiendo obtenido oportunamente su Credencial para Votar con Fotografía, no aparezcan incluidos en la Lista Nominal de Electores de la sección correspondiente a su domicilio o consideren haber sido indebidamente excluidos de la Lista Nominal.	DERFE	20/04/2024
308	Conformación del Padrón Electoral y Credencialización	Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar	Informar a la Comisión Nacional de Vigilancia sobre el número de Credenciales para Votar que serán generadas, producto de una resolución favorable de una Instancia Administrativa o una Demanda de Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano.	DERFE	26/04/2024
459	Conformación del Padrón Electoral y Credencialización	Emisión de Listas Nominales de Electores	Generar los archivos de impresión desglosado por entidad, distrito, municipio, sección y casilla.	DERFE	21/04/2024
462	Conformación del Padrón Electoral y Credencialización	Emisión de Listas Nominales de Electores	Imprimir la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía.	DERFE	30/04/2024
476	Conformación del Padrón Electoral y Credencialización	Emisión de Listas Nominales de Electores	Generar, imprimir y entregar la LNEPP Definitiva a las JLE.	DERFE	26/04/2024
477	Conformación del Padrón Electoral y Credencialización	Emisión de Listas Nominales de Electores	Entregar la LNEVA Definitiva a las JLE.	DERFE	24/04/2024
499	Conformación del Padrón Electoral y Credencialización	Emisión de Listas Nominales de Electores	Proporcionar a la DEOE la LNED, una vez aprobada por el CG, con la cual se determinarán, en su caso, las cantidades de boletas faltantes a producir por las diferencias con el corte que se haya utilizado para iniciar la producción.	DERFE	30/04/2024

ID	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Fecha de Término
500	Conformación del Padrón Electoral y Credencialización	Determinación de la Calidad y Validez del Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores	Elaborar y someter a consideración del CG el proyecto de Acuerdo por el que se declara que el Padrón Electoral y los Listados Nominales de Electores que serán utilizados en la jornada electoral del 2 de junio de 2024, son válidos y definitivos.	DERFE	30/04/2024
281	Fiscalización del Proceso Electoral	Fiscalización de Apoyo Ciudadano, Precampaña, Campaña y Observadores Electorales	Presentar a la Comisión de Fiscalización un programa de trabajo de la fiscalización de campaña, mismo que deberá incluir la estrategia de capacitación, asesoría y acompañamiento a los partidos políticos, a las candidaturas, así como a las candidaturas independientes.	UTF	30/04/2024
415	Fiscalización del Proceso Electoral	Fiscalización de Apoyo Ciudadano, Precampaña, Campaña y Observadores Electorales	Elaborar y someter a consideración de la Comisión de Fiscalización y Consejo General, el Acuerdo de los plazos para la fiscalización de las organizaciones de observación electoral para el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024	UTF	30/04/2024
435	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	Sistema de Cómputos Tribunal: Verificar y validar los Componentes (Pruebas de aceptación).	UTSI	29/04/2024
510	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	Sistema de Voto Electrónico por Internet (SIVEI): Realizar Segundo Simulacro	UTSI	26/04/2024

Anexo 4. Relación de acuerdos aprobados, programados en el PlyCPEF 2023-2024

UR	Acuerdos	Fecha de aprobación	Núm. de Acuerdo	URL
DERFE	Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el número adicional de boletas electorales para las elecciones de Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos y Senadurías que se imprimirán para que las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero emitan su voto en el proceso electoral federal 2023-2024, así como su resguardo y destrucción en los términos del Libro Sexto de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.	27/03/2024	INE/CG329/2024	https://repositoriodocumental.ine.mx/mlui/handle/123456789/168985
DERFE	Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los “Criterios científicos, logísticos y operativos para la realización de los conteos rápidos y protocolo para la selección de las muestras”, que serán utilizados para la realización de los conteos rápidos de los resultados en las elecciones a celebrarse el 2 de junio de 2024, con motivo de los procesos electorales federal y locales 2023-2024. (Comisión del Registro Federal de Electores)	18/04/2024	INE/CG444/2024	https://repositoriodocumental.ine.mx/mlui/handle/123456789/169669
DEOE	Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el local único en el que se realizará el escrutinio y cómputo de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero; así como la logística para el escrutinio y cómputo del voto postal, electrónico por internet y presencial en sedes en el extranjero de las y los mexicanos residentes en el extranjero a desarrollar en el local único, para los procesos electorales federal y locales 2023-2024. (Comisión Temporal del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero)	18/04/2024	INE/CG445/2024	https://repositoriodocumental.ine.mx/mlui/handle/123456789/169671
