



Octavo Informe Parcial

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2023-2024

Mayo 2024

Glosario

CG / Consejo General	Consejo General del Instituto Nacional Electoral
CAE	Capacitador/a Asistente Electoral
CAI	Coordinación de Asuntos Internacionales
CCOE	Comisión de Capacitación y Organización Electoral
CNCS	Coordinación Nacional de Comunicación Social
DEA	Dirección Ejecutiva de Administración
DECEYEC	Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
DEOE	Dirección Ejecutiva de Organización Electoral
DEPPP	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos
DERFE	Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores
DESPEN	Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional
DJ	Dirección Jurídica
DO-CECyRD	Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores
Instituto/INE	Instituto Nacional Electoral
JD	Junta Distrital Ejecutiva
Junta/JGE	Junta General Ejecutiva
LGIPE	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
Metodología de Seguimiento	Metodología para el Seguimiento al Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2023-2024
OPL	Organismo(s) Público(s) Local(es)
PEF	Proceso Electoral Federal
PEL	Proceso Electoral Local
PlyCPEF 2023 - 2024	Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2023-2024
RE	Reglamento de Elecciones
SE	Supervisor/a Electoral

TGM	Talleres Gráficos de México
UR	Unidades Responsables: Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas del INE
UTCE	Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral
UTF	Unidad Técnica de Fiscalización
UTIGyND	Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación
UTSI	Unidad Técnica de Servicios de Informática
UTTyPDP	Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales

Índice

Contenido

Glosario	2
Índice	4
Introducción	5
1. Análisis cuantitativo y cualitativo	6
1.1 Actividades concluidas	7
1.2 Actividades en ejecución	8
1.2.1 Actividades en ejecución, en tiempo	9
1.2.2 Actividades en ejecución desfasadas	10
1.2.3 Actividades en riesgo	12
1.3 Actividades por iniciar y por concluir	12
1.4 Actividades que generan acuerdos o que dependen de aprobación de órganos desconcentrados	13
Conclusiones	14

Introducción

El 20 de julio de 2023, previo al inicio del Proceso Electoral Federal 2023-2024, el Consejo General, mediante Acuerdo INE/CG441/2023 aprobó el PlyCPEF 2023-2024 a propuesta de la Junta.

En cumplimiento al punto segundo del acuerdo referido, el 18 de septiembre la DEOE presentó ante las y los integrantes de la CCOE la Metodología de Seguimiento, que permitirá llevar el control y seguimiento de las actividades, así como la presentación de los informes correspondientes ante el Consejo General.

En dicho documento se establece que la DEOE elaborará informes mensuales, con las actividades que forman parte del PlyCPEF 2023-2024, detallando el estatus en el que se encuentran: concluidas, en ejecución (en tiempo, desfasadas y en riesgo), así como las actividades que están próximas a concluir y las que están por iniciar, para su presentación a los integrantes de la CCOE.

El Séptimo Informe Parcial, inmediato anterior al que aquí se integra, fue elaborado para su presentación a la CCOE con los avances reportados por las UR para el periodo del 23 de marzo al 19 de abril, y una vez aprobado, se presentó ante el CG contemplando el mismo periodo de ejecución.

Por lo anterior, el presente informe contempló el avance reportado por las Unidades Responsables en el periodo del 20 de abril al 10 de mayo para su presentación y aprobación por la CCOE en su Segunda Sesión Ordinaria celebrada el 20 de mayo de 2024. Una vez aprobado por dicha instancia, se actualiza al 17 de mayo, fecha de corte más cercana a su presentación ante CG en apego a la Metodología de Seguimiento. La fuente de información es la reportada por cada una de las UR en el aplicativo de seguimiento en forma semanal, quienes emiten sus propias valoraciones.

Octavo informe parcial del Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2023-2024. Actividades correspondientes al periodo del 20 de abril al 17 de mayo de 2024.


1. Análisis cuantitativo y cualitativo

El PlyCPEF 2023-2024 fue aprobado por CG con un total de 612 actividades, a la fecha de corte del periodo que se reporta, han sido procedentes seis solicitudes de incorporación y tres solicitudes de desincorporación por lo que, al corte del presente documento, al PlyCPEF lo integran un total de 615 actividades.

Al periodo, se tiene el siguiente avance general:

- 391 (63.58%) actividades están concluidas, 157 (25.53%) actividades están en ejecución y 67 (10.89%) actividades no han iniciado (Gráfica 1).

Gráfica 1
Distribución relativa y absoluta del avance general de actividades del PlyCPEF 2023-2024

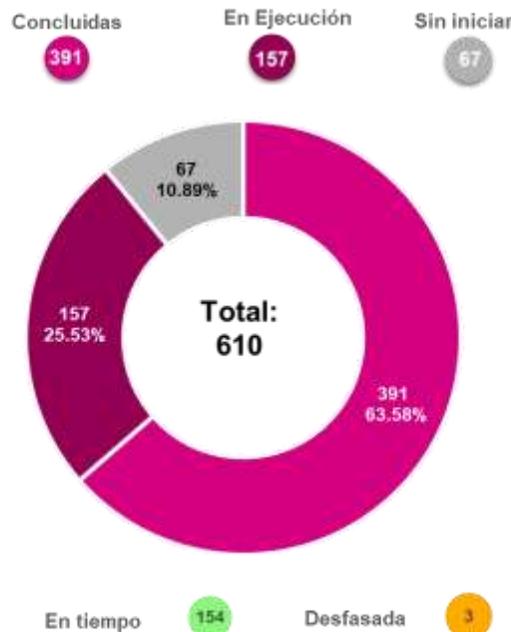


1.1 Actividades concluidas

De las 615 actividades se ha concluido un acumulado de 391 actividades, lo que representa 63.58% del total de actividades programadas.

Dentro del periodo que se reporta concluyeron 48 actividades. Por UR concluyeron conforme a lo siguiente: la DEOE con 18 (37.50%), la DERFE con 14 (29.17%), la UTSI con 10 (20.83%), la DECEYEC con tres (6.25%), la UTF, la UTIGYND y la DEPPP con una cada UR (2.08%). Los porcentajes se calculan respecto al total de actividades del periodo (Gráfica 2). El detalle de las actividades concluidas se muestra en el Anexo 1.


Gráfica 2
Distribución absoluta de actividades concluidas por UR del PlyCPEF 2023-2024

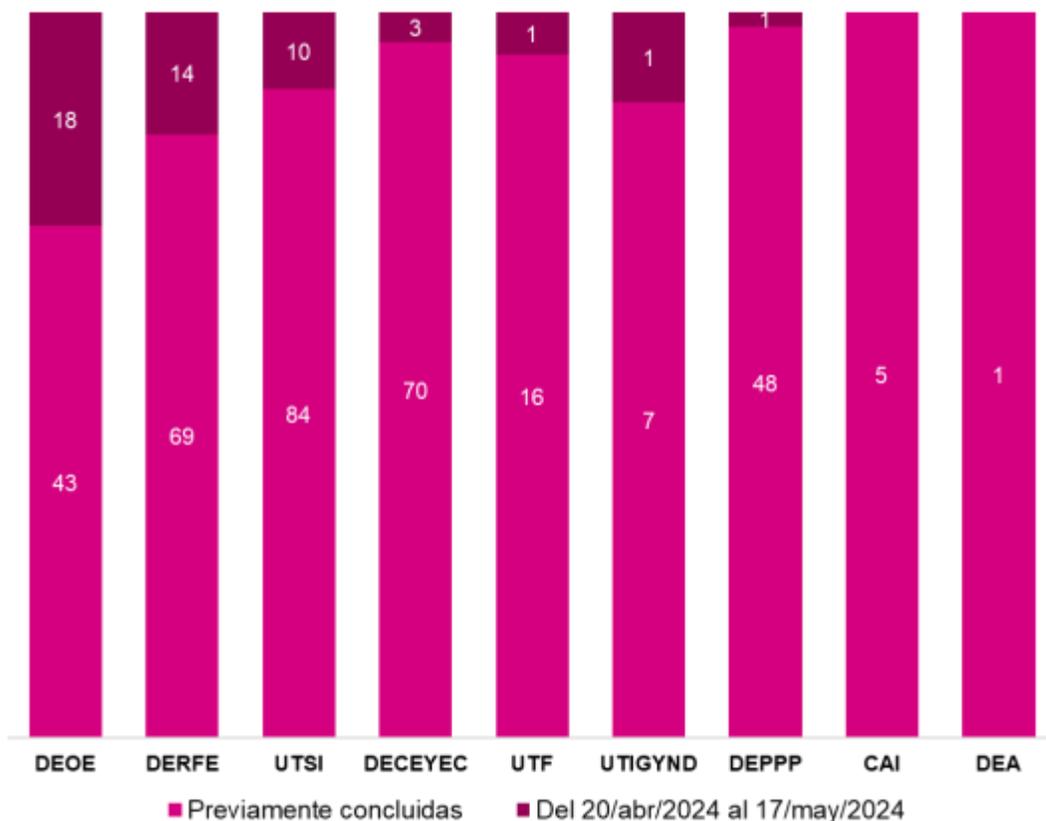

1.2 Actividades en ejecución

Al momento se encuentran en ejecución 157 actividades. El número de actividades en ejecución por UR se muestran en la Gráfica 3, donde destacan con mayor número de actividades en este estatus, la DEOE con 41 (26.11%), la DECEYEC con 27 (17.20%), la DEPPP con 18 (11.46%) y la DERFE con 15 (9.55%).


Gráfica 3
Total de actividades en ejecución por UR del PlyCPEF 2023-2024

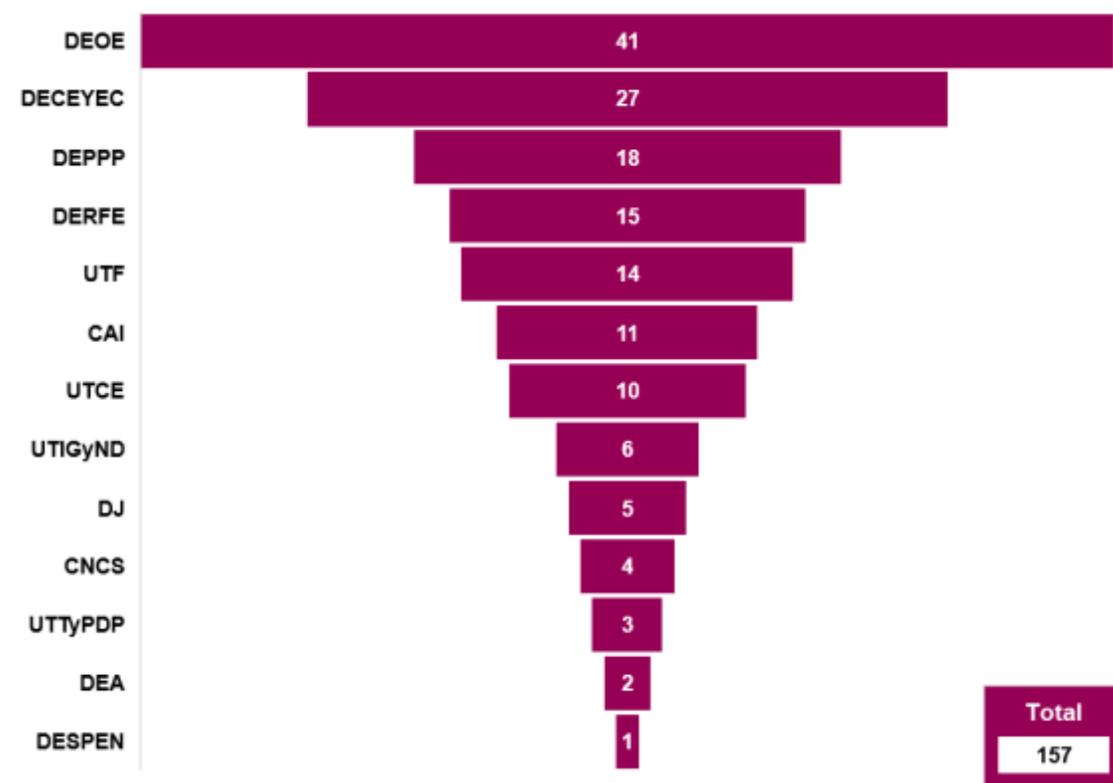

1.2.1 Actividades en ejecución, en tiempo

Por su parte, de las 157 actividades en ejecución, 154 (98.09%) se llevan a cabo conforme a las fechas establecidas, el desagregado por cada UR se muestra en la Gráfica 4.


Gráfica 4
Distribución absoluta del total de actividades en tiempo por UR del PlyCPEF 2023-2024

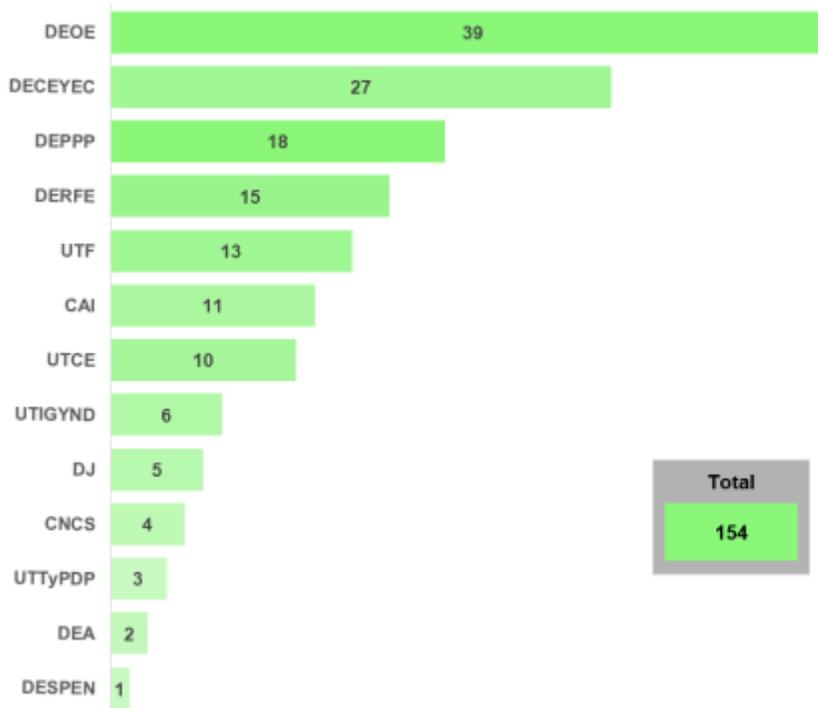

1.2.2 Actividades en ejecución desfasadas

De las 157 actividades que se encuentran en ejecución, tres (1.91%) se encuentran con estatus de desfasadas respecto al periodo programado (Gráfica 5).

Gráfica 5
Distribución absoluta del total de actividades desfasadas
por UR del PlyCPEF 2023-2024

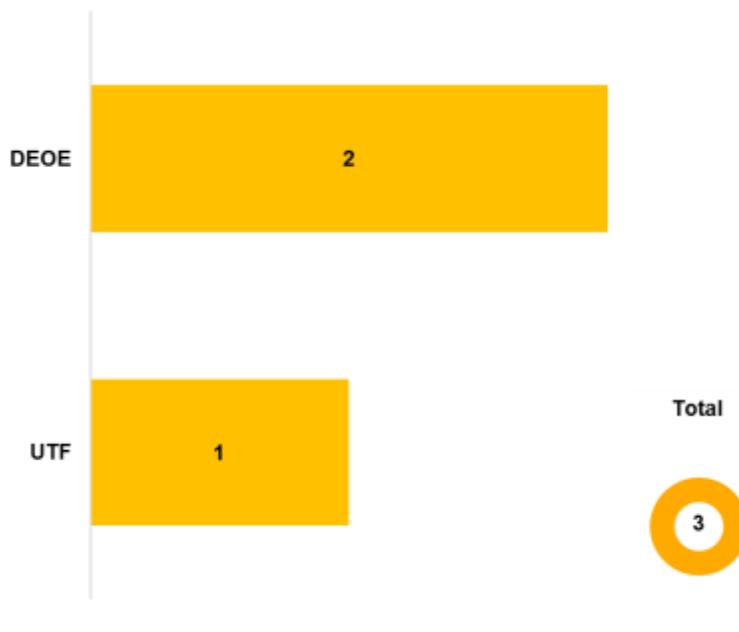

De las actividades que se encuentran con desfase, en el Cuadro 1 se describen las causas que lo originan, y en los casos en que sea procedente, las medidas adoptadas para llevarlas a término.

Cabe señalar que, para el presente corte de información, las actividades reportadas como desfasadas, la unidad responsable correspondiente, no indicó que presenten algún tipo de riesgo potencial que ponga en riesgo su cumplimiento.

Cuadro 1
Total de actividades desfasadas por UR del PlyCPEF 2023-2024

DEOE	
Actividad	Descripción desfase
<p>Dar seguimiento a las gestiones que realicen las juntas locales, para la firma de Convenios de Colaboración con las autoridades escolares de la entidad que corresponda.</p>	<p>31 entidades firmaron los Convenios de Colaboración con las autoridades escolares. Zacatecas continúa como la única entidad pendiente de firma. El Vocal Ejecutivo Local informó, mediante correo electrónico que el Convenio General de Colaboración INE-IEEZ y el Gobierno del Estado, ya fue revisado por la Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado de Zacatecas y señala que se firmará en breve. Reporta que la falta del convenio no ha implicado riesgos para el desarrollo de las actividades, y que se habían establecido acciones para realizar los recorridos y visitas de examinación incluyendo los planteles educativos propuestos para instalar casillas, afirmando que las actividades del Proceso Electoral están garantizadas.</p>
<p>Llevar a cabo la recepción, clasificación y resguardo de los sobres que contienen los votos emitidos por los mexicanos residentes en el extranjero.</p>	<p>La Secretaría Técnica Normativa de la DERFE, ha entregado a la DEOE 62,712 sobres voto, sin embargo, no se han podido registrar y clasificar en el Sistema Integral de Información del Registro Federal de Electores (SIIRFE), debido a que la DERFE continúa haciendo ajustes al módulo del sistema para el registro y clasificación, derivado de las solicitudes de registro para votar desde el extranjero que causaron baja inicialmente, y como resultado de la revisión a las solicitudes de aclaración realizadas por la DERFE, causaron alta nuevamente una vez concluido el 5 de mayo el periodo de rectificación y de subsane de las solicitudes.</p>
UTF	
Actividad	Descripción desfase
<p>Elaborar y someter a consideración de la Comisión de Fiscalización y Consejo General, el Acuerdo de los plazos para la fiscalización de las organizaciones de observación electoral para el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024.</p>	<p>EL 20 de mayo se presentará el proyecto de acuerdo de los plazos para la fiscalización de las organizaciones de observación electoral para el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024 a la Comisión de Fiscalización, en caso de aprobarse se presentará al CG en su siguiente sesión.</p>

1.2.3 Actividades en riesgo

De acuerdo con las valoraciones de las Unidades Responsables, a la fecha de corte del periodo que se reporta, ninguna actividad se encuentra bajo algún riesgo que pudiera obstaculizar potencialmente su ejecución o cumplimiento.

1.3 Actividades por iniciar y por concluir

De las 615 actividades que conforman el PlyCPEF 2023-2024, 16 actividades se encuentran próximas a iniciar su ejecución en el periodo del 18 de mayo a la fecha horizonte del 31 del mismo mes, lo que representa un 2.60% respecto del total (Cuadro 3). El detalle puede consultarse en el Anexo 2.

Cuadro 3
Distribución de Actividades por iniciar su ejecución por UR

Unidad Responsable	TOTAL	UTSI	DERFE	DEOE	DEPPP	CNCS
Actividades por iniciar	16	7	4	3	1	1

Las actividades que se tiene previsto que concluyan de acuerdo con la fecha de término que cada UR estableció, son 44, las cuales se distribuyen de la siguiente forma (Cuadro 4) (se agrega el detalle en el Anexo 3):

Cuadro 4
Distribución de Actividades por concluir su ejecución por UR

Unidad Responsable	TOTAL	DEOE	DEPPP	DERFE	UTSI	CAI	DECEYEC	UTF	CNCS	UTTyPDP
Actividades por concluir	44	11	8	8	6	6	2	1	1	1

1.4 Actividades que generan acuerdos o que dependen de aprobación de órganos desconcentrados

Se tienen programadas 57 actividades para aprobación de un acuerdo. Derivado de ello, al momento se cuenta con la aprobación acumulada de 52 (91.22%) acuerdos (Cuadro 5). Durante el periodo que se reporta se aprobaron dos acuerdos, uno por el CG y otro por la JGE cuyo enlace para su consulta se ubica en el Anexo 4.

Cuadro 5
Distribución del número acumulado de acuerdos aprobados por UR

UR	TOTAL	CAI	DECEYEC	DEOE	DEPPP	UTF	DERFE	UTSI
Acuerdos Aprobados	52	1	6	10	22	1	8	4

Conclusiones

En el lapso del presente informe, que contempla el periodo del 20 de abril al 17 de mayo de 2024, se analizaron 548 actividades, que equivalen al (89.11%) respecto a las 615 actividades que integran el PlyCPEF 2023-2024.

De las 548 actividades analizadas, 157 se encuentran en ejecución, 154 de ellas se desarrollan dentro del límite de tiempo previsto y tres se reportan con desfase. A la fecha de corte han concluido un total de 391 actividades, 48 de ellas dentro del periodo que se reporta.

A la fecha de corte del periodo que contempla este informe, ninguna actividad se reporta en riesgo de acuerdo con las valoraciones que realiza la UR.

Durante el periodo reportado, se aprobaron dos acuerdos, por lo que a la fecha de corte se acumulan 52 acuerdos aprobados de los 57 que forman parte de las actividades del PlyCPEF 2023-2024.

Finalmente, para el periodo del 18 al 31 de mayo de 2024, se tiene previsto que den inicio 16 actividades y que concluyan 44 actividades dentro de ese mismo periodo.

Anexo 1. Relación de actividades concluidas

ID	Proceso	Subproceso	UR	Actividad	Entregable	Valoración de la UR
377	Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero	Capacitación Electoral e Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo MEC	DECEYEC	Elaborar el Apartado de Capacitación Electoral e Integración de MEC y MRV del VMRE para el Informe de Primera Etapa de Capacitación Electoral	Archivo electrónico	Se elaboró el Apartado de Capacitación Electoral e Integración de MEC y MRV del VMRE para el Informe de Primera Etapa de Capacitación Electoral.
453	Fortalecimiento de la Educación Cívica y Participación Ciudadana	Evaluación de Estrategias de Campañas Institucionales, Educación Cívica y Participación Ciudadana	DECEYEC	Presentar el segundo informe de la implementación del Programa de Promoción de la Participación Ciudadana en el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024 a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral	Informe	El segundo informe de la implementación del Programa de Promoción de la Participación Ciudadana en el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024 fue presentado de manera exitosa en la Sexta Sesión Extraordinaria de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, misma que tuvo verificativo el 26 de abril de 2024 a las 10:00 horas.
503	Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero	Capacitación Electoral e Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo MEC	DECEYEC	Integrar y someter a aprobación el Listado del personal del INE que podrá realizar labores de suplencias en las MEC el día de la Jornada Electoral	Acuerdo	El 14 de mayo la Junta General Ejecutiva aprobó por unanimidad el Listado de las personas servidoras públicas del Instituto Nacional Electoral que podrán realizar labores de suplencia en caso de ausencia de las personas Funcionarias de las Mesas de Escrutinio y Cómputo en sus modalidades Postal, Postal Única y Electrónica el día de la jornada electoral del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero en los Procesos Electorales Federal y Locales 2023-2024.
3	Generación de Documentación y Materiales Electorales	Elaboración de Documentación y Materiales Electorales	DEOE	Supervisar la producción de la documentación electoral	Informe	La producción de la "documentación electoral" ha concluido. En su caso, se atenderán eventuales requerimientos de documentación adicional por parte de los distritos, si detectasen faltantes al interior de las cajas.
4	Generación de Documentación y Materiales Electorales	Elaboración de Documentación y Materiales Electorales	DEOE	Supervisar la producción de los materiales electorales	Informe	La producción de los materiales está concluida. Se trabaja en la elaboración del informe final sobre la producción, almacenamiento y distribución de la documentación y los materiales electorales para el Proceso Electoral Federal 2023-2024, que está programado para

ID	Proceso	Subproceso	UR	Actividad	Entregable	Valoración de la UR
						presentarse a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral en el mes de julio de 2024.
5	Generación de Documentación y Materiales Electorales	Distribución de Documentación y Materiales Electorales	DEOE	Llevar a cabo el almacenamiento de la documentación y materiales electorales en el Centro Logístico de Distribución de la DEOE	Informe	Se recibieron, clasificaron por entidad y distrito y se almacenaron en el Centro Logístico de Distribución 3,687,967 "boletas electorales de la elección de diputaciones federales", correspondientes a los estados de México y Puebla. Con ello se concluyó la recepción de la documentación electoral.
6	Generación de Documentación y Materiales Electorales	Distribución de Documentación y Materiales Electorales	DEOE	Distribuir la documentación y materiales electorales del Centro Logístico de Distribución de la DEOE a los 300 consejos distritales	Informe	Del 11 al 17 de mayo salieron del Centro Logístico de Distribución 148 vehículos llevando un peso total de 1,128,027 kg a distritos de Colima, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Puebla y Veracruz. Con la salida de vehículos el 17 de mayo, trasladando la documentación electoral al Estado de México, se finaliza la distribución custodiada a los 300 consejos distritales.
387	Comunicación de información para la jornada electoral	Asignación de Medios de Comunicación	DEOE	Dotar de los medios de comunicación complementarios a telefonía celular (voz y datos)	Oficio / Circular	Se realizó la entrega de los equipos satelitales en las Juntas Locales de las 19 entidades, así como transferencia de conocimientos sobre la funcionalidad de los equipos entre el 15 y 19 de abril. Se solicitó a las entidades la redistribución de los recursos de las Juntas Locales a las Juntas Distritales para cubrir los servicios de Telefonía Pública Rural, así como de Internet Local.

ID	Proceso	Subproceso	UR	Actividad	Entregable	Valoración de la UR
445	Implementación y Operación del SIJE	Preparación de la Implementación SIJE	DEOE	Realizar las pruebas de captura con la herramienta informática del SIJE	Reporte	<p>El día 23 de abril se llevó a cabo la prueba adicional de captura en dos horarios, de 11:00 a 14:00 para la captura de información en las casillas y de 17:00 a 19:00 horas para la captura de información en MEC.</p> <p>Para esta prueba, el acceso de las y los usuarios se realizó mediante las cuentas y contraseñas de los correos institucionales, no obstante, se reportaron problemas de acceso por parte de las juntas ejecutivas locales y distritales, así como por parte del personal de la DEOE. Asimismo, continuaron las dificultades de acceso en la App SIJE para algunas/os CAE, así como para el envío de la información y para la visualización de los módulos para el reporte de MEC en las y los CAE a quienes les fueron asignadas.</p>
451	Preparación y ejecución del cómputo de las Elecciones	Previsiones logísticas y de seguridad para el desarrollo de los cómputos distritales	DEOE	Presentar informe a la Secretaría Ejecutiva, la Comisión de Capacitación y Organización Electoral (CCOE) y, al CG sobre el proceso de planeación realizado por los consejos distritales con las provisiones logísticas y medidas de seguridad para el desarrollo de los cómputos distritales, considerando diversos escenarios, así como los acuerdos aprobados al respecto.	Informe	El 30 de abril de 2024, se presentó a consideración del Consejo General el Informe sobre el proceso de planeación realizado por los 300 consejos distritales con las provisiones logísticas y medidas de seguridad para el desarrollo de los cómputos distritales.
454	Planeación, aprobación y operación de los mecanismos de recolección de la Documentación Electoral al Término de la Jornada Electoral	Supervisión a la elaboración de los Estudios de factibilidad de los mecanismos de recolección	DEOE	Dar seguimiento a la remisión del OPL al Consejo Local del INE de sus observaciones a los estudios de factibilidad y de la previsión presupuestal para la operación de los mecanismos de recolección de la elección local	Reporte	De los 32 organismos públicos locales, 5 respondieron que no tenían observaciones, 27 enviaron observaciones a los estudios de factibilidad y 8 a la previsión presupuestal.

ID	Proceso	Subproceso	UR	Actividad	Entregable	Valoración de la UR
473	Conteos Rápidos Institucionales	Ejecución y Emisión de Resultados del Conteo Rápido	DEOE	Realizar las pruebas de captura en el Sistema Informático del Conteo Rápido (SICR)	Reporte	<p>Durante la semana del 8 al 12 de abril de 2024, se realizaron las prácticas de captura en el Sistema Informático del Conteo Rápido, las cuales tienen como objetivo verificar la precisión y rapidez de captura por parte de las y los capturistas.</p> <p>Durante estas prácticas se identificaron las siguientes incidencias en el funcionamiento del sistema:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Casillas que no confrontaban correctamente los datos. 2. Problemas de acceso al sistema por redireccionamiento en el servidor. 3. Error en la configuración de los reportes a nivel nacional y estatal, ya que no coincidían con la nueva redistribución. 4. Intermittencia del sistema informático del conteo rápido. <p>De todas estas situaciones se levantó caso CAU y se informó a la UTSI para su atención. Respecto a las pruebas de aceptación del Sprint 3 sobre el desarrollo del Sistema Informático del Conteo Rápido, se tenía previsto realizar del 8 al 10 de abril de 2024, sin embargo, se recibieron los insumos por parte de la UTSI hasta el día 17 de abril de 2024 y se remitieron los hallazgos el 19 de abril.</p> <p>Del 15 al 19 de abril las Juntas Distritales, realizaron capturas en el ambiente que se utilizará durante el primer simulacro del Conteo Rápido, las incidencias identificadas en el sistema se reportaron en su momento a la UTSI y se levantó caso CAU.</p> <p>En coordinación con la UTSI se realizó una prueba captura adicional, para el día 22 de abril de 2024, los hallazgos derivados de esta prueba, se hicieron del conocimiento de la UTSI.</p>

ID	Proceso	Subproceso	UR	Actividad	Entregable	Valoración de la UR
507	Voto Anticipado en Territorio Nacional	Integración de documentación electoral	DEOE	Dar seguimiento a la integración de los sobres paquete electoral de seguridad en la junta local ejecutiva	Reporte	A la fecha de corte se informa que la totalidad de las entidades cuentan con la integración de los Sobre Paquete Electoral de Seguridad Junta Local (SPES JL), de igual manera se informa que el 15 de mayo del 2024 el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones entregó la documentación y materiales electorales, además se integraron los SPES JL , con ello, la actividad marcada con el número 41 del cronograma de actividades del Modelo de Operación para la Organización del Voto Anticipado se da por concluida.
511	Planeación, aprobación y operación de los mecanismos de recolección de la Documentación Electoral al Término de la Jornada Electoral	Supervisión a la aprobación de los mecanismos de recolección	DEOE	Dar seguimiento a la aprobación de los mecanismos de recolección, y ajustes a los mismos para las elecciones federales y locales	Reporte	En total se aprobaron 85,908 mecanismos de recolección; 2,246 CRyT Fijos; 64,415 CRyT Itinerantes; y 19,247 Dispositivos de Apoyo y Traslado de Funcionariado de Mesas Directivas de Casilla. Por ámbito: 34,903 federales; 40,532 locales y 10,473 mixtos.

ID	Proceso	Subproceso	UR	Actividad	Entregable	Valoración de la UR
514	Implementación y Operación del SIJE	Preparación de la Implementación SIJE	DEOE	Desarrollar el primer simulacro del SIJE	Reporte	<p>El día 25 de abril de 2024 se llevó a cabo el primer simulacro del SIJE en dos fases: En la primera, de 10:00 a 14:00 horas, se capturó información sobre las casillas y los Módulos Receptores de Votación (MRV), estos últimos, en oficinas centrales.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De las 170,831 casillas disponibles, se reportaron 167,470 (98.03%), de las cuales 166,947 (99.69%) se reportaron como instaladas y 523 (0.31%) como no instaladas. • De las 166,947 reportadas como instaladas, de 166,289 (99.61%) se reportó la totalidad de la información sobre su instalación. • De las 166,289 casillas con primer reporte concluido, 162,641 (97.81%) contaron con su segundo reporte. • Se capturaron 29,659 incidentes en las casillas, un 63.98% más de los que fueron solicitados. • Se capturó información de 15 de las 23 MRV disponibles. <p>En la segunda fase, de 17:00 a 18:30 horas, se capturó información sobre las Mesas de Escrutinio y Cómputo (MEC).</p> <ul style="list-style-type: none"> • De las 433 MEC disponibles para la captura, 285 correspondieron a la modalidad de Voto Anticipado y 158 a la de Voto de Personas en Prisión Preventiva. • De las 433 MEC se capturó información en 406 MEC (91.65%). • Se capturaron 434 incidentes en las MEC. <p>Durante el simulacro, se reportaron dificultades de acceso en la App SIJE, así como para el envío de información, además de lentitud en la generación de reportes, falta de consolidación de la información capturada e inconsistencia en algunos datos.</p>

ID	Proceso	Subproceso	UR	Actividad	Entregable	Valoración de la UR
515	Conteos Rápidos Institucionales	Preparación del Conteo Rápido	DEOE	Realizar el primer simulacro del Conteo Rápido	Informe	<p>De las 170,831 casillas aprobadas por los consejos distritales, se seleccionaron 51,608 (30.2%) casillas para este primer simulacro. Del total de las casillas seleccionadas, 17,592 fueron de la submuestra del COTECORA, para realizar las estimaciones, y las restantes 34,016 casillas conformaron una submuestra complementaria, para asignarles casillas a las y los CAE y SE que no les tocó casilla seleccionada por el COTECORA, a fin de que la totalidad de estas figuras practiquen el reporte desde campo.</p> <p>La cobertura de casillas reportadas por tipo de elección fue la siguiente: Presidencia, el 97.3%. Senaduría, el 97.8%. Diputaciones, el 97.8 %. Gubernatura de Chiapas, el 85.7%. Jefatura de Gobierno de Ciudad de México, el 97.8%. Gubernatura de Guanajuato, el 95.3%. Gubernatura de Jalisco, el 82.0%. Gubernatura de Morelos, el 87.0%. Gubernatura de Puebla, el 89.3%. Gubernatura de Tabasco, el 97.9%. Gubernatura de Veracruz, el 97.1%. Gubernatura de Yucatán, el 98.7%.</p> <p>Fue posible probar el esquema de contingencia por la suspensión de la energía eléctrica en las sedes de las juntas distritales ejecutivas 05 Poza Rica de Hidalgo y 13 Huatusco del estado de Veracruz.</p> <p>Se tuvo la incidencia de la interrupción del funcionamiento del sistema informático, por aproximadamente 40 minutos, derivado de esta incidencia el simulacro se extendió una hora más cerrando a las 19:00 horas (horario del centro del país).</p>
522	Recepción de Paquetes Electorales al Término de la	Supervisión a la aprobación del Modelo Operativo de	DEOE	Dar seguimiento a la aprobación del modelo operativo para la recepción de los paquetes electorales en los consejos distritales	Reporte	Se reporta la conclusión de la actividad. Entre el 6 de abril y el 9 de mayo, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral dio seguimiento a la

ID	Proceso	Subproceso	UR	Actividad	Entregable	Valoración de la UR
	Jornada Electoral	Recepción de los Paquetes Electorales al término de la Jornada Electoral				aprobación de los Modelos Operativos en los 300 distritos del país.
523	Voto de las Personas en Prisión Preventiva	Designación de observadoras/es electorales	DEOE	Dar seguimiento a la designación de observadores y observadoras electorales para el voto de las personas en prisión preventiva.	Reporte	Derivado del seguimiento realizado a la actividad, se informa que a la fecha de corte se aprobaron los acuerdos y se presentaron los informes correspondientes a la designación de las personas acreditadas como observadoras electorales en el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024, que podrán dar seguimiento al periodo de votación anticipada de las personas en prisión preventiva al interior de los centros penitenciarios.
525	Preparación y ejecución del cómputo de las Elecciones	Preparación del Sistema de Registro de Actas de Escrutinio y Cómputo de Casilla (SRA) y del Sistema de Cómputos Distritales y de Circunscripción	DEOE	Desarrollar el segundo Simulacro del Sistema de Registro de Actas de Escrutinio y Cómputo de Casilla (SRA) y del Sistema de Cómputos Distritales y de Circunscripción.	Reporte	Los días 2 y 3 de mayo de 2024 se llevaron a cabo los simulacros del Sistema de Registro de Actas y del Sistema de Cómputos Distritales, de Entidad Federativa y de Circunscripción, en los que participaron las 300 juntas distritales ejecutivas y las 32 juntas locales ejecutivas.

ID	Proceso	Subproceso	UR	Actividad	Entregable	Valoración de la UR
530	Implementación y Operación del SIJE	Preparación de la Implementación SIJE	DEOE	Desarrollar el segundo simulacro del SIJE	Reporte	<p>El día 5 de mayo se llevó a cabo el segundo simulacro del SIJE en dos fases: De 10:00 a 14:00 horas, se capturó información sobre las casillas y los Módulos Receptores de Votación (MRV).</p> <ul style="list-style-type: none"> •De las 170,319 casillas disponibles, se reportaron 170,085 (99.86%), 169,489 (99.65%) de ellas se reportaron como instaladas y 596 (0.35%) como no instaladas. •De las 169,489 casillas reportadas como instaladas, en el 99.96% (169,424) se reportó la totalidad de la información sobre su instalación. •De las 169,424 casillas en las cuales se tuvo el primer reporte concluido, el 99.70% (168,917) contaron con su segundo reporte. •Se capturaron 23,030 incidentes en las casillas, un 27.33% más de los solicitados. •Se capturó información sobre las 23 MRV. <p>En la segunda fase, de 17:00 a 18:30 horas, se capturó información sobre las Mesas de Escrutinio y Cómputo (MEC).</p> <ul style="list-style-type: none"> •El sistema contó con 530 MEC disponibles para la captura, 279 correspondieron a la modalidad de Voto Anticipado, 156 a la de Voto de Personas en Prisión Preventiva y 95 al Voto de mexicanas/os residentes en el extranjero. •De las 530 MEC disponibles, se capturó información en 441 MEC (83.21%). •Se capturaron 612 incidentes en las MEC. <p>Durante el simulacro, se reportaron inconsistencias y falta de consolidación de la información capturada en los reportes, así como dificultades para la descarga de las bases de datos y navegación en los reportes de MEC.</p>
531	Conteos Rápidos Institucionales	Preparación del Conteo Rápido	DEOE	Realizar el segundo simulacro del Conteo Rápido	Informe	<p>De las 170,320 casillas aprobadas por los consejos distritales, se seleccionaron 54,548 (32.0%) casillas para este segundo simulacro. Del total de las casillas seleccionadas, 17,592 fueron de la submuestra del COTECORA, para</p>

ID	Proceso	Subproceso	UR	Actividad	Entregable	Valoración de la UR
						<p>realizar las estimaciones, y las restantes 36,956 casillas conformaron una submuestra complementaria, para asignarles casillas a las y los CAE y SE que no les tocó casilla seleccionada por el COTECORA, a fin de que la totalidad de estas figuras practiquen el reporte desde campo.</p> <p>La cobertura de casillas reportadas por tipo de elección fue la siguiente: Presidencia, el 99.8%. Senaduría, el 99.9%. Diputaciones, el 99.8 %. Gubernatura de Chiapas, el 98.5%. Jefatura de Gobierno de Ciudad de México, el 100%. Gubernatura de Guanajuato, el 99.0%. Gubernatura de Jalisco, el 100%. Gubernatura de Morelos, el 100%. Gubernatura de Puebla, el 100%. Gubernatura de Tabasco, el 100%. Gubernatura de Veracruz, el 100%. Gubernatura de Yucatán, el 100%.</p> <p>Fue posible probar el esquema de contingencia por las siguientes situaciones: 1. Distrito 06 de Nuevo León, problemas con las líneas telefónicas. 2. Distrito 17 de Jalisco, falta de energía eléctrica. 3. Distrito 36 del Estado de México, interrupción en los servicios de luz, internet, telefonía celular y telefonía fija. 4. Distrito 06 de Veracruz, falta de energía eléctrica.</p> <p>Respecto al funcionamiento del sistema mostró una mejoría considerable con relación al simulacro anterior, sin embargo, aún falta afinar detalles.</p>

ID	Proceso	Subproceso	UR	Actividad	Entregable	Valoración de la UR
274	Monitoreo y Equidad en Materia de Radio y Televisión durante Proceso Electoral	Equidad en Materia de Radio y Televisión durante Proceso Electoral	DEPPP	Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema Certeza para monitoreo de Redes sociales	Reporte	Se analizó, diseñó y desarrolló el Sistema Certeza para monitoreo de Redes sociales
39	Conformación del Padrón Electoral y Credencialización	Emisión de Listas Nominales de Electores	DERFE	Recibir las solicitudes de expedición de credencial de los ciudadanos que habiendo cumplido los requisitos y trámites no hubiesen obtenido su Credencial para Votar con Fotografía durante el Proceso Electoral Federal 2023-2024.	Otro	Durante el periodo del 1 de septiembre del 2023 al 20 de abril de 2024, se recibieron 352 Solicitudes de Expedición de Credencial para Votar.
40	Conformación del Padrón Electoral y Credencialización	Emisión de Listas Nominales de Electores	DERFE	Recibir y resolver las solicitudes de rectificación de aquellos ciudadanos que habiendo obtenido oportunamente su Credencial para Votar con Fotografía, no aparezcan incluidos en la Lista Nominal de Electores de la sección correspondiente a su domicilio o consideren haber sido indebidamente excluidos de la Lista Nominal.	Otro	Durante el periodo del 1 de septiembre del 2023 al 20 de abril de 2024, se recibieron 69 solicitudes de Rectificación a la Lista Nominal de Electores, de las cuales 17 resultaron procedentes, 18 improcedente y 4 sobreseimientos. Encontrándose 30 pendientes.
42	Conformación del Padrón Electoral y Credencialización	Emisión de Listas Nominales de Electores	DERFE	Recibir y tramitar las Demandas de Juicio para la protección de los derechos político-electorales que el ciudadano presente respecto a la resolución negativa o no contestación en tiempo de una solicitud de rectificación a la Lista Nominal o de expedición de Credencial, a efecto de garantizar el derecho al sufragio de los ciudadanos.	Otro	Durante el periodo del 1 de septiembre del 2023 al 9 de mayo de 2024, se presentaron 39 Demandas de Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, de las cuales 7 fueron desechadas, 13 se confirmaron y 10 revocadas. Encontrándose 9 pendientes.

ID	Proceso	Subproceso	UR	Actividad	Entregable	Valoración de la UR
44	Conformación del Padrón Electoral y Credencialización	Emisión de Listas Nominales de Electores	DERFE	Resolver la procedencia o improcedencia de las solicitudes de expedición de credencial de los ciudadanos que habiendo cumplido los requisitos y trámites no hubiesen obtenido su Credencial para Votar con Fotografía durante el Proceso Electoral Federal 2023	Otro	Durante el periodo del 1 de septiembre del 2023 al 9 de mayo de 2024, se emitieron 352 Opiniones Técnicas Normativas correspondientes a Solicitudes de Expedición de Credencial para Votar, de las cuales 243 resultaron procedentes, 75 improcedentes y 34 sobreseídas
308	Conformación del Padrón Electoral y Credencialización	Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar	DERFE	Informar a la Comisión Nacional de Vigilancia sobre el número de Credenciales para Votar que serán generadas, producto de una resolución favorable de una Instancia Administrativa o una Demanda de Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano.	Otro	Al 26 de abril de 2024, se han procesado exitosamente 2,376 Instancias Administrativas, de las cuales se entregaron 1,803 Credenciales para Votar, y 2 Demandas de Juicio por resolución favorable, de las cuales se ha entregado 1 Credencial para Votar.
449	Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero	Organización para la Emisión del VMRE	DERFE	Producir, Integrar y enviar la documentación y materiales electorales a la ciudadanía residente en el extranjero para el ejercicio de su voto.	Informe	La recepción de materiales para la integración del Paquete Electoral Postal (PEP) correspondiente al Proceso Electoral Federal (PEF) fue del 12 al 18 de abril y el 3 de mayo, para los Procesos Electorales Locales (PEL) fue del 8 de abril al 4 de mayo, de igual modo la integración de los PEP fue del 15 de abril al 6 de mayo. Asimismo, el envío de los PEP, fue del 23 al 6 de mayo.
459	Conformación del Padrón Electoral y Credencialización	Emisión de Listas Nominales de Electores	DERFE	Generar los archivos de impresión desglosado por entidad, distrito, municipio, sección y casilla.	Reporte	Al 21 de abril se generaron los archivos para la impresión de los Listados Nominales de Electores, considerando los archivos para la elección federal y local concurrente y los listados diferenciados solicitados por los OPL.
462	Conformación del Padrón Electoral y Credencialización	Emisión de Listas Nominales de Electores	DERFE	Imprimir la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía.	Reporte	Del 6 al 26 de abril, se llevó a cabo la impresión de los Listados Nominales de Electores Definitivos, considerando las impresiones de los tantos requeridos para la elección federal y local concurrente y los listados diferenciados solicitados por los OPL.

ID	Proceso	Subproceso	UR	Actividad	Entregable	Valoración de la UR
476	Conformación del Padrón Electoral y Credencialización	Emisión de Listas Nominales de Electores	DERFE	Generar, imprimir y entregar la LNEPP Definitiva a las JLE.	Oficio / Circular	Se realizaron actividades de coordinación con las JLE para la entrega de la LNEPP.
477	Conformación del Padrón Electoral y Credencialización	Emisión de Listas Nominales de Electores	DERFE	Entregar la LNEVA Definitiva a las JLE.	Oficio / Circular	Se realizaron actividades de coordinación con las JLE para la entrega de la LNEVA.
497	Conformación del Padrón Electoral y Credencialización	Emisión de Listas Nominales de Electores	DERFE	Entregar la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía a los Consejos Locales.	Acta	Del 16 al 29 de abril, se realizó la entrega de los Listados Nominales de Electores Definitivos a los 32 Consejos Distritales.
499	Conformación del Padrón Electoral y Credencialización	Emisión de Listas Nominales de Electores	DERFE	Proporcionar a la DEOE la LNEDE, una vez aprobada por el CG, con la cual se determinarán, en su caso, las cantidades de boletas faltantes a producir por las diferencias con el corte que se haya utilizado para iniciar la producción.	Correo electrónico	Se realizó la entrega de estadísticos de la LNE Definitiva a la DEOE. Se dará seguimiento, en su caso, de las adendas a la LNEDE que pudieran integrarse, con la finalidad de proporcionar la información a las áreas para las actividades correspondientes.
500	Conformación del Padrón Electoral y Credencialización	Determinación de la Calidad y Validez del Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores	DERFE	Elaborar y someter a consideración del CG el proyecto de Acuerdo por el que se declara que el Padrón Electoral y los Listados Nominales de Electores que serán utilizados en la jornada electoral del 2 de junio de 2024, son válidos y definitivos.	Acuerdo	En sesión ordinaria del 30 de abril de 2024, el Consejo General aprobó el Acuerdo por el que se declara que el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores que serán utilizados en las elecciones federales y locales del 2 de junio de 2024, son válidos y definitivos.
517	Orientación, Atención y Servicios Registrales para la Ciudadanía y Actores Externos	Productos y Servicios Registrales a la Ciudadanía	DERFE	Configurar el Sistema de Consulta en Casillas Especiales y preparar el Centro de Ayuda y Campus Virtual.	Reporte	Se notifico por medio de correo electrónico a los operadores del equipo de cómputo del Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE), el ingreso al Campus Virtual y al Centro de Ayuda, donde podrán realizar los ejercicios de capacitación y descarga el material de apoyo, así como el ejecutable del SICCE respectivamente.

ID	Proceso	Subproceso	UR	Actividad	Entregable	Valoración de la UR
281	Fiscalización del Proceso Electoral	Fiscalización de Apoyo Ciudadano, Precampaña, Campaña y Observadores Electorales	UTF	Presentar a la Comisión de Fiscalización un programa de trabajo de la fiscalización de campaña, mismo que deberá incluir la estrategia de capacitación, asesoría y acompañamiento a los partidos políticos, a las candidaturas, así como a las candidaturas independientes.	Programa	Se presentó ante la COF el segundo Programa de trabajo de campaña, mismo que incluirá la estrategia de capacitación, asesoría y acompañamiento a los partidos políticos, a las candidaturas independientes.
713	Gestión de la Política de Igualdad de Género y No Discriminación	Transversalización, Vinculación e Investigación en Materia de IGyND	UTIGYND	Revisar por parte de la DEPPP, en conjunto con la DJ, la UTCE y la UTIGyND las evidencias documentales que remitan las instancias requeridas o la ciudadanía, a fin de determinar con certeza si las personas candidatas se encuentran en los supuestos del artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.	Documento	Por parte de la UTIGyND se realizó la revisión y análisis de los 13 casos presentados por la ciudadanía. De los cuales 7 no tuvieron elementos para encontrarse en los supuestos de la 8 de 8, 4 faltaban elementos indispensables para determinar la pertinencia de la 8 de 8 y 2 se encontraron elementos que colocan a las personas candidatas en los supuestos establecidos para retirar el registro de la candidatura. Dichos análisis están disponibles en: https://inemexico-my.sharepoint.com/personal/yuliana_lopez_ine_mx/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fyuliana%5Flopez%5Fine%5Fmx%2FDocuments%2FCasos%20Ciudadan%C3%ADa%208%20de%208&ga=1
339	Operación del PREP	Logística y Suministros de Materiales	UTSI	PREP Federal 2023-2024: Habilitar los Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CATD)	Reporte	Se terminó con la habilitación y configuración del CATD restante.
435	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	UTSI	Sistema de Cómputos Tribunal: Verificar y validar los Componentes (Pruebas de aceptación).	Oficio / Circular	Se realizaron las pruebas de aceptación de acuerdo con lo planeado con el área usuaria.

ID	Proceso	Subproceso	UR	Actividad	Entregable	Valoración de la UR
510	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	UTSI	Sistema de Voto Electrónico por Internet (SIVEI): Realizar Segundo Simulacro	Informe	Se llevó a cabo el 2do simulacro, terminando el 26 de abril.
526	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	UTSI	Sistema de Registro de Actas: Verificar y validar los Componentes (Pruebas de aceptación).	Oficio / Circular	Se realizaron las pruebas y simulacro el 2 de mayo, conforme la circular INE/DEOE-DECEYEC-UTF-UTSI/001/2023.
527	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	UTSI	Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE): Verificar y validar los Componentes (Pruebas de aceptación).	Oficio / Circular	Se realizaron las pruebas de aceptación del 29 al 30 de abril, conforme lo acordado con el área usuaria.
528	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	UTSI	Sistema de Voto Electrónico por Internet (SIVEI): Envío de cuentas de acceso a la ciudadanía	Informe	Se enviaron las cuentas de acceso a la ciudadanía, de acuerdo con lo programado.
529	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	UTSI	Sistema de Voto Electrónico por Internet (SIVEI): Periodo de Socialización	Informe	La actividad de socialización finalizó el día 15 de mayo conforme a lo planeado y sin contratiempo, contando con una participación de 40,782 personas, correspondiente al 33.57% de los votantes registrados.

ID	Proceso	Subproceso	UR	Actividad	Entregable	Valoración de la UR
536	Operación del PREP	Operación de Campo PREP	UTSI	PREP Federal 2023-2024: Realizar Primer simulacro	Informe	El simulacro se llevó a cabo de acuerdo con lo planeado, con la participación el personal contratado en las Juntas Distritales y a nivel central, así como personal de base, en la semana posterior se realizaron los ajustes operativos y técnicos en preparación para el Segundo simulacro del 19 de mayo.
541	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	UTSI	Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE: Verificar y validar los Componentes (Pruebas de aceptación).	Oficio / Circular	Se llevaron a cabo las pruebas de aceptación del sprint 1, 2 y 3 del 10 al 16 de mayo de 2024, en coordinación con el área usuaria.
545	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	UTSI	Sistema de Voto Electrónico por Internet (SIVEI): Ratificar la oferta electoral	Informe	La actividad de ratificación de la oferta electoral se llevó a cabo el 16 de mayo, conforme a lo planeado, mediante sesión con los OPL.

Anexo 2. Relación de actividades por iniciar en el PlyCPEF 2023-2024

ID	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Fecha de Inicio
560	Gestión de la Comunicación Social del INE	Definición de la Estrategia de Comunicación Social	Proporcionar espacios físicos en Oficinas Centrales del Instituto con las condiciones necesarias, para facilitar la labor informativa de los medios de comunicación durante la Jornada Electoral.	CNCS	27/05/2024
547	Implementación y Operación del SIJE	Preparación de la Implementación SIJE	Desarrollar el tercer simulacro del SIJE	DEOE	19/05/2024
549	Conteos Rápidos Institucionales	Preparación del Conteo Rápido	Realizar el tercer simulacro del Conteo Rápido	DEOE	19/05/2024
562	Conteos Rápidos Institucionales	Preparación del Conteo Rápido	Seleccionar la Muestra para el Conteo Rápido	DEOE	30/05/2024
552	Monitoreo y Equidad en Materia de Radio y Televisión durante Proceso Electoral	Equidad en Materia de Radio y Televisión durante Proceso Electoral	Realizar pruebas del Sistema Certeza para monitoreo de Redes sociales	DEPPP	21/05/2024
550	Conformación del Padrón Electoral y Credencialización	Captación de Trámites	Recibir la información de registro de las PPP que entregaron los SPES que contiene el Sobre Voto.	DERFE	21/05/2024
551	Conformación del Padrón Electoral y Credencialización	Captación de Trámites	Recibir la información de registros de las PVA que entregaron el SPES que contiene el Sobre Voto.	DERFE	21/05/2024
557	Conformación del Padrón Electoral y Credencialización	Captación de Trámites	Generar, imprimir y entregar la LNEPP para escrutinio y cómputo.	DERFE	23/05/2024
559	Orientación, Atención y Servicios Registrales para la Ciudadanía y Actores Externos	Orientación y Atención Ciudadana	Iniciar el proceso final y validación del Sistema de Consulta en Casillas Especiales; colocar las medidas de protección en el equipo de cómputo e informar sobre la recepción de las contraseñas de acceso de cada casilla especial	DERFE	27/05/2024
546	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	Sistema de Voto Electrónico por Internet (SIVEI): Periodo de votación	UTSI	18/05/2024
548	Operación del PREP	Operación de Campo PREP	PREP Federal 2023-2024: Realizar Segundo Simulacro	UTSI	19/05/2024
553	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	App Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE): Liberar (Producción).	UTSI	26/05/2024
554	Operación del PREP	Operación de Campo PREP	PREP Federal 2023-2024: Realizar Tercer Simulacro	UTSI	26/05/2024

ID	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Fecha de Inicio
555	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	Sistema de Conteo Rápido: Liberar (Producción).	UTSI	27/05/2024
556	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	Sistema de Identificación para Voto Presencial en el Extranjero (SIVPE): Liberar (Producción).	UTSI	27/05/2024
561	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla: Verificar y validar los Componentes (Pruebas de aceptación).	UTSI	30/05/2024

Anexo 3. Relación de actividades por concluir en el PlyCPEF 2023-2024

ID	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Fecha de Término
45	Operación del esquema de atención e información para visitantes extranjeros	Difusión de la Convocatoria para la acreditación de visitantes extranjeros	Difundir la Convocatoria para visitantes extranjeros y el Formato de acreditación, junto con el Acuerdo del CG, entre audiencias potencialmente interesadas	CAI	22/05/2024
46	Operación del esquema de atención e información para visitantes extranjeros	Recepción y resolución de solicitudes de acreditación como visitante extranjero	Recibir las solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros	CAI	22/05/2024
48	Operación del esquema de atención e información para visitantes extranjeros	Recepción y resolución de solicitudes de acreditación como visitante extranjero	Dictaminar sobre las solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros	CAI	25/05/2024
82	Operación del esquema de atención e información para visitantes extranjeros	Recepción y resolución de solicitudes de acreditación como visitante extranjero	Notificar a los interesados la resolución a la solicitud de acreditación como visitante extranjero	CAI	26/05/2024
129	Operación del esquema de atención e información para visitantes extranjeros	Remisión del listado de visitantes extranjeros acreditados	Remitir a los OPLs, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de acreditados	CAI	31/05/2024
401	Creación y Seguimiento del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral	Seguimiento del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral	Presentar el Primer informe sobre el avance en las actividades del Fondo de Apoyo para la Observación Electoral 2024	CAI	31/05/2024
320	Atención a medios de comunicación	Realización del taller nacional de periodistas	Organizar talleres que faciliten la cobertura que realizan los medios de comunicación con respecto a las actividades que realiza el INE antes, durante y después de la Jornada Electoral, para contribuir a la conformación de una opinión pública informada y mejorar la comprensión de las y los representantes de los medios de comunicación	CNCS	20/05/2024
316	Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Diseño de la Estrategia de Integración de Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	Atender las solicitudes para nuevas convocatorias (DECEYEC)	DECEYEC	31/05/2024
519	Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero	Capacitación Electoral e Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo MEC	Capacitar al personal del INE que podrá realizar labores de suplencias en las MEC el día de la Jornada Electoral	DECEYEC	31/05/2024

ID	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Fecha de Término
262	Resguardo y distribución de la documentación y materiales electorales	Bodegas electorales en los órganos competentes del OPL	Informar las condiciones de las bodegas electorales en los Órganos Competentes de OPL	DEOE	31/05/2024
263	Resguardo y distribución de la documentación y materiales electorales	Bodegas electorales en los Órganos Desconcentrados del Instituto	Informar las condiciones de las bodegas electorales en los Órganos Desconcentrados del Instituto	DEOE	31/05/2024
502	Preparación y ejecución del cómputo de las Elecciones	Capacitación sobre documentos normativos en materia de cómputos	Coordinar e impartir cursos de capacitación y asesoría a los integrantes de las Juntas y Consejos Locales y Distritales del INE para el adecuado desarrollo de los cómputos distritales.	DEOE	20/05/2024
520	Planeación, aprobación y operación de los mecanismos de recolección de la Documentación Electoral al Término de la Jornada Electoral	Capacitación sobre los mecanismos de recolección	Dar seguimiento, en su caso, a la capacitación en materia de mecanismos de recolección a los funcionarios e integrantes de los órganos competentes de los OPL.	DEOE	24/05/2024
521	Planeación, aprobación y operación de los mecanismos de recolección de la Documentación Electoral al Término de la Jornada Electoral	Capacitación sobre los mecanismos de recolección a los SE y CAE federales	Dar seguimiento, a la capacitación en materia de mecanismos de recolección a los SE y CAE federales	DEOE	24/05/2024
532	Voto Anticipado en Territorio Nacional	Jornada de Votación Anticipada	Dar seguimiento a la Jornada de votación anticipada	DEOE	20/05/2024
539	Voto de las Personas en Prisión Preventiva	Jornada de Votación Anticipada	Dar seguimiento a la Jornada de votación anticipada al interior de los centros penitenciarios.	DEOE	20/05/2024
542	Gestión para la Ubicación, Equipamiento y Acondicionamiento de Casillas Electorales	Ubicación, Equipamiento y Acondicionamiento de Casillas	Dar seguimiento a la segunda publicación de las listas de ubicación e integración de las Mesas Directivas de Casilla, en los edificios y lugares públicos más concurridos del distrito.	DEOE	25/05/2024
547	Implementación y Operación del SIJE	Preparación de la Implementación SIJE	Desarrollar el tercer simulacro del SIJE	DEOE	19/05/2024
549	Conteos Rápidos Institucionales	Preparación del Conteo Rápido	Realizar el tercer simulacro del Conteo Rápido	DEOE	19/05/2024
562	Conteos Rápidos Institucionales	Preparación del Conteo Rápido	Seleccionar la Muestra para el Conteo Rápido	DEOE	31/05/2024

ID	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Fecha de Término
165	Administración de los Tiempos del Estado en Radio y Televisión en Periodo Ordinario	Asignación de los Tiempos en Materia Electoral en Radio y Televisión y Gestión de Transmisiones	Analizar mediante instrumentos de medición los materiales de audio y video entregados por los actores políticos y autoridades electorales, así como capturar el dictamen de control de calidad (óptimo o no óptimo), para que estos puedan ser radiodifundidos	DEPPP	31/05/2024
188	Administración de los Tiempos del Estado en Radio y Televisión en Periodo Ordinario	Asignación de los Tiempos en Materia Electoral en Radio y Televisión y Gestión de Transmisiones	Elaborar y enviar la lista de avisos de los materiales que ingresan en la orden de transmisión respectiva	DEPPP	31/05/2024
189	Administración de los Tiempos del Estado en Radio y Televisión en Periodo Ordinario	Asignación de los Tiempos en Materia Electoral en Radio y Televisión y Gestión de Transmisiones	Localizar instrucciones electrónicas de transmisión de promocionales y estrategias generadas por los actores políticos y autoridades electorales mediante el sistema electrónico	DEPPP	31/05/2024
191	Administración de los Tiempos del Estado en Radio y Televisión en Periodo Ordinario	Asignación de los Tiempos en Materia Electoral en Radio y Televisión y Gestión de Transmisiones	Obtener los archivos base, transformar a diversos formatos audiovisuales, así como transferir al sistema electrónico los promocionales de radio y televisión para que puedan ser puestos a disposición en los portales del Instituto	DEPPP	31/05/2024
202	Administración de los Tiempos del Estado en Radio y Televisión en Periodo Ordinario	Asignación de los Tiempos en Materia Electoral en Radio y Televisión y Gestión de Transmisiones	Clasificar el material traducido a idiomas diferentes al español en las entidades y etapas correspondientes en el sistema de electrónico.	DEPPP	31/05/2024
406	Administración de los Tiempos del Estado en Radio y Televisión en Periodo Ordinario	Asignación de los Tiempos en Materia Electoral en Radio y Televisión y Gestión de Transmisiones	Generar y cargar los testigos de grabación del monitoreo de noticieros para que la Institución de Educación Superior seleccionada aplique la metodología durante el periodo de campaña	DEPPP	31/05/2024
407	Administración de los Tiempos del Estado en Radio y Televisión en Periodo Ordinario	Asignación de los Tiempos en Materia Electoral en Radio y Televisión y Gestión de Transmisiones	Generar el reporte de monitoreo y testigos de grabación de la transmisión de debates, cuando así se solicite	DEPPP	29/05/2024
552	Monitoreo y Equidad en Materia de Radio y Televisión durante Proceso Electoral	Equidad en Materia de Radio y Televisión durante Proceso Electoral	Realizar pruebas del Sistema Certeza para monitoreo de Redes sociales	DEPPP	30/05/2024

ID	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Fecha de Término
360	Conformación del Padrón Electoral y Credencialización	Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar	Informar a la Comisión Nacional de Vigilancia sobre el número de Credenciales para Votar que serán generadas derivado de las solicitudes de reimpresión por razones de robo, extravío o deterioro grave.	DERFE	31/05/2024
396	Conformación del Padrón Electoral y Credencialización	Depuración y Reincorporación del Padrón Electoral	Cancelar y dar de baja las solicitudes de trámites realizados por los ciudadanos que no acudieron a recoger su Credencial para Votar con Fotografía a más tardar el último día de febrero del segundo año posterior a aquel en que la hayan presentado.	DERFE	31/05/2024
537	Conformación del Padrón Electoral y Credencialización	Emisión de Listas Nominales de Electores	Elaborar y entregar a los Consejos Locales la Lista Adicional.	DERFE	20/05/2024
538	Orientación, Atención y Servicios Registrales para la Ciudadanía y Actores Externos	Productos y Servicios Registrales a la Ciudadanía	Llevar a cabo la demostración sobre la operación del Sistema de Consulta en Casillas Especiales	DERFE	24/05/2024
550	Conformación del Padrón Electoral y Credencialización	Captación de Trámites	Recibir la información de registro de las PPP que entregaron los SPES que contiene el Sobre Voto.	DERFE	22/05/2024
551	Conformación del Padrón Electoral y Credencialización	Captación de Trámites	Recibir la información de registros de las PVA que entregaron el SPES que contiene el Sobre Voto.	DERFE	23/05/2024
557	Conformación del Padrón Electoral y Credencialización	Captación de Trámites	Generar, imprimir y entregar la LNEPP para escrutinio y cómputo.	DERFE	31/05/2024
559	Orientación, Atención y Servicios Registrales para la Ciudadanía y Actores Externos	Orientación y Atención Ciudadana	Iniciar el proceso final y validación del Sistema de Consulta en Casillas Especiales; colocar las medidas de protección en el equipo de cómputo e informar sobre la recepción de las contraseñas de acceso de cada casilla especial	DERFE	31/05/2024
116	Capacitación a Sujetos Obligados y Otros	Realización de Capacitación	Integrar el plan de capacitación para el proceso electoral 2023-2024 y proporcionar a los partidos políticos, aspirantes y candidaturas independientes la capacitación necesaria para el cumplimiento de las obligaciones consignadas (abarca todas las etapas del proceso electoral).	UTF	24/05/2024

ID	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Fecha de Término
548	Operación del PREP	Operación de Campo PREP	PREP Federal 2023-2024: Realizar Segundo Simulacro	UTSI	19/05/2024
553	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	App Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE): Liberar (Producción).	UTSI	26/05/2024
554	Operación del PREP	Operación de Campo PREP	PREP Federal 2023-2024: Realizar Tercer Simulacro	UTSI	26/05/2024
555	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	Sistema de Conteo Rápido: Liberar (Producción).	UTSI	27/05/2024
556	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	Sistema de Identificación para Voto Presencial en el Extranjero (SIVPE): Liberar (Producción).	UTSI	27/05/2024
561	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla: Verificar y validar los Componentes (Pruebas de aceptación).	UTSI	30/05/2024
518	Gestión del Portal Institucional	Administración del Portal Institucional	Implementar la página alterna para el Proceso Electoral Federal 2023-2024 a fin de difundir información para facilitar a la ciudadanía temas de interés y accesos directos a su contenido para la Jornada Electoral.	UTTyPDP	26/05/2024

Anexo 4. Relación de acuerdos aprobados, programados en el PlyCPEF 2023-2024

UR	Acuerdos	Fecha de aprobación	Núm. de Acuerdo	URL
DERFE	Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se declara que el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores que serán utilizados en las elecciones federales y locales del 2 de junio de 2024, son válidos y definitivos.	30/04/2023	INE/CG454/2024	https://repositoriodocumental.ine.mx/mlui/handle/123456789/169916
DECEYEC	<p>Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la designación de las personas servidoras públicas del Instituto Nacional Electoral que podrán realizar labores de suplencia en caso de ausencia, el día de la jornada electoral, de las personas funcionarias de las mesas de escrutinio y cómputo en las modalidades postal, postal única, y electrónica del voto de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero en los procesos electorales federal y locales 2023-2024, que se instalarán en el local único.</p> <p>Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la designación de las personas servidoras públicas del Instituto Nacional Electoral que podrán realizar labores de suplencia en caso de ausencia de las personas funcionarias de los módulos receptores de votación, así como a las personas que realizarán actividades de apoyo en el extranjero el día de la Jornada Electoral del voto de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero a instalarse en sedes consulares en los procesos electorales federal y locales 2023-2024.</p>	14/05/2024	<p>INE/JGE62/2024</p> <p>INE/JGE63/2024</p>	<p>https://inemexico-my.sharepoint.com/:b:/g/person/orlando_tacuba_ine_mx/EbYDhf-xthluPTbLIHQnzMBI4JdUvTCeldz-MVQMdbQCA?e=9yFbGH</p> <p>https://inemexico-my.sharepoint.com/:b:/g/person/orlando_tacuba_ine_mx/EQlvCUh_4TRDk2iYZIWcfp4BAcg3xV9nijuAPVqLy5fbUw?e=kYJbUY</p>
