



Plan y Calendario Integral
del Proceso Electoral Federal 2017-2018

Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral Federal 2017-2018

05 de septiembre de 2017

ÍNDICE

I.	Antecedentes.....	3
II.	Introducción	6
III.	Marco jurídico.....	8
IV.	Objetivo.....	11
V.	Metodología	12
VI.	Hitos del Proceso Electoral Federal.....	14
VII.	Seguimiento del Proceso Electoral Federal	18
VIII.	Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral Federal 2017-2018	19

I. Antecedentes

Los esfuerzos de planeación, monitoreo, seguimiento y evaluación de las actividades realizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) en la organización de los procesos electorales en México, dan muestra de la experiencia y aprendizaje adquiridos, y el continuo desarrollo e innovación de buenas prácticas en su interior. Éstas se han visto reflejadas en el desarrollo e implementación de calendarios y planes de trabajo que han permitido sistematizar en diversos procesos electorales las acciones a realizar durante las diversas etapas que conforman la elección federal.

La elaboración y presentación de planes de trabajo y calendarios de actividades responden al continuo compromiso institucional con la democracia en nuestro país, sustentándose en valores fundamentales como la difusión, la publicidad, la transparencia y rendición de cuentas hacia la ciudadanía.

Durante el Proceso Electoral Federal 1999-2000, en el Instituto Federal Electoral (IFE) se comenzaron a desarrollar calendarios con actividades relevantes. La evolución de esta práctica comenzó en el Proceso Electoral Federal 2002-2003, donde se avanzó en los esfuerzos de planificación institucional con la aprobación de un instrumento denominado Plan Integral del Proceso Electoral Federal (PIPEF) que fue concebido con la finalidad de contar con una guía institucional que permitiera ordenar y controlar el cumplimiento puntual de todas las responsabilidades inherentes al mandato legal de organizar las elecciones.

En el Proceso Electoral Federal de 2005-2006 se diseñó un calendario con actividades relevantes. La novedad de este documento fue que se establecieron metas de trabajo y la introducción de las herramientas necesarias para poder medir el grado de avance de cada una de las actividades que lo integraban.

En el Proceso subsecuente (2008-2009), el Consejo General aprobó el Calendario y el Plan Integral del Proceso Electoral Federal, integrando en un solo instrumento 402 actividades ordenadas cronológicamente, que señalaban: el órgano o área responsables de su desarrollo, el fundamento legal que les daba origen, las fechas de ejecución, la unidad de medida, los órganos o áreas que autorizaban su cumplimiento y la agrupación a partir de los programas, políticas, líneas de acción y actividades concretas que desarrollaron los órganos del Instituto.

En el contexto de la planeación de las elecciones federales celebradas en el año 2012, en el IFE se llevó a cabo una revisión completa a la composición del Plan Integral, que generó un rediseño a la estructura del documento. Éstas se orientaron a fortalecer la perspectiva de planeación, monitoreo, seguimiento y evaluación, a fin de disponer de una manera más eficiente la programación y la realización de las actividades referentes al proceso electoral, tomando como referencia la perspectiva sistémica ofrecida por el Sistema Integral de Planeación, Seguimiento y Evaluación Institucional (SIPSEI).

De esta manera, en primera instancia se aprobaron por separado los dos componentes principales, el Calendario y el Plan Integral del Proceso Electoral respectivamente. En el Calendario Integral se establecieron de manera puntual las actividades a desenvolverse durante el proceso electoral (derivadas de diversos ordenamientos legales aplicables) dispuestas cronológicamente; estableciendo en cada una de ellas el órgano o área responsable, fundamento legal, fechas de ejecución, unidad de medida y órganos o áreas que la autorizarían.

Por su parte, al Plan Integral se le concibió como el instrumento orientador del Proceso Electoral Federal, en el que se incorporó un mapa estratégico del propio proceso electoral, se definieron los procesos significativos en los que se agrupaban las actividades programadas por las diversas áreas en el calendario, y sus respectivos objetivos; proyectos e indicadores, a partir de los cuales se dio seguimiento al cumplimiento de los objetivos generales y las metas establecidas.

Esta reformulación del Plan Integral y la alineación del Calendario con sus directrices, permitió tener una visión integral y transversal del Proceso Electoral Federal, lo que favoreció su gestión y ejecución.

En el año 2014, con la transformación institucional que significó la creación del INE, fue preciso llevar a cabo una revisión exhaustiva de los instrumentos existentes para la planeación del Proceso Electoral Federal 2014-2015 en el nuevo esquema de coordinación y concurrencia electoral.

En este marco, y ante la urgencia de atender y encauzar las nuevas atribuciones conferidas al Instituto, se decidió concebir un instrumento único de planeación, monitoreo, seguimiento y evaluación que permitiera contar con una perspectiva integral del Proceso Electoral Federal y de las actividades que se desarrollarían de forma coordinada.

Es de esta manera como se establece el Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral Federal 2014-2015 (PyCIPEF) como el eje rector de la organización electoral, dando continuidad a las experiencias exitosas de planeación institucional. A la par el Instituto optimizó los mecanismos de seguimiento y evaluación a las actividades que comprendía con la incorporación de las herramientas ofrecidas por el enfoque de administración orientada a resultados.

Estos avances implementados posibilitaron la consulta de las especificidades reportadas en el desarrollo de todas y cada una de las actividades que integraron el PyCIPEF.

Es relevante mencionar que cuando concluyó el Proceso Electoral Federal 2014-2015, el seguimiento estructurado del Plan y Calendario Integral permitió realizar evaluaciones puntuales de las actividades que lo integraron, identificando áreas de oportunidad que fueron enunciadas en un informe final que, de manera general, plantearon la inclusión de mejoras específicas; la implementación de



acciones que ayuden a prevenir, atender y mitigar posibles contingencias; la alineación de actividades al presupuesto asignado a éstas, entre los más relevantes.

II. Introducción

A partir de la experiencia institucional, y en el marco de la preparación de los trabajos relativos al Proceso Electoral Federal 2017-2018, es indispensable la generación de una planeación integral que permita llevar a cabo, de manera puntual, periódica y oportuna, cada una de las actividades que implica, así como su debido monitoreo, seguimiento y evaluación.

El Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral Federal 2017-2018 (PyCIPEF) se presenta como un mecanismo de planeación, monitoreo, seguimiento y evaluación de las actividades que se desarrollan en el INE para la celebración de los comicios electorales federales, permitiendo al Consejo General y a la ciudadanía, conocer con oportunidad el nivel de avance que éstas registran durante las etapas que comprende el proceso electoral, además de ofrecer insumos para la toma de decisiones, la administración de los recursos en dichas tareas y la coordinación de los esfuerzos institucionales que se requieren para su cumplimiento.

En este marco, resulta pertinente destacar que el 1 de julio de 2018 se disputarán a nivel federal 629 cargos. En concreto:

Entidad	Cargos a elegir	Total
Federal	Presidente	1
	Senadores MR	64
	Senadores Primera Minoría	32
	Senadores RP	32
	Diputados MR	300
	Diputados RP	200
	Total de cargos a elegir	629

MR: mayoría relativa

RP: representación proporcional

La estructura del PyCIPEF enmarcado en el Plan Estratégico del Instituto Nacional Electoral 2016-2026, aprobado por el Consejo General el 21 de diciembre de 2016, mediante Acuerdo **INE/CG870/2016**, identifica a la organización de elecciones como el eje medular de la misión institucional. Bajo esta perspectiva y en concordancia con las políticas generales y los proyectos estratégicos contenidos, se integró un plan maestro que busca promover las sinergias e interrelaciones necesarias para que el ejercicio de la función electoral se articule directamente con el cumplimiento de los objetivos institucionales.

El Plan Integral especifica las etapas, responsabilidades, procesos, insumos y resultados esperados que permitirán al Instituto identificar, monitorear y medir su funcionamiento, para dirigir los esfuerzos institucionales y alcanzar los objetivos y el cumplimiento del marco legal vigente.

Como parte central de su estructura, este Plan integra el Calendario Electoral con las fechas y el detalle de la temporalidad de los procesos, subprocesos y actividades que deben realizarse durante las etapas del Proceso Electoral, mostrando de manera gráfica la temporalidad con la que se realizan, la sincronía entre éstas, sus interdependencias y la manera en que convergen hacia una misma meta: **garantizar el ejercicio del voto ciudadano.**

III. Marco jurídico

En la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIFE) se señala como una atribución del Instituto el desarrollar y aprobar el Plan y Calendario Integral de los Procesos Electorales Federales¹, bajo los siguientes señalamientos:

1. En primer término, coordinar con apoyo de la Unidad Técnica de Planeación (UTP) la preparación del proyecto de calendario integral de los procesos electorales ordinarios, así como de elecciones extraordinarias, será responsabilidad del Secretario Ejecutivo,
2. Una vez integrada, la propuesta será remitida a consideración de la Junta General Ejecutiva, la cual tiene la facultad de aprobar el calendario y el plan integral del proceso electoral federal y de los procesos federales electorales extraordinarios, para que por su conducto se pongan a consideración del Consejo General; y
3. Una vez aprobado por el Consejo General, se integrará en su seno una Comisión Temporal para dar seguimiento al Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral Federal.

Con la publicación del Reglamento de Elecciones, aprobado en el año 2016, se establecen con mayor detalle las características del diseño que deberá contener el Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral, así como el mecanismo que deberá emplearse para realizar el monitoreo y seguimiento pertinente.

De forma específica, se señala que en cada proceso electoral en el que intervenga el Instituto, deberá elaborarse un plan integral y calendario que deberá ser aprobado por el Consejo General, mismo que constituirá la herramienta de planeación, coordinación, ejecución, seguimiento y control, por medio de la cual se guiarán las actividades a desarrollar en el proceso electoral de que se trate.

Como punto de partida en el Reglamento se establece que, para el caso de los procesos electorales federales, tanto ordinarios como extraordinarios, el plan integral y calendario que se emita deberá cumplir con las siguientes características: el detalle de la temporalidad o fechas en las que deberán realizarse las actividades sustantivas del proceso electoral, por parte de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas del Instituto; fechas de corte del listado nominal, presupuesto asignado, así como todas aquellas definiciones que por la naturaleza del proceso electoral, deban fijarse desde su inicio, y; las demás

¹ Véanse los artículos Artículo 44, numeral 1, inciso ñ); 48, numeral 1, inciso ñ), y 51, numeral 1, inciso t) de la LGIFE. Adicionalmente, en el Reglamento Interior del INE se pueden consultar los artículos 5, numeral 1, inciso g); artículo 41, numeral 2, inciso q); artículo 69, numeral 1, inciso v); y, sobre el mismo tema, se complementa con lo señalado en el Reglamento de Elecciones en los artículos 69, 70, 71, 72, 76, 77, 78, 79 y 80.

precisiones necesarias para determinar de forma oportuna las acciones que deban desarrollarse por parte del Instituto.

Una vez aprobado el PyCIPEF, en el Reglamento de Elecciones se establece que deberá integrarse una comisión temporal² que implementará el seguimiento de los planes y calendarios integrales, con el apoyo de una herramienta informática que permita reportar los avances de cada una de las actividades desplegadas por parte de las áreas responsables.

En este ordenamiento, se señala que la metodología a implementarse para el seguimiento a los planes y calendarios de los procesos electorales deberá considerar por lo menos los siguientes elementos: un mecanismo para realizar el monitoreo y seguimiento mensual de actividades; un esquema de operación entre la comisión y todas las áreas responsables; que permita la generación de los reportes o informes que presentará la comisión, y un conjunto de estrategias para el adecuado control de las actividades.

Con la aprobación del Plan Estratégico Institucional, se establecen los ejes rectores que orientan la planeación institucional, así como las políticas generales y proyectos estratégicos en el Instituto, el cual contempla como objetivos estratégicos: el organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia, el fortalecer la confianza y la participación ciudadanas en la vida democrática y política del país, así como garantizar el derecho a la identidad.

Asimismo, establece dentro de sus políticas generales, la de **Organizar Procesos Electorales confiables y equitativos**, que reconoce en lo sustantivo:

"(...) el objetivo principal de la Reforma Constitucional en materia político-electoral del año 2014, fue homologar los estándares con los que se organizan los procesos electorales federales y locales, y así garantizar altos niveles de calidad en nuestra democracia. La meta del INE en este rubro es brindar certeza a ciudadanos, partidos políticos e instituciones electorales nacionales y locales, sobre los procedimientos y plazos de la organización electoral y con ello, dar cumplimiento al principio rector de la función electoral que le confirió la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En este contexto, la autoridad electoral nacional debe desplegar funciones más complejas por el aumento de sus atribuciones, la presencia de nuevos actores regulados y la existencia de diferentes competencias institucionales que deben articularse, por lo que es imperativo garantizar la equidad y la confianza durante el desarrollo de las actividades en cualquier proceso electoral, sea como institución rectora, o directamente responsable en su implementación, desde la planeación

² En el proceso electoral 2014-2015 se conformó por 3 Consejeros Electorales (un presidente y dos integrantes), un Secretario Técnico (Unidad Técnica de Planeación), un invitado permanente (titular de la Dirección del Secretariado). Así como, de consejeros del poder legislativo de los distintos grupos parlamentarios y los representantes de los partidos políticos. Véase: Acuerdo INE/CG190/2014.

de las principales etapas a seguir, hasta el nivel de las cuestiones técnicas y operativas o de carácter específico"

Los proyectos estratégicos que dan marco al diseño e implementación del PyCIPEF como el mecanismo de planeación, seguimiento, control y evaluación de las actividades que se desarrollan en el INE para organizar los procesos electorales federales.

Como se señala en el Plan Estratégico, con estos proyectos se reconoce lo siguiente:

"La organización de los procesos electorales como proceso sustantivo de la Institución, (que) implica un experimentado ciclo de planeación, ejecución y evaluación que garantice la legalidad y la equidad en la contienda electoral. Lo anterior asume un mayor grado de complejidad ante el ejercicio de la concurrencia operativa con los procesos electorales locales.

En este contexto, es necesario que los modelos de organización de los procesos electorales que el INE ha implementado anteriormente se dinamicen con la introducción de tecnología y un enfoque de planeación orientado a resultados, con la finalidad de potenciar la capacidad de respuesta institucional, incrementar los niveles de efectividad y ejercer la función electoral con resultados operativos que generen confianza entre los distintos actores políticos y la sociedad en su conjunto.


La evaluación de los resultados alcanzados permitirá la retroalimentación necesaria para promover los cambios pertinentes que mejoren la operación y permitan seguir garantizando la equidad y la credibilidad en la contienda (...)

El marco legal en el que la Institución se desarrolla, implica el establecimiento de medios de comunicación, coordinación y vinculación funcionales entre su estructura central y desconcentrada con los integrantes de los OPLE, con la finalidad de disponer adecuadamente las actividades que realizan en materia de organización de elecciones (...)"

IV. Objetivo

Cumplir las disposiciones legales y objetivos de la planeación estratégica institucional, a través de la integración e implementación de una herramienta de planeación, coordinación, ejecución, seguimiento y control, por medio de la cual se guiarán las actividades a desarrollar durante el proceso electoral por medio del PyCIPEF 2017-2018, bajo los principios de legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, certeza y máxima publicidad, así como de los criterios de eficiencia y eficacia operativa.

Ciclo del seguimiento al PyCIPEF 2017-2018

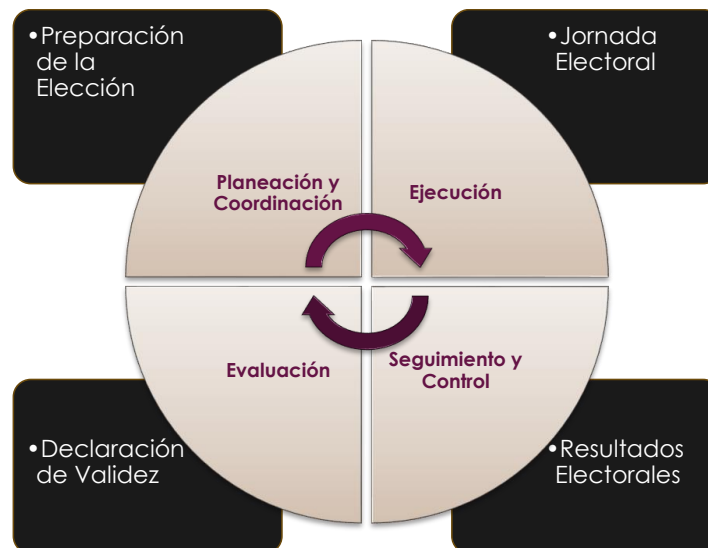

V. Metodología

El PyCIPEF 2017-2018 recupera el planteamiento implementado en el Proceso Electoral Federal 2014-2015, el cual se basó en un enfoque de planeación continua que reconoció el dinamismo implícito que permea la estructura de una herramienta de esta naturaleza.

De este modo, con el avance de cada una de las etapas del proceso electoral y los ajustes a los que haya lugar, se contempla la posibilidad de realizar las modificaciones necesarias a las actividades que se considere relevante. Esto bajo una serie de lineamientos claramente delimitados y establecidos que estarán sujetos a la autorización de los integrantes de la Comisión Temporal de Seguimiento.

Integración del Plan y Calendario

De manera general, la integración del PyCIPEF 2017-2018, parte de la presentación ordenada de las principales actividades que se involucran durante el proceso electoral federal en diversas categorías o *hitos* que representan los momentos más significativos de las distintas etapas del proceso electoral cuya definición tuvo como punto de partida una revisión puntual de la legislación en la materia. Del análisis del Reglamento de Elecciones, se construyó un listado de los principales hitos que apoyaron la conceptualización de una visión global del proceso electoral federal.

Esta sistematización tiene como objetivo alcanzar diferentes dimensiones de análisis. Específicamente, será posible observar los hitos y las actividades en cada una de las etapas que comprende un proceso electoral; también se podrá vislumbrar cuáles son las actividades particulares que se desarrollan en cada uno de los 37 hitos identificados. Asimismo, permitirá analizar otra variable que es la unidad responsable de ejecución.

Metodológicamente, en el proceso de creación de este Plan y Calendario, se analizaron y retomaron diversas cuestiones: se recuperaron las actividades que integraron el Plan y Calendario del Proceso Electoral Federal anterior, a efecto de favorecer la evaluación de los logros alcanzados por parte de los responsables de su ejecución, identificar los comportamientos históricos registrados que deberán reconsiderarse al planear nuevamente los plazos para el desarrollo de algunas actividades, así como la introducción de nuevas propuestas concebidas a partir de las experiencias de los procesos electorales locales que ocurrieron en el periodo que va de los años 2015 a 2017.

Esta información fue remitida a las unidades responsables, pidiéndoles validar, modificar, eliminar o incluir nuevas actividades en una matriz estandarizada, que después fue integrada en un primer borrador del Plan y Calendario Integral. En consecuencia, a partir de las revisiones efectuadas, se depuró la base de datos,

delimitando su contenido a fin de contener las actividades que se realizan en el Instituto de forma exclusiva en el marco de los procesos electorales.

En materia del manejo de contingencias, se pidió a los enlaces de cada unidad responsable identificar dentro de los periodos de realización de cada actividad del calendario una fecha crítica, a partir de la cual el incumplimiento o avance desfasado de éstas puede considerarse como una amenaza para su realización. Esta información, sumada a la parametrización automática que señalará el estatus de avance de cada actividad, permitirá identificar con mayor precisión el nivel de riesgo que pudiera presentarse, auxiliando así al análisis y construcción de posibles escenarios y por lo tanto, de una toma de decisiones oportuna correspondiente.

Para atender el seguimiento al ejercicio presupuestal que implica la organización de elecciones para el INE, se pidió a las unidades responsables que, una vez validada la información que integrará las actividades bajo su responsabilidad en el proceso electoral, identificaran el proyecto específico del que forman parte, con la finalidad de vincular la administración de la Cartera Institucional de Proyectos 2018 con el avance de las actividades del Proceso Electoral Federal.

Finalmente, se agregó una variable relacionada con la identificación de las actividades institucionales desarrolladas para el cumplimiento de las atribuciones de coordinación con los Organismos Públicos Electorales Locales durante los Procesos Electorales Locales, a efecto de distinguir con claridad el tramo de responsabilidad que corresponde a cada órgano electoral en el desarrollo de la actividad que corresponda.

Una vez integrada esta información, ésta se puso a consideración de los integrantes del Consejo General, con la finalidad de que pudiesen emitir observaciones sobre el contenido del mismo.

VI. Hitos del Proceso Electoral Federal

Para dar cuenta del Proceso Electoral Federal, el cuadro que se presenta a continuación muestra la identificación de los 37 hitos y sus conjuntos de actividades que como se mencionó en párrafos anteriores representan los momentos más significativos en cada una de las etapas a seguirse durante la organización de una elección:

Hito	Conjunto de Actividades
1. Planeación y Seguimiento de los Procesos Electorales	Integración, seguimiento y evaluación de los Procesos Electorales
2. Estrategia de Comunicación Social para el Proceso Electoral	Publicación de información en los portales del INE; acciones de posicionamiento de la Agenda de Información Estratégica; campañas de difusión institucional; monitoreo y evaluación de información en medios impresos
3. Marco Geográfico Electoral	Conformación, integración y actualización de la Cartografía Electoral
4. Padrón Electoral, Lista Nominal de Electores y Credencial para Votar	Verificación, diagnóstico y validez del Padrón Electoral; credencialización y actualización de la Lista Nominal; Atención Ciudadana; depuración del Padrón Electoral; acceso a información registral; emisión de Listados Nominales de Electores
5. Voto de los Mexicanos en el Extranjero	Documentación y materiales electorales para el Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero; integración y emisión de Listados Nominales de Electores Residentes en el Extranjero; estrategia de capacitación para la integración de mesas de escrutinio y cómputo del voto en el extranjero; recepción, clasificación y resguardo de Sobres-Voto; actividades posteriores al escrutinio y cómputo de los votos
6. Capacitación Electoral	Estrategia para la integración de Mesas Directivas de Casilla; diseño, producción y distribución de materiales en materia de capacitación electoral; Primera y Segunda Insaculación; estrategia para la contratación de personal que apoye la integración de las mesas receptoras de votación en elecciones Federales y/o Concurrentes
7. Documentación y Materiales Electorales	Diseños y producción de la documentación y los materiales electorales; conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; verificación de las medidas de seguridad de la documentación y los materiales electorales; supervisión del diseño, adjudicación y producción de la documentación y materiales electorales de los Organismos Públicos Locales
8. Instalaciones para el Resguardo de la Documentación y Materiales Electorales	Acondicionamiento y equipamiento de bodegas distritales y espacios de custodia; almacenamiento, resguardo y distribución de la documentación y los materiales electorales; custodia de la documentación electoral

Hito	Conjunto de Actividades
9. Observadores Electorales	Desarrollo del procedimiento de recepción de solicitudes, capacitación y aprobación de acreditaciones de observadores electorales
10. Visitantes Extranjeros	Desarrollo del programa de Atención a Visitantes Extranjeros
11. Fondo de Apoyo para la Observación Electoral	Coordinación de las tareas para la operación e integración del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral
12. Promoción del Voto y Participación Ciudadana	Actividades para la promoción y divulgación de la cultura cívica; actividades de formación y difusión dirigidas a la ciudadanía sobre la perspectiva de género y la no discriminación; coordinación con Organismos Públicos Locales Electorales para implementación de proyectos de educación cívica y participación ciudadana
13. Oficinas Municipales	Coordinación y seguimiento para la instalación y funcionamiento de Oficinas Municipales
14. Ubicación, Instalación y Funcionamiento de Casillas	Coordinación y seguimiento de la ubicación, aprobación, instalación y funcionamiento de casillas; equipamiento y acondicionamiento de casillas; publicación de encartes; integración del sistema de consulta de la ubicación de las casillas el día de la jornada electoral
15. Verificación para el Registro de Candidaturas	Verificación de requisitos de los aspirantes a ser registrados como candidatos
16. Registro de Candidaturas de Partidos Políticos y Coaliciones	Registro de plataformas; registro de candidatos; registro de coaliciones y acuerdos de participación
17. Registro de Candidaturas Independientes en el Ámbito Federal	Emisión de la convocatoria dirigida a las ciudadanas y los ciudadanos interesados en postularse para alguna candidatura independiente; recepción y verificación de las manifestaciones de intención presentadas por las personas interesadas en postularse para alguna candidatura independiente
18. Administración de los Tiempos que corresponden al Estado en Radio y Televisión en Materia Electoral	Elaboración de Catálogos de Medios y Mapas de Cobertura; elaboración de Pautas Específicas del período ordinario y procesos electorales federales, locales y extraordinarios; elaboración y puesta a disposición de órdenes de transmisión y materiales; monitoreo y verificación de pautas y transmisiones en radio y televisión; requerimientos relacionados con procedimientos sancionadores; atención de medidas cautelares
19. Monitoreo de Programas de Radio y Televisión que difunden Noticias	Monitoreo y verificación de pautas y transmisiones en radio y televisión sobre programas que difunden noticias; registro de testigos del monitoreo; publicación del informe de monitoreo de noticieros durante precampañas y campañas

Hito	Conjunto de Actividades
20. Debates	Organización de los debates presidenciales; monitoreo de debates organizados por terceros
21. Entrega de Financiamiento Público a los Partidos Políticos y Candidatos Independientes	Determinación de los montos de financiamiento público por actividades ordinarias, gastos de campaña y específicas que se otorgarán a los Partidos Políticos Nacionales; determinación del financiamiento público para gastos de campaña para el conjunto de candidaturas independientes; fijación de topes de gastos de precampaña y campaña
22. Fiscalización	Planeación de la fiscalización; auditoría de los Procesos Electorales Federales; resoluciones de Procedimientos Administrativos Sancionadores en Materia de Fiscalización
23. Material de Propaganda Electoral Impresa	Normas reglamentarias sobre la propaganda gubernamental; Propaganda electoral impresa
24. Sistema Integral de Quejas y Denuncias	Tramitación y sustanciación de Procedimientos Especiales Sancionadores y de Procedimientos Ordinarios Sancionadores
25. Encuestas por Muestreo, Sondeos de Opinión, Encuestas de Salida y Conteos Rápidos no Institucionales	Monitoreo de las encuestas electorales difundidas en los principales medios impresos nacionales y locales con motivo del Proceso Electoral Federal 2017-2018
26. Seguimiento a Órganos Desconcentrados	Integración y funcionamiento de las Juntas Locales y Distritales del INE; integración y funcionamiento de los Consejos Locales y Distritales; integración de los órganos de dirección superior de los Organismos Públicos Locales Electorales
27. Registro de Representantes de Partidos Políticos y Candidatos Independientes	Registro de Representantes de los partidos políticos nacionales ante los diversos Consejos del Instituto; registro y acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes generales y ante mesas directivas de casilla
28. Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE)	Definición de procedimientos y metas del SIJE; simulacros de Operación; seguimiento a la Jornada Electoral
29. Asistencia Electoral	Coordinación de las actividades de Asistencia Electoral
30. Conteos Rápidos Institucionales	Trabajos del Comité Técnico de Conteo Rápido (COTECORA), simulacros del Conteo Rápido; operativo de campo del Conteo Rápido
31. Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP)	Trabajos del Comité Técnico Asesor para el Programa de Resultados Electorales (COTAPREP); pruebas y simulacros del Sistema PREP; implementación del PREP

Hito	Conjunto de Actividades
32. Mecanismos de Recolección de la Documentación Electoral al Término de la Jornada Electoral	Estudios de factibilidad de Mecanismos de Recolección, aprobación, operación y seguimiento de los mecanismos de recolección
33. Recepción de Paquetes Electorales al Término de la Jornada Electoral	Desarrollo, pruebas y simulacros del aplicativo para la recepción de paquetes electorales; operación del aplicativo durante la recepción de los paquetes electorales
34. Cómputos de Elecciones Federales	Diseño, aprobación y capacitación de los órganos desconcentrados sobre la aplicación de los criterios normativos en materia de cómputos; coordinación y seguimiento a la celebración de las sesiones de cómputos
35. Mecanismo de Aplicación de la Fórmula de Asignación por el Principio de Representación Proporcional	Aprobación de acuerdos para determinar el mecanismo para la aplicación de la fórmula de asignación de Diputados y Senadores por el principio de Representación Proporcional que correspondan a los Partidos Políticos con base en los resultados que obtengan en la Jornada Electoral; acuerdos por los que se efectúa el cómputo total y se declara la validez de las elecciones de Senadores y Diputados por el Principio de Representación Proporcional y se asignan a los Partidos Políticos los curules que por este principio les corresponde de acuerdo con la votación obtenida por cada uno de ellos en el Proceso Electoral Federal
36. Estadística Electoral	Diseño, desarrollo y presentación del Sistema de Consulta de la Estadística Electoral del INE
37. Actividades de Soporte al Proceso Electoral Federal	Gestión administrativa en materia de recursos humanos, financieros y materiales necesarios para el desarrollo del Proceso Electoral Federal; Asistencia jurídica; Colaboraciones interinstitucionales; Servicio Profesional Electoral Nacional

VII. Seguimiento del Proceso Electoral Federal

La estructura del PyCIPEF está diseñada para generar reportes mediante el uso de una plataforma informática que permitirá la colaboración de las unidades responsables del Instituto (atendiendo a los cortes de actualización que determine la Comisión Temporal de Seguimiento), permitiendo conocer de manera eficiente toda información relacionada con el avance de las actividades del Proceso Electoral Federal 2017-2018.

Una vez concluido el periodo de registro de la información actualizada, se realizarán análisis mixtos, donde se considerarán criterios cuantitativos y cualitativos que permitan identificar los niveles de avance, las actividades que registran desfases así como sus puntos críticos.

Esta información será presentada al Consejo General de forma mensual, mediante los reportes de avance del PyCIPEF que presente la Comisión Temporal de Seguimiento al Proceso Electoral Federal 2017-2018.

VIII. Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral Federal 2017-2018

A continuación, se presenta el Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral Federal 2017-2018 el cual está conformado por **37 hitos, 80 procesos, 174 subprocesos y 710 actividades**. Cabe destacar que en atención a las recomendaciones relacionadas con "Incorporar un nuevo apartado de seguimiento al PyCIPEF el cual incluya actividades desplegadas antes del inicio del Proceso Electoral Federal" y "Relacionar procesos, subprocesos y actividades del Proceso Electoral Federal con los costos asociados a la ejecución de cada uno de estos" contenidas en el Informe Final de la Comisión para el Seguimiento del Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral Federal 2014-2015 (presentación ante Consejo General el 16 de diciembre de 2015), el PyCIPEF 2017-2018 distingue mediante el uso de un asterisco (*) 26 actividades que concluyen con antelación al inicio del Proceso Electoral, pero cuya conceptualización, ejecución y seguimiento son clave en el marco de las actividades preparatorias del Instituto con la finalidad de garantizar su oportuna ejecución.

Por otra parte, el PyCIPEF 2017-2018 presenta 684 actividades a desarrollar en el marco del Proceso Electoral Federal. Adicionalmente, el Plan y Calendario referido permite distinguir 616 actividades cuya ejecución se asocia a uno de los proyectos específicos contenidos en la Planeación Táctica 2018 (aprobada en la sesión de la Junta General Ejecutiva celebrada el 24 de agosto de 2017).

Glosario


Acronimos	Concepto
CAE	Capacitador Asistente Electoral
CAI	Coordinación de Asuntos Internacionales
CATD	Centros de Acopio y Transmisión de Datos
CCV	Centros de Captura y Verificación
CD	Consejo Distrital
CFE	Comisión Federal de Electricidad
CG	Consejo General
CL	Consejo Local
CNCS	Coordinación Nacional de Comunicación Social
COTAPREP	Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares
COTECORA	Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos
CRT	Comité de Radio y Televisión.
CTPE	Comité Técnico del Padrón Electoral
DEA	Dirección Ejecutiva de Administración
DECEYEC	Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
DJ	Dirección Jurídica
DEOE	Dirección Ejecutiva de Organización Electoral
DEPPP	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos
DERFE	Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores
DESPEN	Dirección Ejecutiva de Servicio Profesional Electoral Nacional
DS	Dirección del Secretariado
FEPADE	Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales
IFT	Instituto Federal de Telecomunicaciones
IMEC	Instituto de la Mujer en el Estado de Campeche
INE	Instituto Nacional Electoral
JGE	Junta General Ejecutiva
OC	Oficinas Centrales
OPL	Organismo Público Local

PEF	Proceso Electoral Federal
PEL	Proceso Electoral Local
PREP	Programa de Resultados Electorales Preliminares
PYCIPEF	Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral Federal
SE	Supervisor Electoral
SEDENA	Secretaría de la Defensa Nacional
SEMAR	Secretaría de Marina Armada de México
SICCE	Sistema de Consultas de Casillas Especiales
SICOPAC	Sistema de Contratación, Pago y Comprobación de Recursos
SIILNERE	Solicitud Individual de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero
SUJE	Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral
TEPJF	Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
UNICOM	Unidad Técnica de Servicios de Informática
UTCE	Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral
UTIGYND	Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación
UTF	Unidad Técnica de Fiscalización
UTP	Unidad Técnica de Planeación
UTVOPL	Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales
VMRE	Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero
VNM	Verificación Nacional Muestral

Calendario del Proceso Electoral Federal 2017-2018		2017												2018											
Hito	UR	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	FECHA CRÍTICA	PROYECTO ESPECÍFICO	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP		
1. Planeación y Seguimiento de los Procesos Electorales		01/04/2017	31/12/2018																						
1.1 Elaboración y Seguimiento del Calendario y Plan Integral de los Procesos Electorales Locales																									
1.1.1 Elaboración del Calendario y Plan Integral de los Procesos Electorales Locales																									
1.1.1.1 Elaborar los Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales	UTVOP/L	01/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	Continuación con los OPL																				
1.1.2 Seguimiento del Calendario y Plan Integral de los Procesos Electorales Locales																									
1.1.2.1 Elaborar e implementar un plan de trabajo conjunto (NE-OPL) para la promoción de la participación ciudadana	UTVOP/L	01/09/2017	01/07/2018	01/07/2018	Continuación con los OPL																				
1.2 Planeación Estratégica Institucional																									
1.2.1 Conformación del Plan y Calendario Integral de los Procesos Electorales Federales																									
1.2.1.1 Elaborar y coordinar la integración del Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral Federal 2017-2018 *	UTP	01/04/2017	31/08/2017	31/08/2017	Seguimiento P/C/PEF 2018																				
1.2.1.2 Elaborar y someter a consideración del CG el Proyecto de Acuerdo por el que se dispone la aprobación y seguimiento del Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral Federal 2017-2018	UTP	01/09/2017	30/09/2017	30/09/2017	Seguimiento P/C/PEF 2018																				
1.2.1.3 Llevar a cabo el seguimiento del grado de avance de cada uno de los procedimientos señalados, identificando cronogramas, días y Calendario Integral del Proceso Electoral Federal 2017-2018, e informar de sus avances al órgano colegiado que corresponda	UTP	01/09/2017	31/12/2018	31/12/2018	Seguimiento P/C/PEF 2018																				
1.3 Vinculación con los OPL																									
1.3.1 Instrumentos de coordinación con los OPL																									
1.3.1.1 Elaborar los convenios de colaboración entre el INE y los OPL, para delimitar las atribuciones de cada uno de ellos durante el Proceso Electoral *	UTVOP/L	01/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	Continuación con los OPL																				
1.4 Monitoreo y evaluación																									
1.4.1 Dar seguimiento a la implementación del Plan y Calendario Integral en los Procesos Electorales Federales																									
1.4.1.1 Avaliar a la UTP con el seguimiento del Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral Federal 2017-2018	DS	01/09/2017	31/12/2018	31/12/2018	Atención de Actividades del Proceso Electoral Federal 2017-2018																				
2. Estrategia de Comunicación Social para el Proceso Electoral																									
2.1 Diseño y operación de las campañas de difusión institucional																									
2.1.1 Desarrollar las estrategias de difusión para la campaña institucional y subcampañas (casa productora y agencia)	DECE/EC	01/08/2017	31/07/2018	01/07/2017	Difusión de la participación ciudadana en los Procesos Electorales																				
2.1.1.1 Producir y difundir los materiales de las campañas de difusión institucional	DECE/EC	01/08/2017	31/07/2018	01/07/2017	Difusión de la participación ciudadana en los Procesos Electorales																				
2.2 Agenda informativa estratégica																									

Calendario del Proceso Electoral Federal 2017-2018		2017												2018											
		ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP						
Hito Proceso Subproceso Actividad	UR	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	FECHA CRÍTICA	PROYECTO																				
	2.2.1 Acciones de posicionamiento																								
	2.2.1.1 Evaluar con diagnósticos y mediciones externas la efectividad de la estrategia de comunicación social. Apoyo para la gestión con medios de comunicación así como líderes de opinión y fortalecer la estrategia en periodo de elección tanto en temas coyunturales como parte de las funciones sustantivas del área	CNC	01/08/2017	21/12/2018	01/02/2018	Diagnóstico y medición de acciones de comunicación																			
	2.2.1.2 Dar a conocer a ciudadanos y ciudadanas del país, a partir de los 18 años, la información estratégica del INE, mediante el Proceso Electoral Federal, mediante el posicionamiento de las campañas institucionales en medios de comunicación impresos y alternativos	CNC	01/09/2017	30/09/2018	15/01/2018	Promoción de actividades estratégicas del PEF y PEL 2017-2018																			
	2.2.1.3 Difundir de manera interna información sobre las actividades y tareas que se realizan los colaboradores del Instituto a fin de fortalecer el espíritu de cuerpo y sentido de pertenencia	CNC	01/01/2018	31/12/2018	15/01/2018	Infografía Comunicación Organizacional																			
	2.2.1.4 Llevar a cabo la cederatura y transmisión de la Jornada Electoral en las plataformas de internet y difusión de señal a medios de comunicación instalados en el INE	CNC	01/07/2018	01/07/2018	01/07/2017	Seguimiento y desarrollo de la Jornada Electoral del Proceso Electoral Federal 2017-2018																			
	2.2.2 Monitoreo																								
	2.2.2.1 Realizar el monitoreo integral de los indicadores en Radio y Televisión, los principales medios y revistas de circulación nacional, así como los principales portales informativos en Internet nacionales e internacionales	CNC	01/09/2017	30/09/2018	01/01/2018	Seguimiento Informativo en prensa, radio, tv y portales web para el Proceso Electoral Federal 2017-2018																			
	2.3 Diseño de imagen gráfica e información																								
	2.3.1 Elaboración de estrategias de información																								
2.3.1.1 Elaborar e instrumentar una Estrategia de Información para dar a conocer a la ciudadanía los resultados del Proceso de Redistribución 2017, sobre todo en las localidades y distritos electorales federales que tuvieron alguna afectación en los límites y/o nomenclatura distrital, así como en la creación o fusión de distritos	DERE	01/09/2017	31/12/2017	31/12/2017	No aplica																				
2.3.2 Elaboración de materiales gráficos																									
2.3.2.1 Elaborar los diseños de los materiales gráficos contemplados en la Estrategia de Información para dar a conocer a la ciudadanía los resultados del Proceso de Redistribución 2017 sobre todo en las localidades y distritos electorales federales que tuvieron alguna afectación en los límites y/o nomenclatura distrital, así como en la creación o fusión de distritos	DERE	01/09/2017	31/12/2017	31/12/2017	No aplica																				
2.3.2.2 Elaborar e instrumentar una Estrategia de Información en apoyo al Proceso Electoral Federal 2017 - 2018, en complemento a la Campaña de Difusión Institucional, para mejorar la actualización del Padrón Electoral, enfatizando los hechos a limitar para cada proceso y la posibilidad de inscripción de jóvenes que cumplen la mayoría de edad incluso el día de la Jornada Electoral 2018	DERE	01/09/2017	31/01/2018	31/01/2018	Campaña Anual Infancia 2018																				
2.3.2.3 Elaborar los diseños de los materiales gráficos contemplados en la Estrategia de Información en apoyo al Proceso Electoral Federal 2017 - 2018, en complemento a la Campaña de Difusión Institucional, para mejorar la actualización del Padrón Electoral, enfatizando los hechos a limitar para cada proceso y la posibilidad de inscripción de jóvenes que cumplen la mayoría de edad incluso el día de la Jornada Electoral 2018	DERE	01/09/2017	16/04/2018	16/04/2018	Campaña Anual Infancia 2018																				
2.4 Monitoreo y evaluación																									
2.4.1 Monitoreo																									
2.4.1.1 Monitorear la estrategia de comunicación social del Proceso Electoral Federal 2017-2018 en redes sociales	CNC	01/09/2017	31/08/2018	26/04/2018	Estrategia de comunicación digital para el PEF 2018																				
2.4.2 Retroalimentación																									



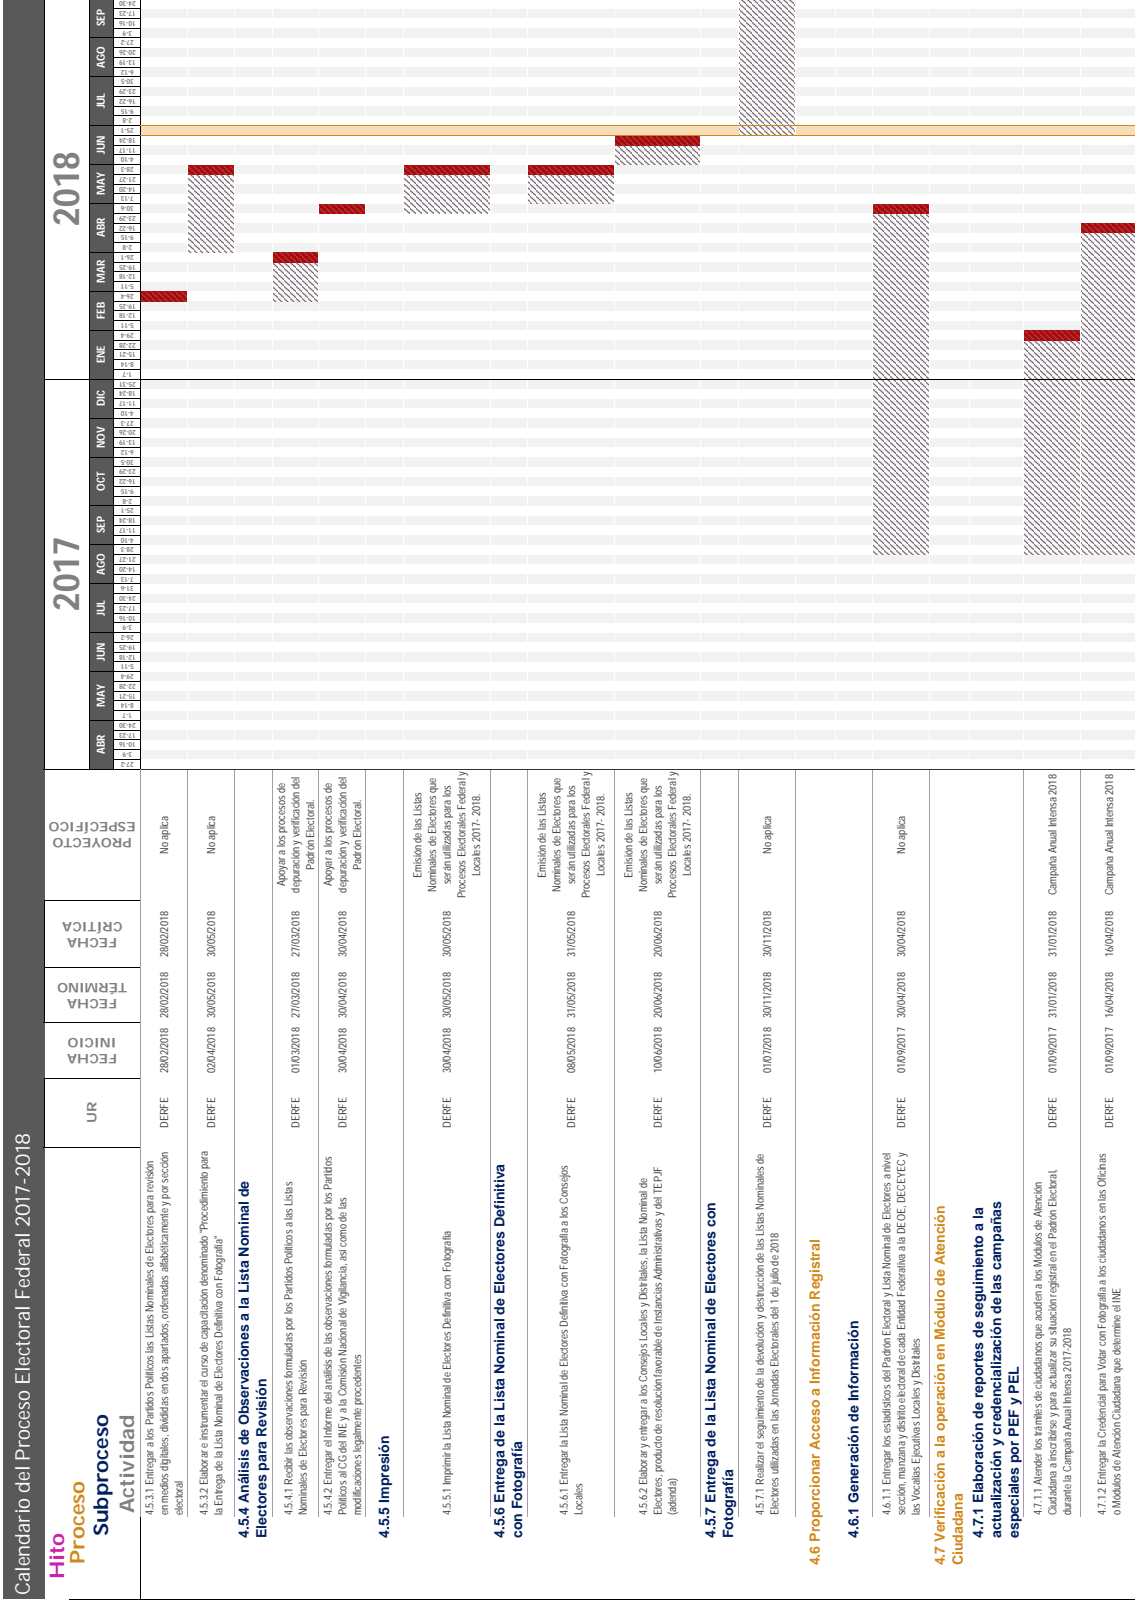

Calendario del Proceso Electoral Federal 2017-2018

Hito
Proceso
Subproceso
Actividad

UR	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	FECHA CRÍTICA	PROYECTO ESPECÍFICO
----	--------------	---------------	---------------	---------------------

5.6 VMRE

5.6.1 Actividades posteriores al escrutinio y cómputo de los votos

5.6.1.1 Integrar y remitir a la Sala Superior del TEPJF el paquete electoral que contenga las boletas electorales, los originales de las actas de escrutinio y cómputo de los votos, y el informe circunstanciado elaborado por la AGE, respecto de la votación emitida en el extranjero para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos	DECE	01/07/2018	07/07/2018	06/07/2018	Voto de los mexicanos en el extranjero
5.6.1.2 Integrar y remitir a los Saltes Registrales del TEPJF los paquetes electorales con los boletas electorales, los originales de las actas de escrutinio y cómputo de los votos, y el informe circunstanciado elaborado por la AGE, respecto de la votación emitida en el extranjero para la elección de Senadores	DECE	01/07/2018	07/07/2018	06/07/2018	Voto de los mexicanos en el extranjero
5.6.1.3 Remite a los Comités Locales de la Corte de Cuenta de Entidad Federativa que contenga el estado de la votación emitida en el extranjero para la elección de Senadores, previo al inicio de los cómputos de Entidad Federativa	DECE	01/07/2018	07/07/2018	06/07/2018	Voto de los mexicanos en el extranjero

5.6.2 Escrutinio y cómputo de los votos en el Local Único

5.6.2.1 Realizar la gestión para disponer de un local único para el escrutinio y cómputo de los votos emitidos por los mexicanos residentes en el extranjero	DECE	01/07/2018	30/04/2018	29/04/2018	Voto de los mexicanos en el extranjero
5.6.2.2 Realizar el escrutinio y cómputo de los votos emitidos por los mexicanos residentes en el extranjero	DECE	01/07/2018	02/07/2018	01/07/2018	Voto de los mexicanos en el extranjero

5.6.3 Recepción, clasificación y resguardo de Sobres-Voto

5.6.3.1 Llevar a cabo la recepción, clasificación y resguardo de los sobres que contienen los votos emitidos por los mexicanos residentes en el extranjero	DECE	22/05/2018	01/07/2018	30/06/2018	Voto de los mexicanos en el extranjero
--	------	------------	------------	------------	--

5.7 Sistema de Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

5.7.1 Desarrollo y entrega de TIC

5.7.1.1 Analizar, diseñar y desarrollar el sistema SUIHERE	UNICOM	08/07/2018	25/05/2018	25/05/2018	No aplica
5.7.1.2 Liberar el sistema SUIHERE para pruebas y simulacros	UNICOM	15/02/2018	27/05/2018	27/05/2018	No aplica


5.7.2 Soporte a la operación


5.7.2.1 Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del sistema SUIHERE	UNICOM	28/05/2018	22/06/2018	22/06/2018	No aplica
5.7.2.2 Dar soporte a la operación del sistema SUIHERE	UNICOM	01/07/2018	01/07/2018	01/07/2018	No aplica

5.8 Cancelación de trámite

5.8.1 Aplicar bajas del Padrón Electoral por cancelación de trámite


5.8.1.1 Cancelar y dar de baja los solicitudes de trámites realizados por los ciudadanos o mexicanos en el extranjero para votar en el extranjero antes de la última día de febrero del segundo año posterior al aquel en que se hayan presentado	DERFE	02/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	Apojar a los procesos de depuración y actualización del Padrón Electoral.
---	-------	------------	------------	------------	---

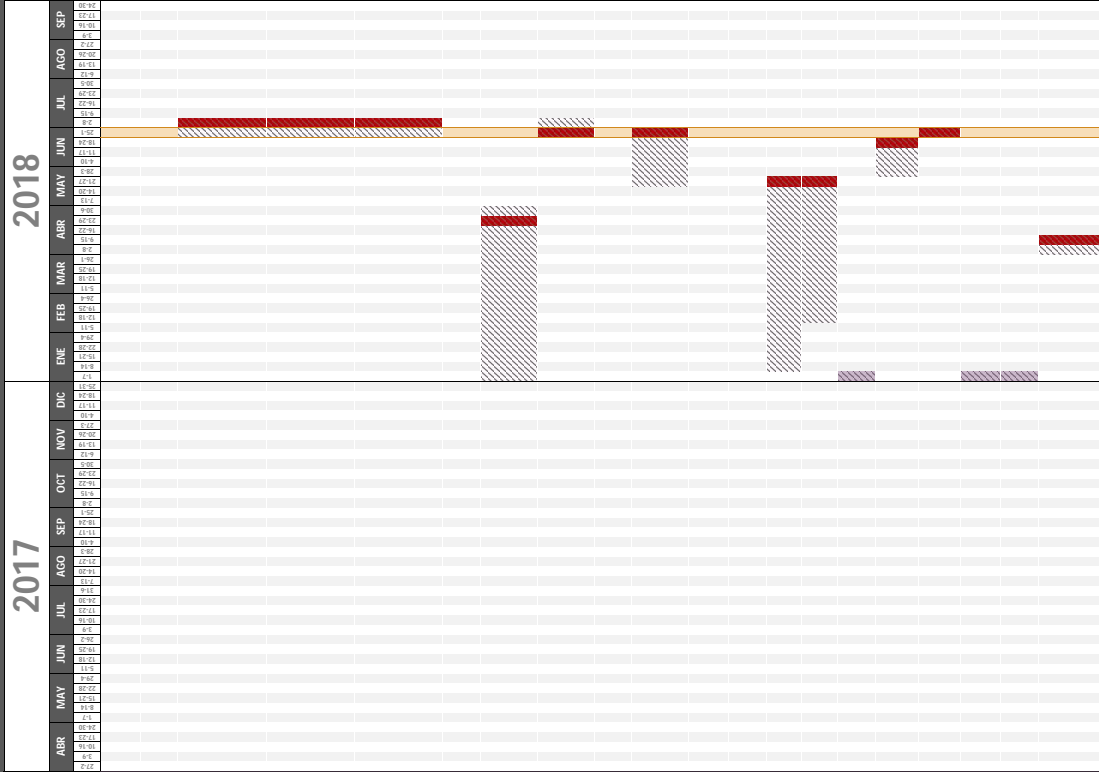

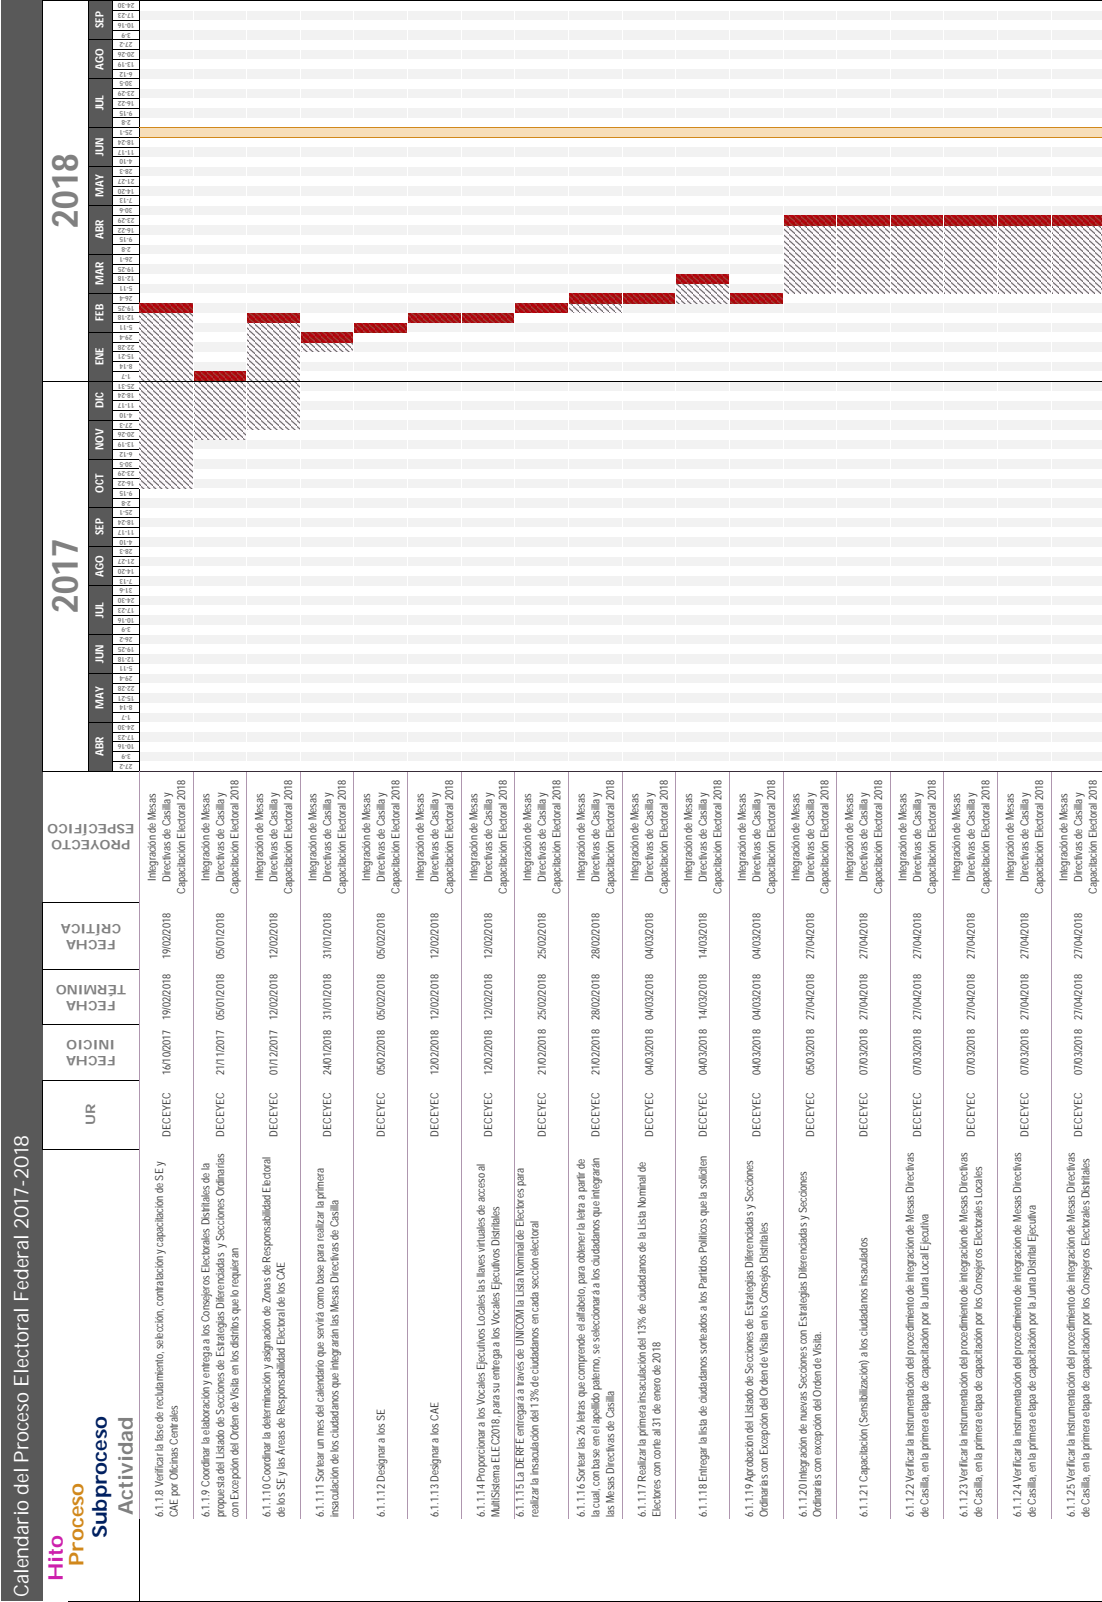

Calendario del Proceso Electoral Federal 2017-2018					2017												2018											
Hito Proceso Subproceso Actividad	UR	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	FECHA CRÍTICA	PROYECTO ESPECÍFICO	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP					
6.1.1.26 Verificar la instrumentación del procedimiento de integración de Mesas Directivas de Castilla, en la primera etapa de capacitación por Órganos Centrales	DECEYEC	07/03/2018	27/04/2018	27/04/2018	Integración de Mesas Directivas de Castilla y Capacitación Electoral 2018																							
6.1.1.27 Integrar la lista de ciudadanos que fueron capacitados y cumplir con los requisitos legales para desempeñarse como funcionarios de Mesas Directivas de Castilla	DECEYEC	28/04/2018	01/05/2018	01/05/2018	Integración de Mesas Directivas de Castilla y Capacitación Electoral 2018																							
6.1.1.28 Elaborar el Informe sobre el desarrollo de la primera etapa de capacitación electoral que se presenta a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral	DECEYEC	01/05/2018	30/06/2018	30/06/2018	Integración de Mesas Directivas de Castilla y Capacitación Electoral 2018																							
6.1.1.29 Realizar la segunda inspección y designación de funcionarios de Mesas Directivas de Castilla	DECEYEC	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	Integración de Mesas Directivas de Castilla y Capacitación Electoral 2018																							
6.1.1.30 Entrega de nombramientos y capacitación de la ciudadanía designada para integrar las Mesas Directivas de Castilla	DECEYEC	09/05/2018	30/06/2018	30/06/2018	Integración de Mesas Directivas de Castilla y Capacitación Electoral 2018																							
6.1.1.31 Realizar las sustituciones de integrantes de Mesas Directivas de Castilla	DECEYEC	09/05/2018	30/06/2018	30/06/2018	Integración de Mesas Directivas de Castilla y Capacitación Electoral 2018																							
6.1.1.32 Supervisar la sustitución de funcionarios de Mesas Directivas de Castilla	DECEYEC	09/05/2018	30/06/2018	30/06/2018	Integración de Mesas Directivas de Castilla y Capacitación Electoral 2018																							
6.1.1.33 Verificar la instrumentación del procedimiento de integración de Mesas Directivas de Castilla, en la segunda etapa de capacitación por la Junta Local Ejecutiva	DECEYEC	09/05/2018	30/06/2018	30/06/2018	Integración de Mesas Directivas de Castilla y Capacitación Electoral 2018																							
6.1.1.34 Verificar la instrumentación del procedimiento de integración de Mesas Directivas de Castilla, en la segunda etapa de capacitación por los Consejeros Electorales Locales	DECEYEC	09/05/2018	30/06/2018	30/06/2018	Integración de Mesas Directivas de Castilla y Capacitación Electoral 2018																							
6.1.1.35 Verificar la instrumentación del procedimiento de integración de Mesas Directivas de Castilla, en la segunda etapa de capacitación por la Junta Distrital Ejecutiva	DECEYEC	09/05/2018	30/06/2018	30/06/2018	Integración de Mesas Directivas de Castilla y Capacitación Electoral 2018																							
6.1.1.36 Verificar la instrumentación del procedimiento de integración de Mesas Directivas de Castilla, en la segunda etapa de capacitación por los Consejeros Electorales Distritales	DECEYEC	09/05/2018	30/06/2018	30/06/2018	Integración de Mesas Directivas de Castilla y Capacitación Electoral 2018																							
6.1.1.37 Verificar la instrumentación del procedimiento de integración de Mesas Directivas de Castilla, en la segunda etapa de capacitación por Órganos Centrales	DECEYEC	09/05/2018	30/06/2018	30/06/2018	Integración de Mesas Directivas de Castilla y Capacitación Electoral 2018																							
6.1.1.38 Realizar la primera publicación de las listas de integrantes de Mesas Directivas de Castilla	DECEYEC	10/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	Integración de Mesas Directivas de Castilla y Capacitación Electoral 2018																							
6.1.1.39 Realizar la segunda publicación de las listas de integrantes de Mesas Directivas de Castilla	DECEYEC	15/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	Integración de Mesas Directivas de Castilla y Capacitación Electoral 2018																							
6.1.1.40 Realizar, en su caso, la tercera publicación de las listas de integrantes de Mesas Directivas de Castilla (Bó de la Jornada Electoral)	DECEYEC	01/07/2018	01/07/2018	01/07/2018	Integración de Mesas Directivas de Castilla y Capacitación Electoral 2018																							
6.1.1.41 Elaborar el Informe sobre el desarrollo de la segunda etapa de capacitación electoral que se presenta a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral	DECEYEC	15/07/2018	31/08/2018	31/08/2018	Integración de Mesas Directivas de Castilla y Capacitación Electoral 2018																							
6.1.1.42 Realizar reuniones regionales de evaluación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral del Proceso Electoral 2017-2018 en materia de integración de Mesas Directivas de Castilla y capacitación electoral	DECEYEC	01/10/2018	30/11/2018	30/11/2018	Integración de Mesas Directivas de Castilla y Capacitación Electoral 2018																							

6.1.2 Diseñar, seguir y evaluar la estrategia para la contratación de personal que apoye la integración de las Mesas Receptoras de Votación en Elecciones Locales, Federales y/o Concurrentes

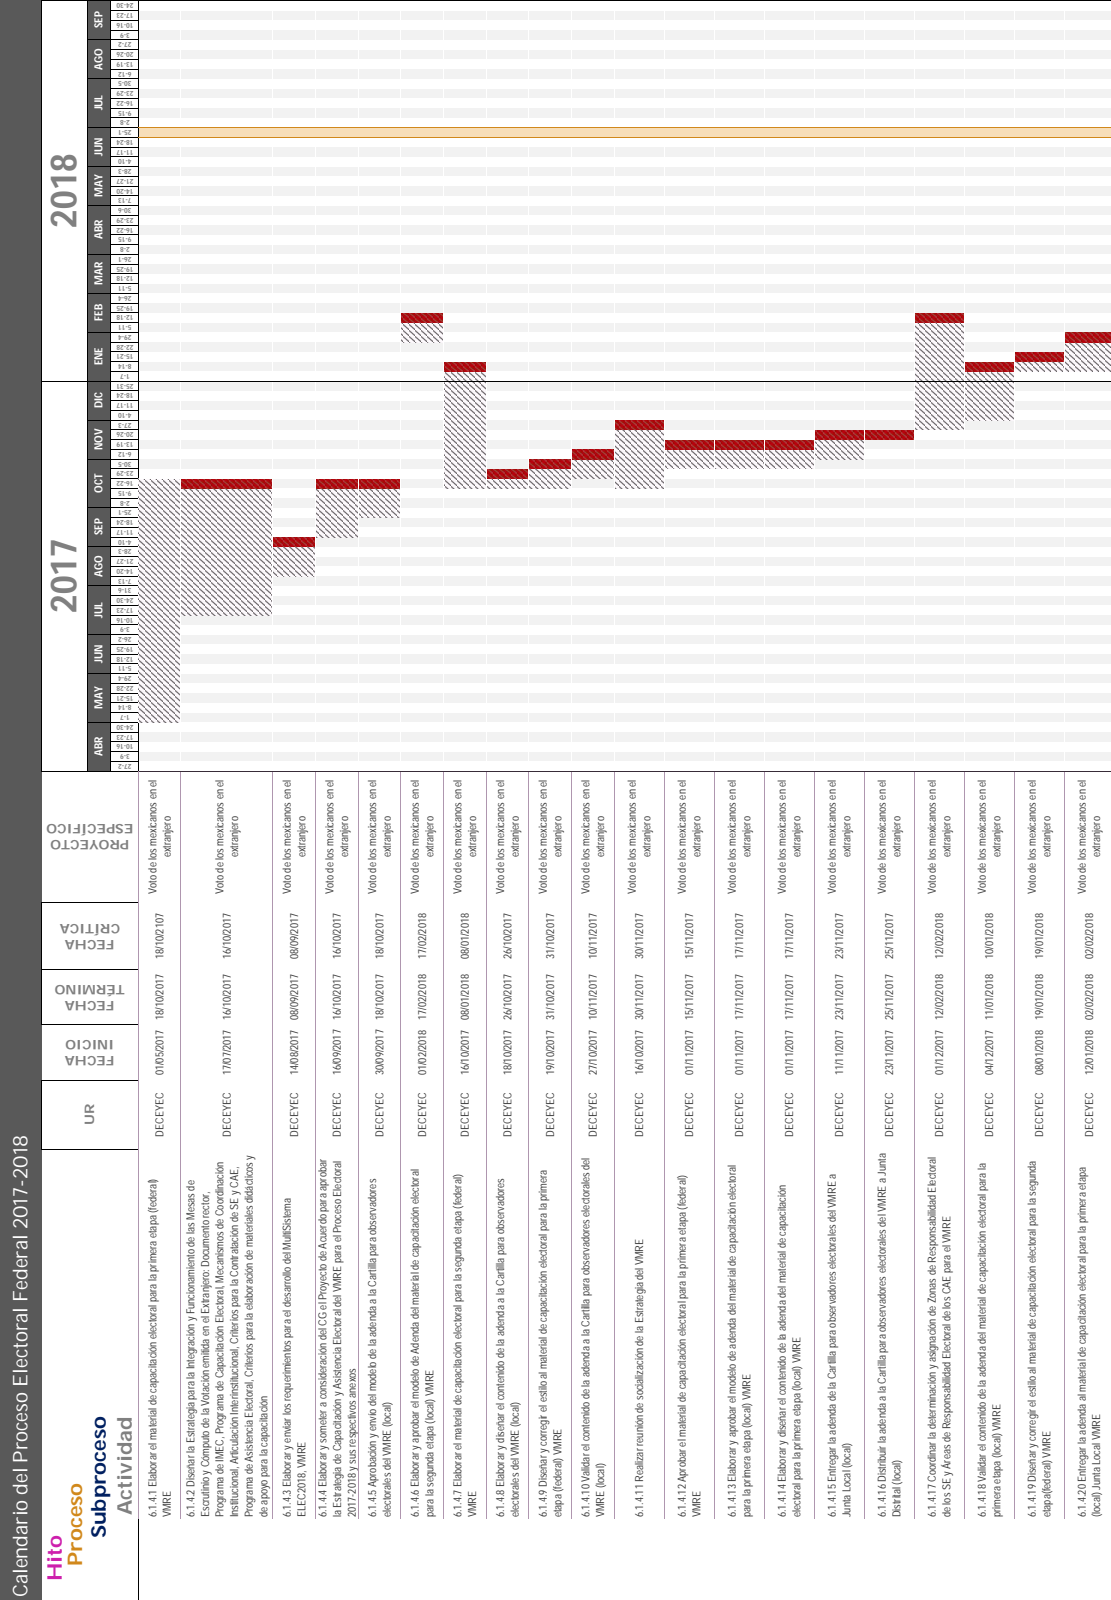


Calendario del Proceso Electoral Federal 2017-2018


Hito	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	FECHA CRÍTICA	ESPECÍFICO
6.1.1	Elaborar el material de capacitación electoral para la primera etapa (federal)	VMRE		DECEYEC	01/05/2017	18/10/2017	18/10/2017	Voto de los mexicanos en el extranjero
6.1.2	Diseñar la Estrategia para la Integración y Funcionamiento de las Mesas de Escrutinio y Cómputo de la Votación emitida en el Extranjero; Documento rector, Programa de IMEC, Programa de Capacitación Electoral, Mecanismos de Coordinación Institucional, Aplicación Informativa, Criterios para la Contratación de SE y CAE, Programa de Asistencia Electoral, Criterios para la elaboración de materiales didácticos y de apoyo para la capacitación			DECEYEC	17/01/2017	16/10/2017	16/10/2017	Voto de los mexicanos en el extranjero
6.1.3	Elaborar y enviar los requerimientos para el desarrollo del MultiSistema ELEC2018. VMRE			DECEYEC	14/08/2017	08/09/2017	08/09/2017	Voto de los mexicanos en el extranjero
6.1.4	Elaborar y someter a consideración del CG el Proyecto de Acuerdo para aprobar la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral del VMRE para el Proceso Electoral 2017-2018 y sus respectivos anexos			DECEYEC	16/09/2017	16/10/2017	16/10/2017	Voto de los mexicanos en el extranjero
6.1.5	Aprobación y envío del modelo de la Cartilla para observadores electorales del VMRE (local)			DECEYEC	30/09/2017	18/10/2017	18/10/2017	Voto de los mexicanos en el extranjero
6.1.6	Elaborar y aprobar el modelo de Agenda del material de capacitación electoral para la segunda etapa (local) VMRE			DECEYEC	01/02/2018	17/02/2018	17/02/2018	Voto de los mexicanos en el extranjero
6.1.7	Elaborar el material de capacitación electoral para la segunda etapa (federal) VMRE			DECEYEC	16/10/2017	08/01/2018	08/01/2018	Voto de los mexicanos en el extranjero
6.1.8	Elaborar y dictar el contenido de la agenda a la Cartilla para observadores electorales del VMRE (local)			DECEYEC	18/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	Voto de los mexicanos en el extranjero
6.1.9	Diseñar y corregir el estilo al material de capacitación electoral para la primera etapa (federal) VMRE			DECEYEC	19/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	Voto de los mexicanos en el extranjero
6.1.10	Validar el contenido de la agenda a la Cartilla para observadores electorales del VMRE (local)			DECEYEC	27/10/2017	10/11/2017	10/11/2017	Voto de los mexicanos en el extranjero
6.1.11	Realizar reunión de socialización de la Estrategia del VMRE			DECEYEC	16/10/2017	30/11/2017	30/11/2017	Voto de los mexicanos en el extranjero
6.1.12	Aprobar el material de capacitación electoral para la primera etapa (federal) VMRE			DECEYEC	01/11/2017	15/11/2017	15/11/2017	Voto de los mexicanos en el extranjero
6.1.13	Elaborar y aprobar el modelo de agenda del material de capacitación electoral para la primera etapa (local) VMRE			DECEYEC	01/11/2017	17/11/2017	17/11/2017	Voto de los mexicanos en el extranjero
6.1.14	Elaborar y diseñar el contenido de la agenda del material de capacitación electoral para la primera etapa (local) VMRE			DECEYEC	01/11/2017	17/11/2017	17/11/2017	Voto de los mexicanos en el extranjero
6.1.15	Entregar la agenda de la Cartilla para observadores electorales del VMRE a Junta Local (local)			DECEYEC	11/11/2017	23/11/2017	23/11/2017	Voto de los mexicanos en el extranjero
6.1.16	Distribuir la agenda a la Cartilla para observadores electorales del VMRE a Junta Distrital (local)			DECEYEC	23/11/2017	25/11/2017	25/11/2017	Voto de los mexicanos en el extranjero
6.1.17	Coordinar la determinación y asignación de Zonas de Responsabilidad Electoral de los SE y Áreas de Responsabilidad Electoral de los CAE para el VMRE			DECEYEC	01/12/2017	12/02/2018	12/02/2018	Voto de los mexicanos en el extranjero
6.1.18	Validar el contenido de la agenda del material de capacitación electoral para la primera etapa (local) VMRE			DECEYEC	04/12/2017	11/01/2018	10/01/2018	Voto de los mexicanos en el extranjero
6.1.19	Diseñar y corregir el estilo al material de capacitación electoral para la segunda etapa (federal) VMRE			DECEYEC	08/01/2018	19/01/2018	19/01/2018	Voto de los mexicanos en el extranjero
6.1.20	Entregar la agenda al material de capacitación electoral para la primera etapa (local) Junta Local VMRE			DECEYEC	12/01/2018	02/02/2018	02/02/2018	Voto de los mexicanos en el extranjero


Calendario del Proceso Electoral Federal 2017-2018


Hito
Proceso
Subproceso
Actividad

UR	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	FECHA CRÍTICA	PROYECTO ESPECÍFICO
DECEYEC	07/03/2018	27/04/2018	27/04/2018	Voto de los mexicanos en el extranjero
DECEYEC	07/03/2018	27/04/2018	27/04/2018	Voto de los mexicanos en el extranjero
DECEYEC	07/03/2018	27/04/2018	27/04/2018	Voto de los mexicanos en el extranjero
DECEYEC	07/03/2018	27/04/2018	27/04/2018	Voto de los mexicanos en el extranjero
DECEYEC	23/03/2018	23/04/2018	23/04/2018	Voto de los mexicanos en el extranjero
DECEYEC	30/03/2018	16/04/2018	16/04/2018	Voto de los mexicanos en el extranjero
DECEYEC	31/03/2018	16/04/2018	16/04/2018	Voto de los mexicanos en el extranjero
DECEYEC	16/04/2018	23/04/2018	23/04/2018	Voto de los mexicanos en el extranjero
DECEYEC	16/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	Voto de los mexicanos en el extranjero
DECEYEC	16/04/2018	03/05/2018	03/05/2018	Voto de los mexicanos en el extranjero
DECEYEC	28/04/2018	01/05/2018	01/05/2018	Voto de los mexicanos en el extranjero
DECEYEC	01/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	Voto de los mexicanos en el extranjero
DECEYEC	01/05/2018	30/06/2018	30/06/2018	Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral 2018
DECEYEC	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	Voto de los mexicanos en el extranjero
DECEYEC	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	Voto de los mexicanos en el extranjero
DECEYEC	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	Voto de los mexicanos en el extranjero
DECEYEC	09/05/2018	30/06/2018	30/06/2018	Voto de los mexicanos en el extranjero
DECEYEC	09/05/2018	30/06/2018	30/06/2018	Voto de los mexicanos en el extranjero
DECEYEC	09/05/2018	30/06/2018	30/06/2018	Voto de los mexicanos en el extranjero

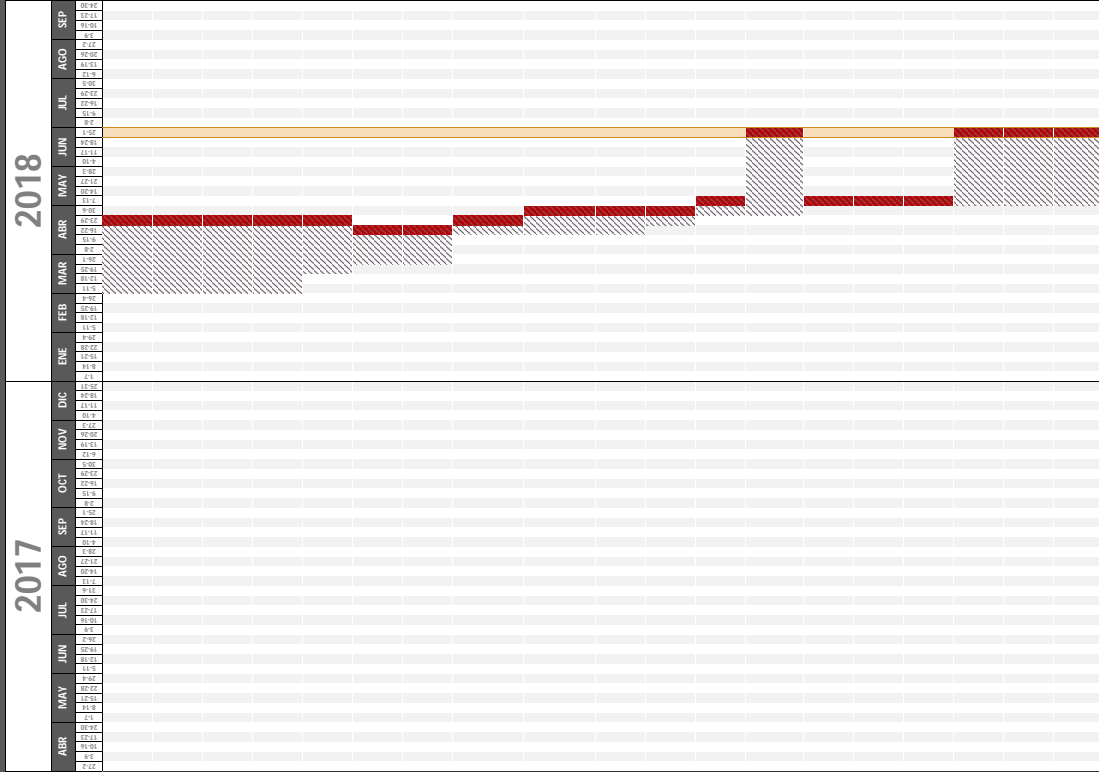

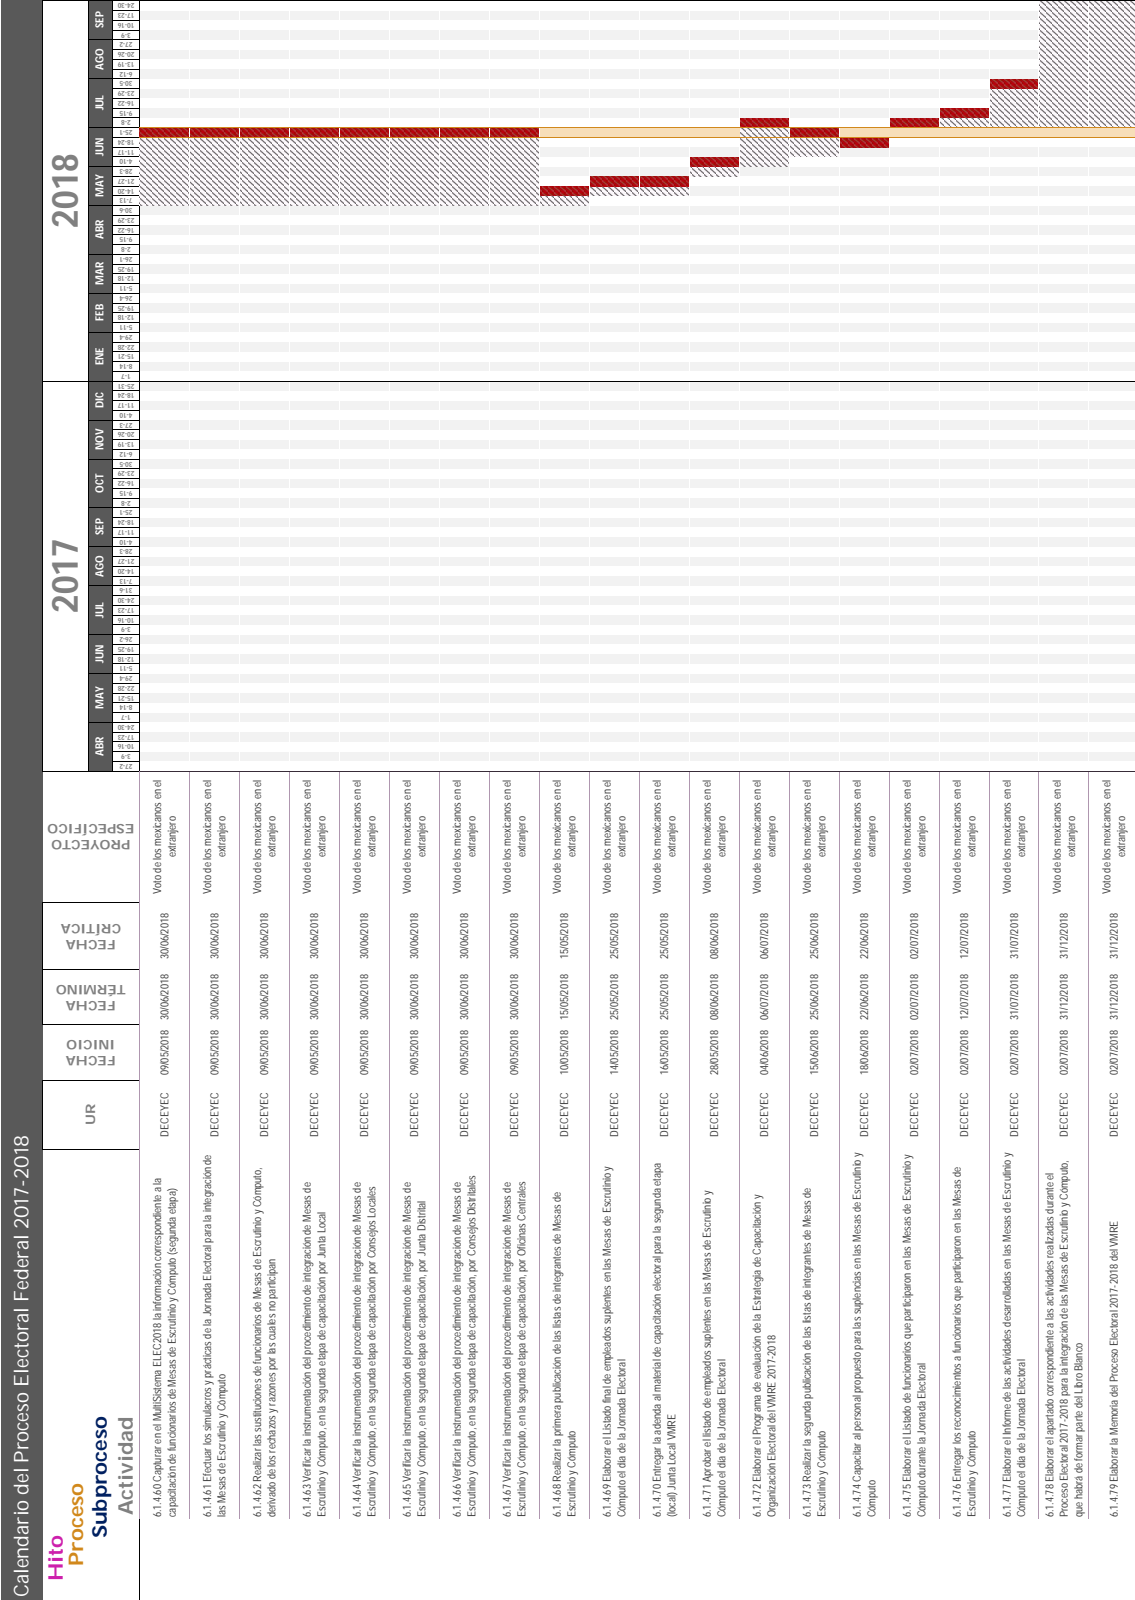

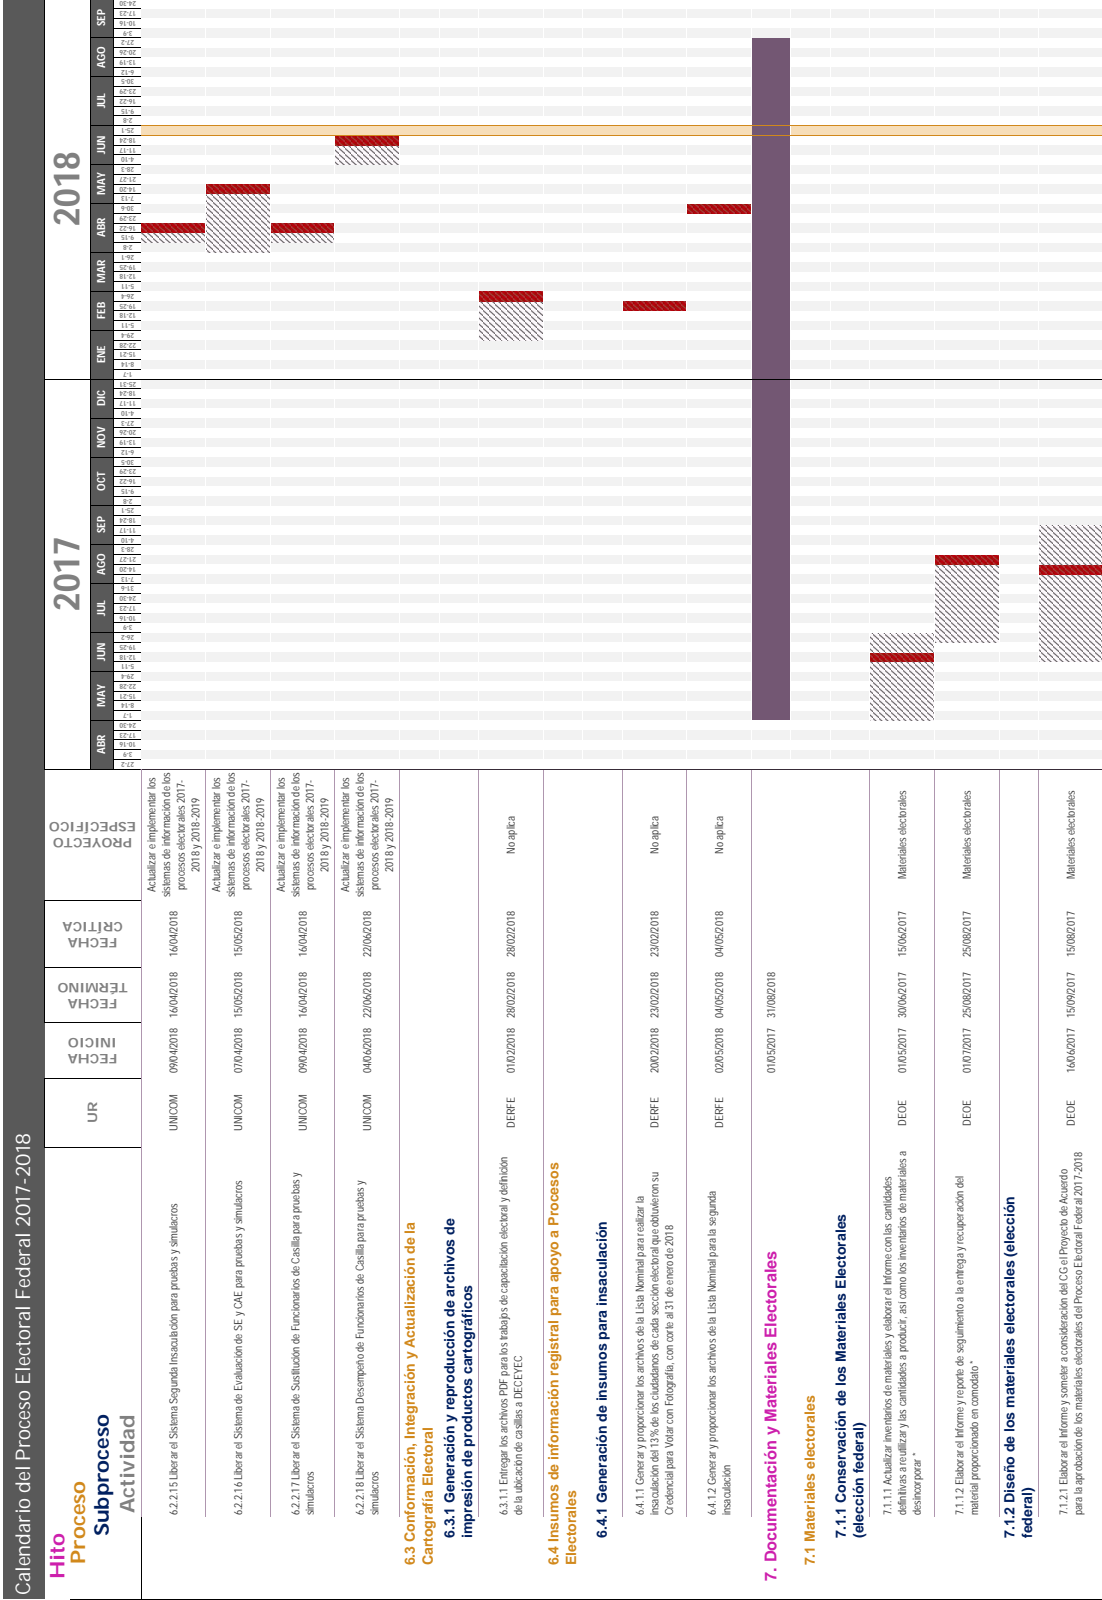

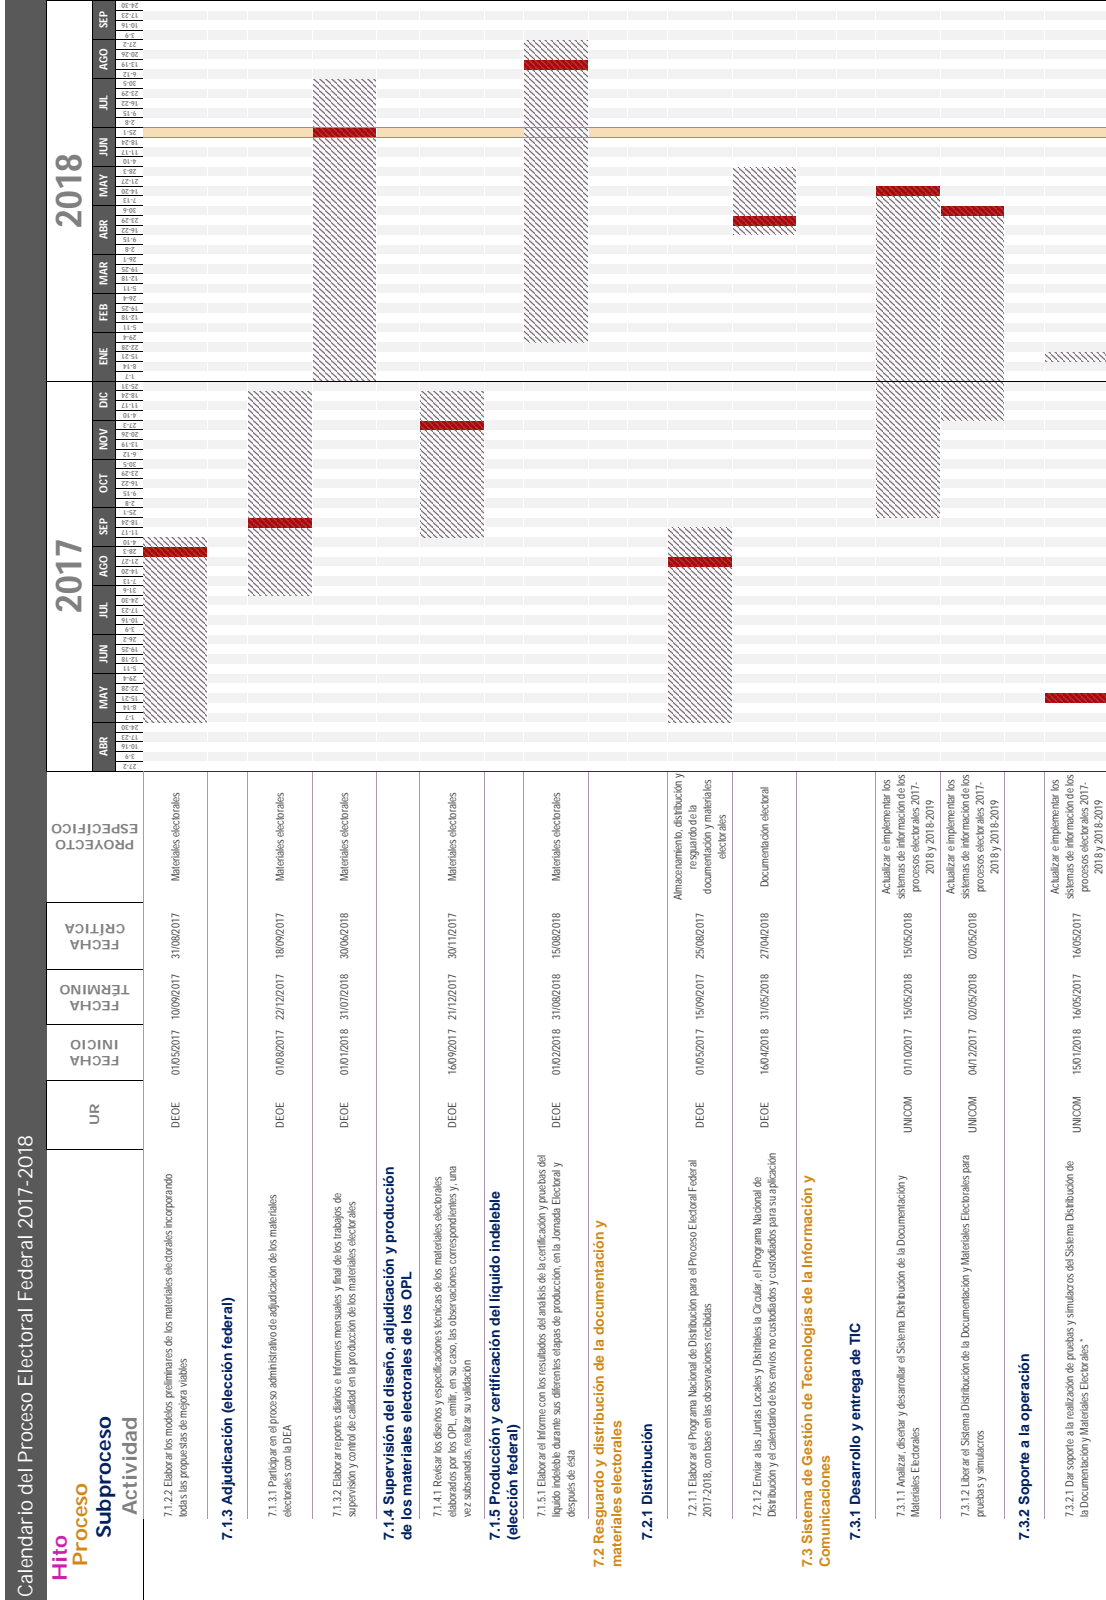


Calendario del Proceso Electoral Federal 2017-2018

Hito
Proceso
Subproceso
Actividad

UR	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	FECHA CRÍTICA	PROYECTO ESPECÍFICO
DECE	01/05/2017	10/09/2017	31/08/2017	Materiales electorales
7.1.3 Adjudicación (elección federal)				
DECE	01/08/2017	27/12/2017	18/09/2017	Materiales electorales
DECE	01/01/2018	31/07/2018	30/06/2018	Materiales electorales
7.1.4 Supervisión del diseño, adjudicación y producción de los materiales electorales de los OPL				
DECE	16/09/2017	21/12/2017	30/11/2017	Materiales electorales
7.1.5 Producción y certificación del líquido indeleble (elección federal)				
DECE	01/02/2018	31/08/2018	15/08/2018	Materiales electorales
7.2 Resguardo y distribución de la documentación y materiales electorales				
7.2.1 Distribución				
DECE	01/05/2017	15/09/2017	25/08/2017	Almacenamiento, distribución y resguardo de la documentación y materiales electorales
DECE	16/04/2018	31/05/2018	27/04/2018	Documentación electoral
7.3 Sistema de Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones				
7.3.1 Desarrollo y entrega de TIC				
UNICOM	01/10/2017	15/05/2018	15/05/2018	Actualizar e implementar los sistemas de información de los procesos electorales 2017-2018 y 2018-2019
UNICOM	04/11/2017	02/05/2018	02/05/2018	Actualizar e implementar los sistemas de información de los procesos electorales 2017-2018 y 2018-2019
7.3.2 Soporte a la operación				
UNICOM	15/01/2018	16/05/2017	16/05/2017	Actualizar e implementar los sistemas de información de los procesos electorales 2017-2018 y 2018-2019

Calendario del Proceso Electoral Federal 2017-2018		2017												2018											
		ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP						
Hito Proceso Subproceso Actividad	UR	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	FECHA CRÍTICA	PROYECTO ESPECÍFICO																				
	UNICOM	22/01/2018	31/07/2018	22/01/2018	Actualizar e implementar los sistemas de información de los procesos electorales 2017-2018 y 2018-2019																				
7.4 Documentación electoral																									
7.4.1 Diseño de la documentación electoral federal																									
	DECE	16/06/2017	15/09/2017	15/08/2017	Documentación electoral																				
7.4.1.1 Elaborar el Informe y someter a consideración del CG el Proyecto de Acuerdo para la aprobación de la documentación electoral del Proceso Electoral Federal 2017-2018																									
	DECE	01/05/2017	10/09/2017	31/08/2017	Documentación electoral																				
7.4.1.2 Elaborar los modelos y las especificaciones técnicas de la documentación electoral para la elección federal y, en su caso, la consulta popular, con base en la prueba piloto y las modificaciones a la legislación en materia electoral, así como elaborar el Informe correspondiente																									
7.4.2 Adjudicación																									
	DECE	01/08/2017	15/09/2017	31/08/2017	Documentación electoral																				
7.4.2.1 Elaborar el programa de producción de la documentación electoral de la elección federal y, en su caso, la consulta popular																									
	DECE	01/08/2017	31/10/2017	15/10/2017	Documentación electoral																				
7.4.2.2 Coordinar en el procedimiento de adjudicación de la producción de la documentación electoral de la elección federal y, en su caso, la consulta popular																									
7.4.3 Supervisión del diseño, adjudicación y producción de la documentación electoral de los OPL																									
	DECE	15/08/2017	21/12/2017	30/11/2017	Documentación electoral																				
7.4.3.1 Revisar los diseños y especificaciones técnicas de los documentos electorales elaborados por los OPL y emitir, en su caso, las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, realizar su validación																									
	DECE	01/11/2017	21/12/2017	30/11/2017	Documentación electoral																				
7.4.3.2 Revisión del primer Informe, emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación																									
	DECE	01/02/2018	30/06/2018	15/04/2018	Documentación electoral																				
7.4.3.3 Verificar la supervisión del OPL a la producción de los documentos y materiales electorales																									
	DECE	21/02/2018	30/06/2018	30/04/2018	Documentación electoral																				
7.4.3.4 Revisar el segundo Informe y emitir, en su caso, las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, realizar su validación																									
7.4.4 Supervisión de la producción																									
	DECE	01/10/2017	30/06/2018	15/05/2018	Documentación electoral																				
7.4.4.1 Dar seguimiento a la producción de la documentación sin emblemas de la elección de Presidente, Senadores y Diputados Federales, y en su caso la consulta popular, conforme a las especificaciones técnicas																									
	DECE	28/02/2018	30/06/2018	15/05/2018	Documentación electoral																				
7.4.4.2 Dar seguimiento a la producción de la documentación electoral con emblemas de la elección de Presidente, Senadores y Diputados Federales, y en su caso la consulta popular, conforme a las especificaciones técnicas																									
	DECE	01/03/2018	15/06/2018	15/04/2018	Documentación electoral																				
7.4.4.3 Dar seguimiento a la producción de los boletines electorales de las elecciones de Presidente, Senadores y Diputados Federales, y en su caso papeletas para la consulta popular, conforme a las especificaciones técnicas																									

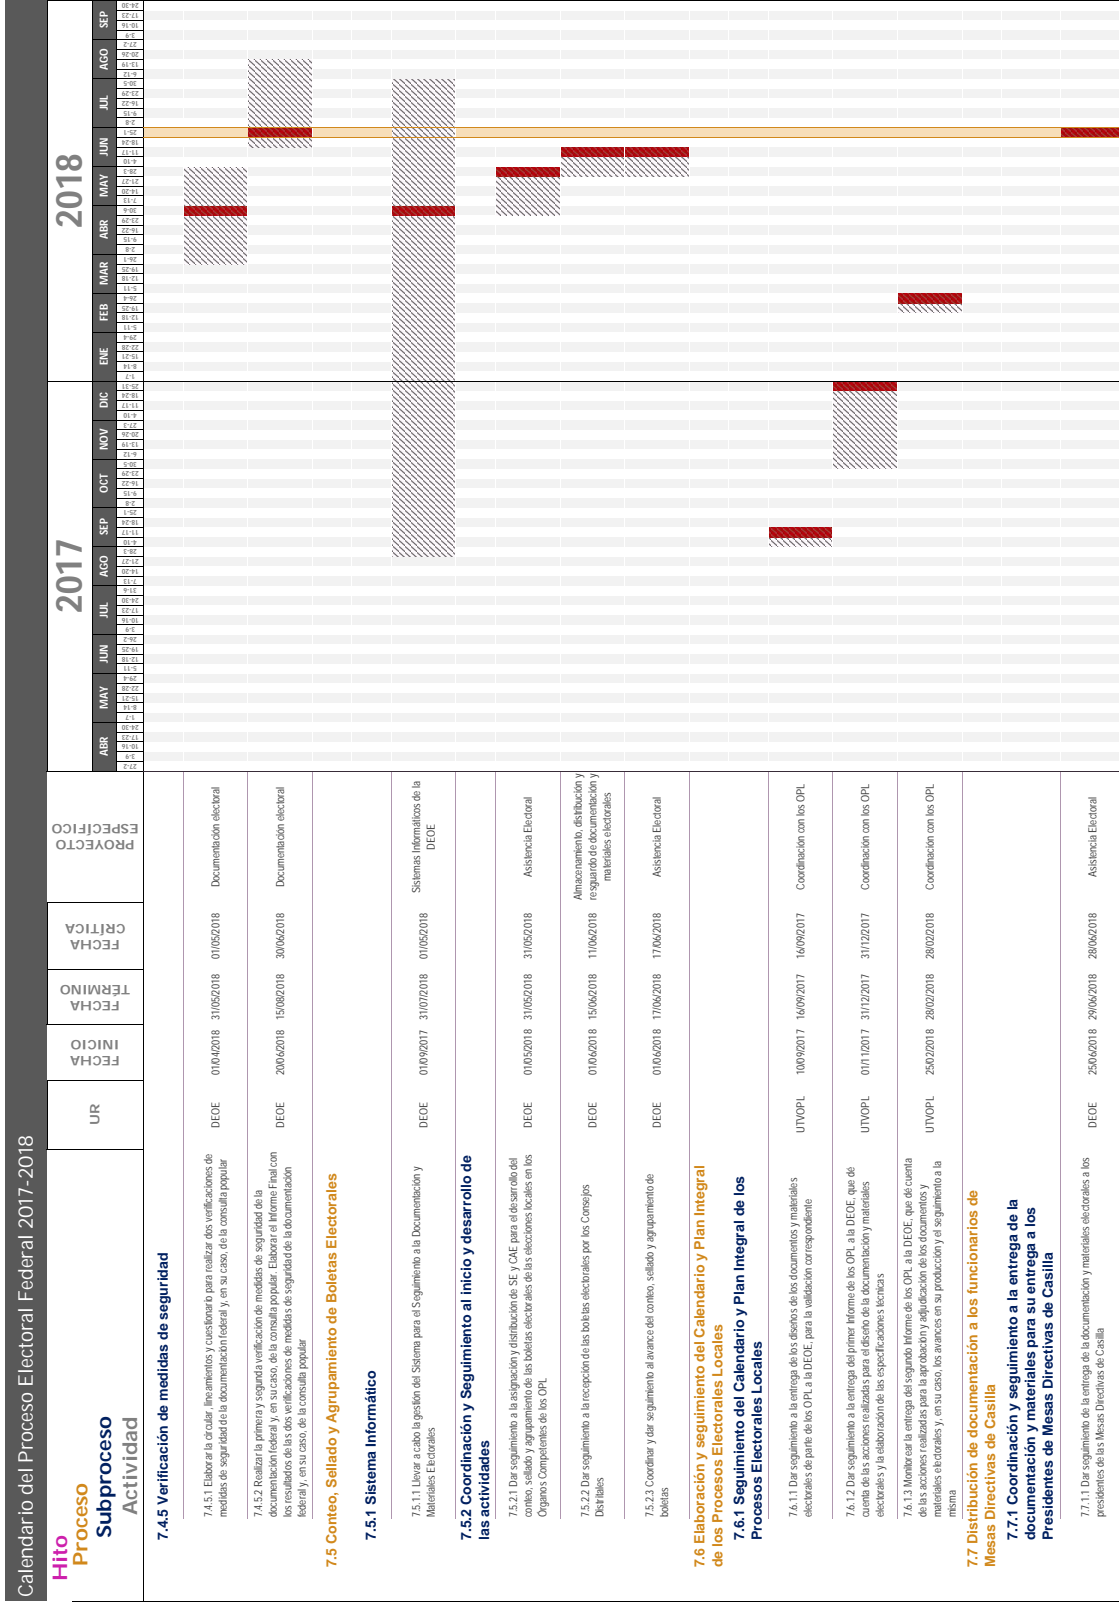

Hito Proceso Subproceso Actividad

7.4.5 Verificación de medidas de seguridad

- 7.4.5.1 Elaborar la orden, lineamientos y cuestionario para realizar las verificaciones de medidas de seguridad de la documentación electoral y, en su caso, de la consulta popular.
- 7.4.5.2 Realizar la primera y segunda verificación de medidas de seguridad de la documentación electoral y, en su caso, de la consulta popular. Elaborar el Informe Final con los resultados de las verificaciones de medidas de seguridad de la documentación electoral y, en su caso, de la consulta popular.

7.5 Conteo, Sellado y Agrupamiento de Boletas Electorales

7.5.1 Sistema Informático

- 7.5.1.1 Llevar a cabo la gestión del Sistema para el Seguimiento a la Documentación y Materiales Electorales.

7.5.2 Coordinación y Seguimiento al inicio y desarrollo de las actividades

- 7.5.2.1 Dar seguimiento a la asignación y distribución de SE y OPE para el desarrollo del conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales de las secciones locales en los Organos Componentes de los OPL.
- 7.5.2.2 Dar seguimiento a la recepción de las boletas electorales por los Consejos Distritales.
- 7.5.2.3 Coordinar y dar seguimiento al avance del conteo, sellado y agrupamiento de boletas.

7.6 Elaboración y seguimiento del Calendario y Plan Integral de los Procesos Electorales Locales

7.6.1 Seguimiento del Calendario y Plan Integral de los Procesos Electorales Locales

- 7.6.1.1 Dar seguimiento a la entrega de los diseños de los documentos y materiales electorales de parte de los OPL a la DECE, para la validación correspondiente.
- 7.6.1.2 Dar seguimiento a la entrega del primer Informe de los OPL a la DECE, que de cuenta de las acciones realizadas para el diseño de la documentación y materiales electorales y la elaboración de las especificaciones técnicas.
- 7.6.1.3 Monitorear la entrega del segundo Informe de los OPL a la DECE, que de cuenta de las acciones realizadas para la aprobación y aplicación de los documentos y materiales electorales y, en su caso, los avances en su producción y el seguimiento a la misma.


7.7 Distribución de documentación a los funcionarios de Mesas Directivas de Casilla

7.7.1 Coordinación y seguimiento a la entrega de la documentación y materiales para su entrega a los Presidentes de Mesas Directivas de Casilla


- 7.7.1.1 Dar seguimiento de la entrega de la documentación y materiales electorales a los presidentes de las Mesas Directivas de Casilla.

Calendario del Proceso Electoral Federal 2017-2018

Hito
Proceso
Subproceso
Actividad

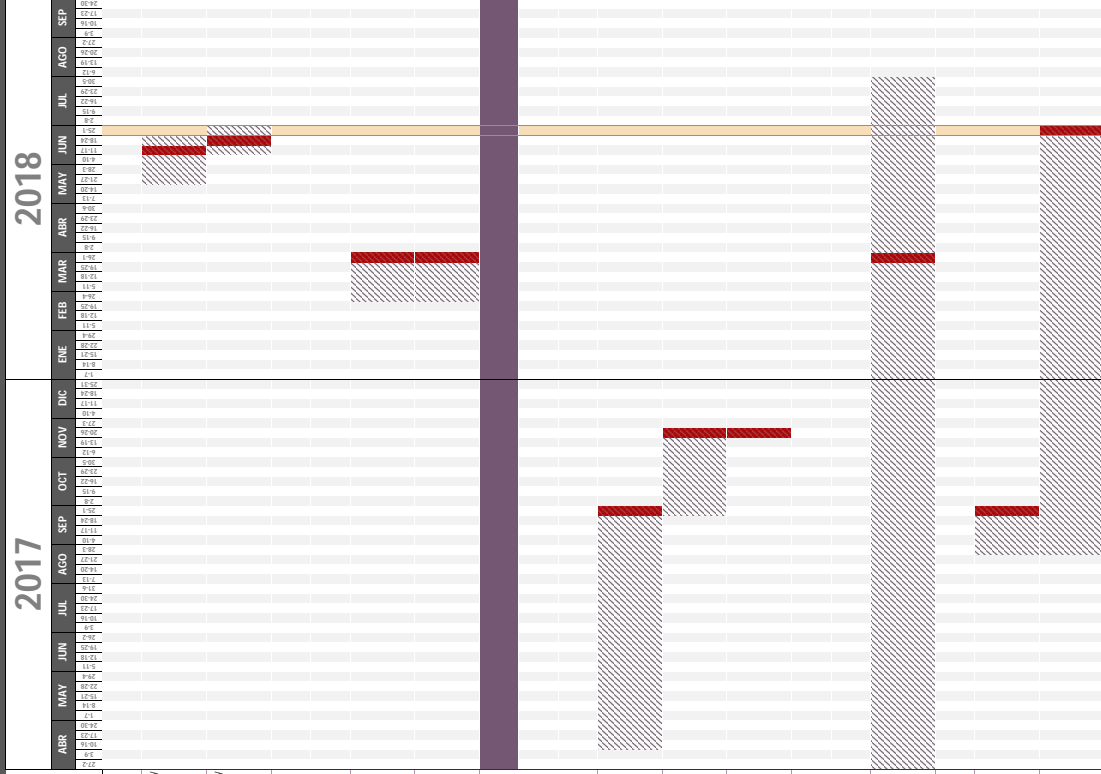

UR	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	FECHA CRÍTICA	PROYECTO ESPECÍFICO
DECE	21/05/2018	21/06/2018	14/06/2018	Amacornamiento, distribución y resguardo de la documentación y materiales electorales
DECE	17/06/2018	30/06/2018	23/06/2018	Amacornamiento, distribución y resguardo de la documentación y materiales electorales
8.2 Elaboración y seguimiento del Calendario y Plan Integral de los Procesos Electorales Locales				
8.2.1 Seguimiento del Calendario y Plan Integral de los Procesos Electorales Locales				
UTVOP	01/03/2018	31/03/2018	31/03/2018	Conordinación con los OPL
UTVOP	01/03/2018	31/03/2018	31/03/2018	Conordinación con los OPL
9. Observadores Electorales				
9.1 Integración de Organos de Recepción de Votación				
9.1.1 Diseñar, producir y distribuir materiales de capacitación electoral				
DECEYEC	15/04/2017	29/09/2017	29/09/2017	Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral 2018
DECEYEC	29/09/2017	21/11/2017	21/11/2017	Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral 2018
DECEYEC	21/11/2017	25/11/2017	25/11/2017	Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral 2018
9.2 Observación Electoral				
9.2.1 Sistema Informático				
DECE	01/04/2017	31/07/2018	01/04/2018	Sistemas Informáticos de la DECE
9.2.2 Acreditación de observadores electorales				
DECE	01/09/2017	30/09/2017	30/09/2017	Integración y Funcionamiento de Organos Temporales
DECE	01/09/2017	30/06/2018	30/06/2018	Integración y Funcionamiento de Organos Temporales

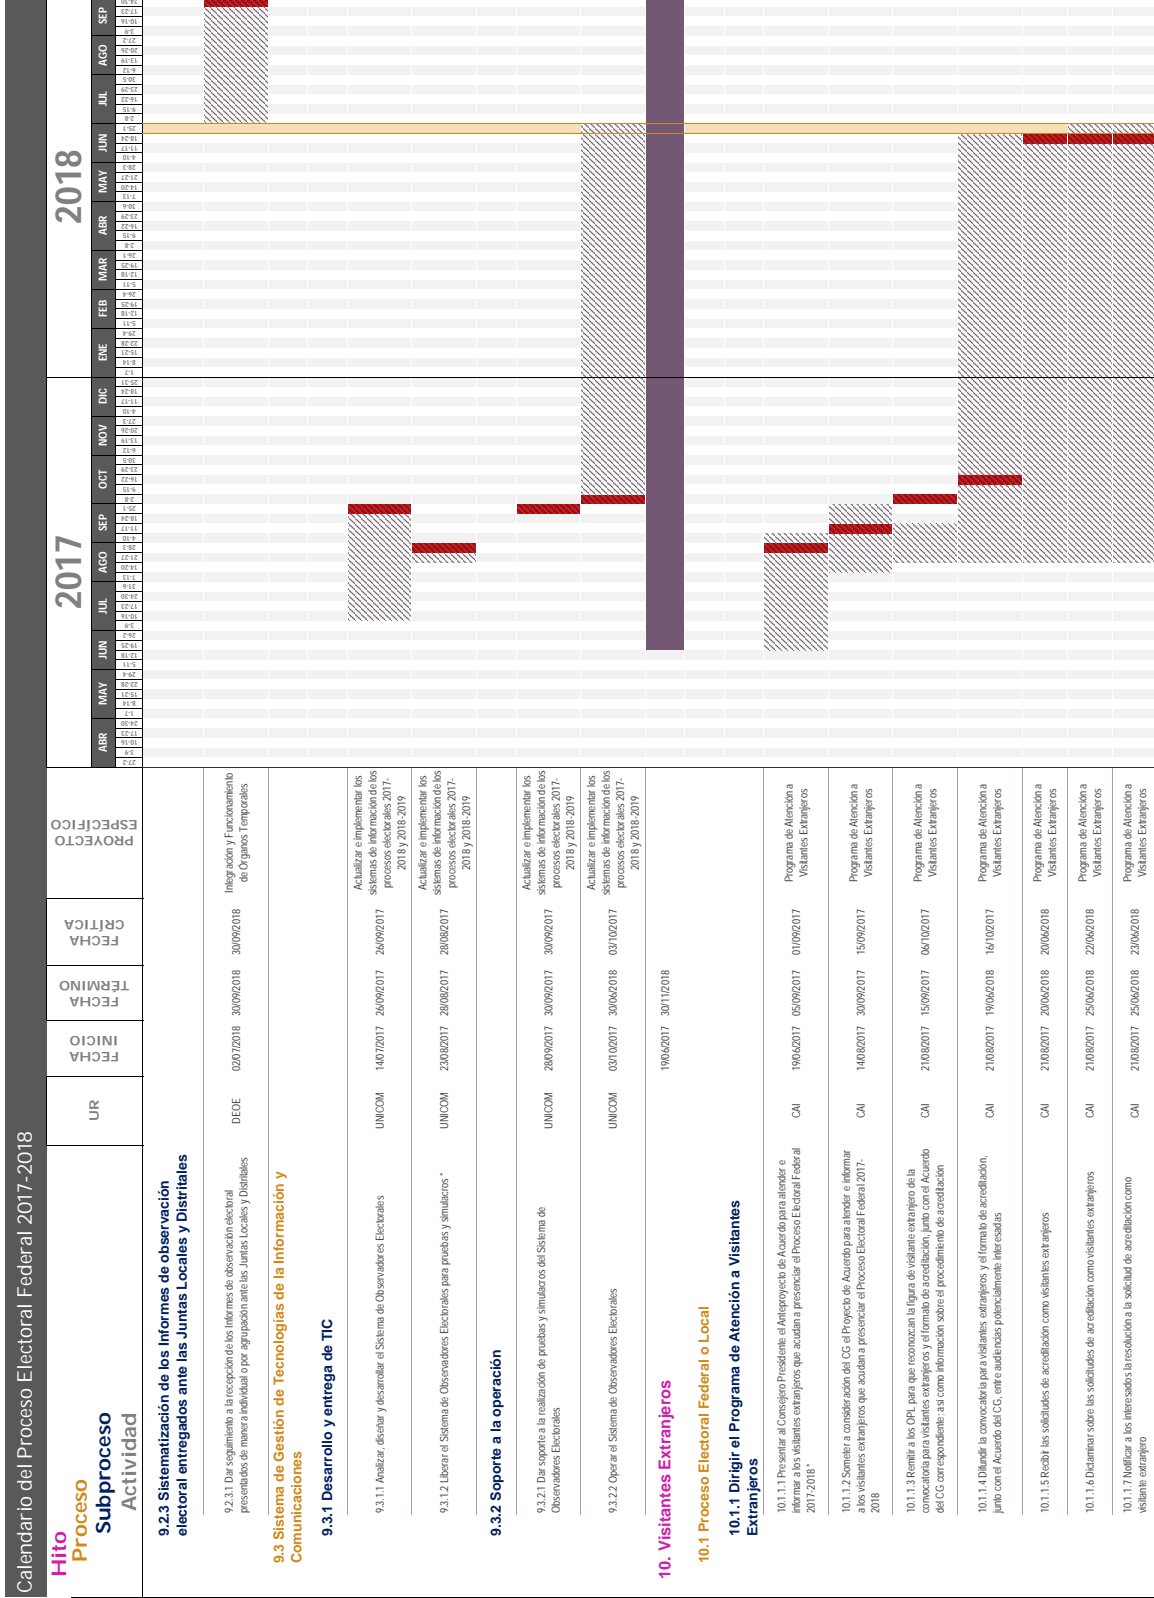

Hito
Proceso
Subproceso
Actividad


UR	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	FECHA CRÍTICA	PROYECTO ESPECÍFICO
----	--------------	---------------	---------------	---------------------

				<p>9.2.3 Sistemización de los Informes de observación electoral entregados ante las Juntas Locales y Distritales</p> <p>9.2.3.1 Dar seguimiento a la recepción de los Informes de observación electoral presentados de manera individual o por agrupación ante las Juntas Locales y Distritales</p>
DFDE	02/07/2018	30/09/2018	30/09/2018	Integración y Funcionamiento de Organos Temporales
				<p>9.3 Sistema de Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones</p> <p>9.3.1 Desarrollo y entrega de TIC</p>
UNICOM	14/07/2017	26/09/2017	26/09/2017	Actualizar e implementar los sistemas de información de los procesos electorales 2017-2018 y 2018-2019
UNICOM	23/08/2017	28/08/2017	28/08/2017	Actualizar e implementar los sistemas de información de los procesos electorales 2017-2018 y 2018-2019
				<p>9.3.2 Soporte a la operación</p>
UNICOM	28/09/2017	30/09/2017	30/09/2017	Actualizar e implementar los sistemas de información de los procesos electorales 2017-2018 y 2018-2019
UNICOM	03/10/2017	30/06/2018	03/10/2017	Actualizar e implementar los sistemas de información de los procesos electorales 2017-2018 y 2018-2019
	19/06/2017	30/11/2018		
				<p>10. Visitantes Extranjeros</p> <p>10.1 Proceso Electoral Federal o Local</p> <p>10.1.1 Dirigir el Programa de Atención a Visitantes Extranjeros</p>
CAI	19/06/2017	05/09/2017	01/09/2017	Programa de Atención a Visitantes Extranjeros
CAI	14/08/2017	30/09/2017	15/09/2017	Programa de Atención a Visitantes Extranjeros
CAI	21/08/2017	15/09/2017	06/10/2017	Programa de Atención a Visitantes Extranjeros
CAI	21/08/2017	19/06/2018	16/10/2017	Programa de Atención a Visitantes Extranjeros
CAI	21/08/2017	20/06/2018	20/06/2018	Programa de Atención a Visitantes Extranjeros
CAI	21/08/2017	25/06/2018	22/06/2018	Programa de Atención a Visitantes Extranjeros
CAI	21/08/2017	25/06/2018	23/06/2018	Programa de Atención a Visitantes Extranjeros

Calendario del Proceso Electoral Federal 2017-2018		2017												2018																
		ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP											
Hito Proceso Subproceso Actividad	UR	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	FECHA CRÍTICA	PROYECTO ESPECÍFICO																									
	CAI	01/09/2017	30/06/2018	31/01/2018	Programa de Atención a Volantes Extranjeros																									
	CAI	20/10/2017	31/10/2018	30/11/2017	Programa de Atención a Volantes Extranjeros																									
	CAI	01/11/2017	25/06/2018	31/01/2018	Programa de Atención a Volantes Extranjeros																									
	CAI	01/02/2018	15/05/2018	01/05/2018	Programa de Atención a Volantes Extranjeros																									
	CAI	01/03/2018	30/06/2018	01/06/2018	Programa de Atención a Volantes Extranjeros																									
	CAI	01/06/2018	30/11/2018	30/10/2018	Programa de Atención a Volantes Extranjeros																									
		01/02/2017	15/12/2018																											
	11. Fondo de Apoyo para la Observación Electoral																													
	11.1 Proceso Electoral Federal o Local																													
11.1.1 Coordinar las tareas para la operación e integración del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral																														
CAI	01/02/2017	30/10/2017	30/10/2017	15/09/2017	Fondo de Apoyo para la Observación Electoral y el acompañamiento técnico 2017-2018																									
CAI	30/07/2017	31/12/2017	30/11/2017		Fondo de Apoyo para la Observación Electoral y el acompañamiento técnico 2017-2018																									
CAI	01/09/2017	30/11/2017	30/10/2017		Fondo de Apoyo para la Observación Electoral y el acompañamiento técnico 2017-2018																									
CAI	01/09/2017	31/12/2017	30/11/2017		Fondo de Apoyo para la Observación Electoral y el acompañamiento técnico 2017-2018																									
CAI	01/11/2017	30/09/2018	30/03/2018		Fondo de Apoyo para la Observación Electoral y el acompañamiento técnico 2017-2018																									
CAI	01/11/2018	15/12/2018	30/11/2018		Fondo de Apoyo para la Observación Electoral y el acompañamiento técnico 2017-2018																									
12. Promoción del Voto y Participación Ciudadana																														
12.1 Formulación e implementación de la política y los proyectos en materia de cultura cívica y participación ciudadana																														
12.1.1 Coordinar actividades para la promoción y divulgación de la cultura cívica																														
DECEYEC	08/09/2017	31/08/2018	01/03/2018	02/07/2018	Divulgación de la participación ciudadana en los Procesos Electorales																									
DECEYEC	31/08/2018	30/11/2018	30/05/2018		Divulgación de la participación ciudadana en los Procesos Electorales																									

Calendario del Proceso Electoral Federal 2017-2018		2017												2018																			
		ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP														
Hito Proceso Subproceso Actividad	UR	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	FECHA CRÍTICA	PROYECTO	<p>12.1.2 Coordinar trabajo con estructura descentrada y OPL para implementación de proyectos de Educación Cívica y Participación Ciudadana</p>																											
						DECEYEC	06/11/2017	31/08/2018	28/02/2018	<p>Impulso de la participación ciudadana en procesos electorales 2018</p>																							
						DECEYEC	06/11/2017	31/08/2018	30/04/2018	<p>Fortalecimiento de la cultura cívica de niñas, niños y adolescentes</p>																							
						DECEYEC	01/01/2018	13/07/2018	31/03/2018	<p>Impulso de la participación ciudadana en procesos electorales 2018</p>																							
<p>12.2 Difusión de la información relacionada con la perspectiva de género y la no discriminación</p>						<p>12.2.1 Organización de actividades de formación y difusión dirigidas a la ciudadanía sobre la perspectiva de género y la no discriminación</p>																											
<p>12.2.1.1 Elaborar y distribuir folletos "Elección sin Discriminación"</p>						UTFYND	08/01/2018	01/07/2018	29/06/2018	<p>Estrategias para la transversalización del principio de igualdad y no discriminación en el PEF 2017-2018</p>																							
<p>12.2.1.2 Imprimir y distribuir la "Guía de Acción Pública: Elecciones sin Discriminación Proceso Electoral Federal 2017-2018"</p>						UTFYND	08/01/2018	01/07/2018	29/06/2018	<p>Estrategias para la transversalización del principio de igualdad y no discriminación en el PEF 2017-2018</p>																							
<p>12.2.1.3 Coordinar la elaboración y transmisión de cápsulas informativas para promover procesos electorales sin discriminación</p>						UTFYND	15/01/2018	01/07/2018	29/06/2018	<p>Estrategias para la transversalización del principio de igualdad y no discriminación en el PEF 2017-2018</p>																							
<p>12.3 Apoyo especializado y asesoría en materia de igualdad de género y no discriminación</p>						<p>12.3.1 Asesoría a los trabajos y actividades realizadas por las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas a fin de que incorporen la perspectiva de género y no discriminación</p>																											
<p>12.3.1.1 Colaborar en la implementación de medidas para hacer accesible la información de las candidaturas en los medios electrónicos del INE: audios y lectura tátil</p>						UTFYND	01/03/2018	01/07/2018	29/06/2018	<p>Estrategias para la transversalización del principio de igualdad y no discriminación en el PEF 2017-2018</p>																							
<p>13. Oficinas Municipales</p>						<p>13.1 Coordinación y seguimiento para la instalación y funcionamiento de Oficinas Municipales</p>																											
<p>13.1.1 Estudio Técnico de Factibilidad para la instalación de Oficinas Municipales</p>							01/06/2017	31/07/2018		<p>Integración y funcionamiento de Organos Temporales</p>																							
<p>13.1.1.1 Elaborar y remitir las propuestas de instalación de Oficinas Municipales *</p>						DECE	01/06/2017	30/09/2017	30/09/2017	<p>Integración y funcionamiento de Organos Temporales</p>																							
<p>13.1.2 Planeación y elaboración de documentos normativos</p>						<p>Integración y funcionamiento de Organos Temporales</p>																											

Calendario del Proceso Electoral Federal 2017-2018		2017												2018														
		ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP									
Hito Proceso Subproceso Actividad	UR	PROYECTO																										
	FECHA INICIO	FECHA CRÍTICA																										
FECHA TÉRMINO	FECHA TÉRMINO																											
DECE	01/09/2017	30/10/2017	30/09/2017	Integración y Funcionamiento de Organos Temporales																								
13.1.3 Coordinación y seguimiento a la instalación y funcionamiento de las Oficinas Municipales		Integración y Funcionamiento de Organos Temporales																										
13.1.3.1	01/01/2018	31/07/2018	31/07/2018	Integración y Funcionamiento de Organos Temporales																								
14. Ubicación, Instalación y Funcionamiento de Casillas		03/07/2017 - 31/07/2018																										
14.1 Sistema de Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones																												
14.1.1 Desarrollo y entrega de TIC																												
14.1.1.1	UNICOM	03/07/2017	20/04/2018	20/04/2018	Actualizar e implementar los sistemas de información de los procesos electorales 2017-2018 y 2018-2019																							
14.1.1.2	UNICOM	04/09/2017	23/04/2018	23/04/2018	Actualizar e implementar los sistemas de información de los procesos electorales 2017-2018 y 2018-2019																							
14.1.1.3	UNICOM	08/01/2018	25/05/2018	25/05/2018	No aplica																							
14.1.1.4	UNICOM	15/02/2018	27/05/2018	27/05/2018	No aplica																							
14.1.2 Soporte a la operación																												
14.1.2.1	UNICOM	01/11/2017	21/12/2017	21/12/2017	Actualizar e implementar los sistemas de información de los procesos electorales 2017-2018 y 2018-2019																							
14.1.2.2	UNICOM	15/11/2017	30/06/2018	15/11/2017	Actualizar e implementar los sistemas de información de los procesos electorales 2017-2018 y 2018-2019																							
14.1.2.3	UNICOM	28/05/2018	22/06/2018	22/06/2018	No aplica																							
14.1.2.4	UNICOM	01/07/2018	01/07/2018	01/07/2018	No aplica																							
14.2 Coordinación y Seguimiento de la ubicación, aprobación, instalación y funcionamiento de Casillas Electorales																												
14.2.1 Sistema Informático																												
14.2.1.1	DECE	01/08/2017	31/07/2018	01/03/2018 al 31/07/2018	Sistemas informáticos de la DECE																							
14.2.2 Seguimiento a la elaboración de propuestas de ubicación de casillas por parte de las Juntas Distritales ejecutivas																												
14.2.2.1	DECE	16/03/2018	24/03/2018	24/03/2018	Ubicación e instalación de casillas																							

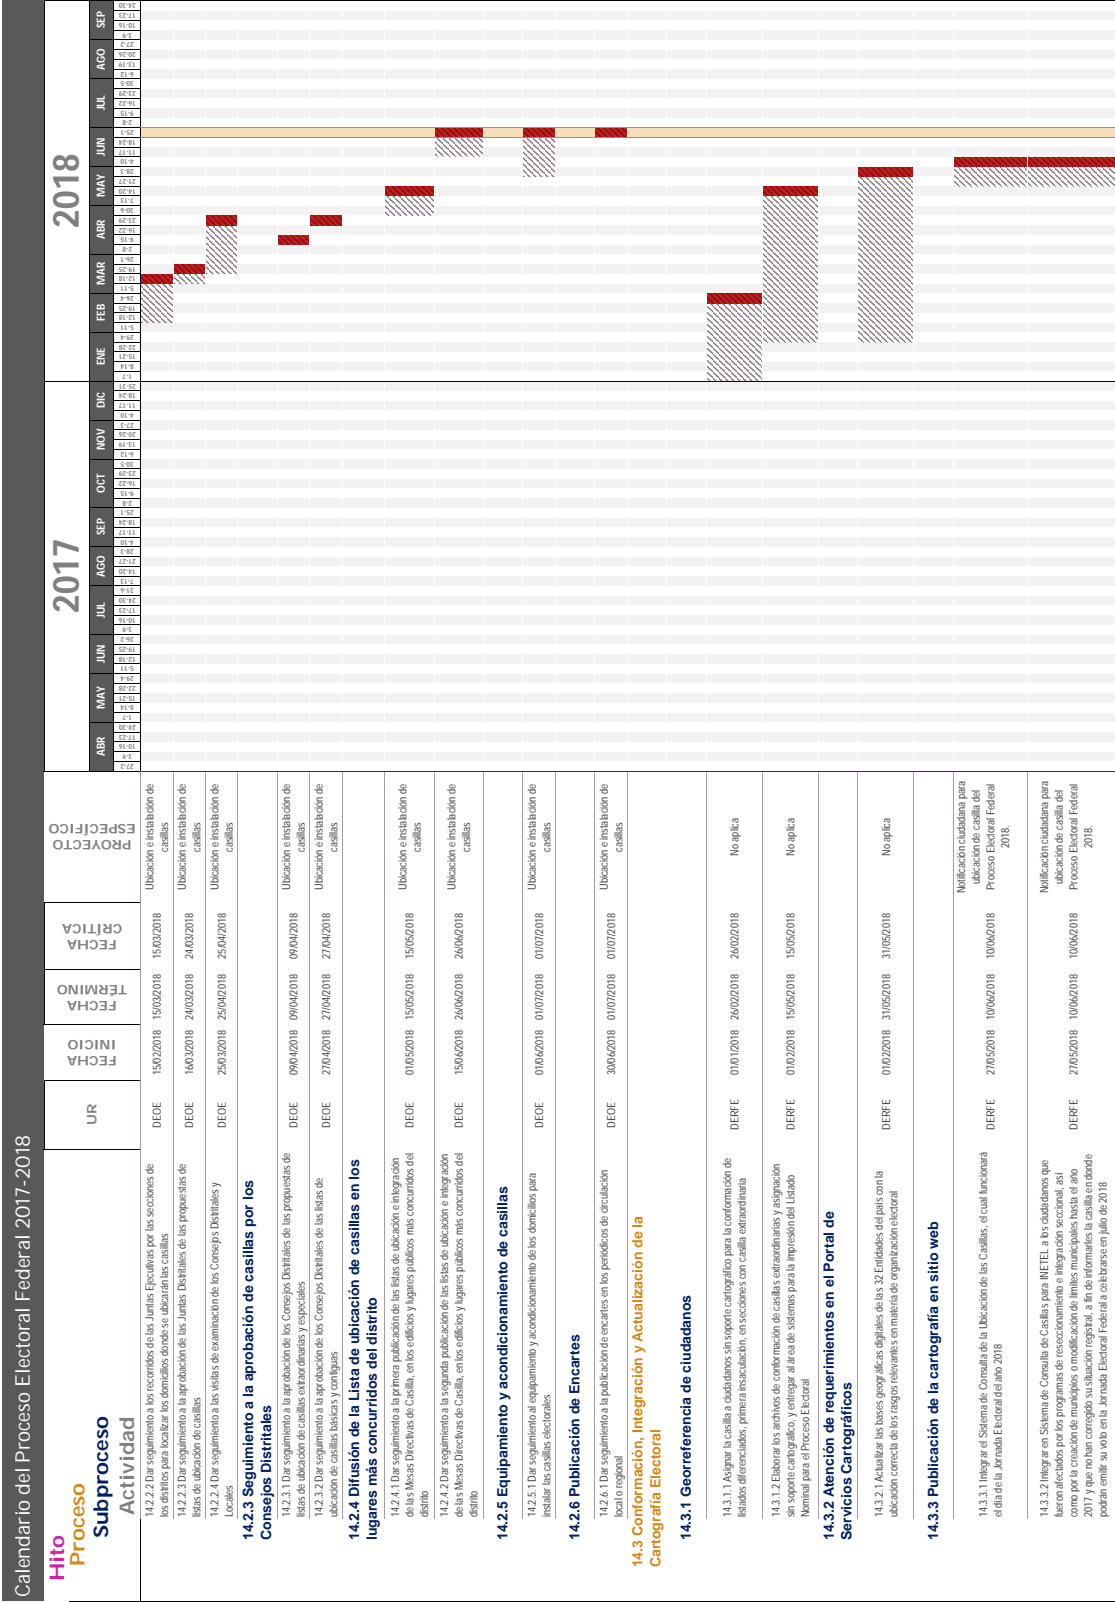


Hito Proceso
Subproceso
Actividad

UR	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	FECHA CÍFRA	ESPECÍFICO
DECE	15/02/2018	15/03/2018	15/03/2018	Ubicación e instalación de casillas
DECE	16/03/2018	24/03/2018	24/03/2018	Ubicación e instalación de casillas
DECE	25/03/2018	25/04/2018	25/04/2018	Ubicación e instalación de casillas
14.2.3 Seguimiento a la aprobación de casillas por los Consejos Distritales				
DECE	09/04/2018	09/04/2018	09/04/2018	Ubicación e instalación de casillas
DECE	27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	Ubicación e instalación de casillas
14.2.4 Difusión de la Lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito				
DECE	01/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	Ubicación e instalación de casillas
DECE	15/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	Ubicación e instalación de casillas
14.2.5 Equipamiento y acondicionamiento de casillas				
DECE	01/07/2018	01/07/2018	01/07/2018	Ubicación e instalación de casillas
14.2.6 Publicación de Encartes				
DECE	30/06/2018	01/07/2018	01/07/2018	Ubicación e instalación de casillas
14.3 Conformación, Integración y Actualización de la Cartografía Electoral				
14.3.1 Georreferencia de ciudadanos				
DERFE	01/07/2018	26/02/2018	26/02/2018	No aplica
DERFE	01/07/2018	15/05/2018	15/05/2018	No aplica
14.3.2 Atención de requerimientos en el Portal de Servicios Cartográficos				
DERFE	01/07/2018	31/05/2018	31/05/2018	No aplica
14.3.3 Publicación de la cartografía en sitio web				
DERFE	27/05/2018	10/06/2018	10/06/2018	Notificación ciudadana para ubicación de casilla del Proceso Electoral Federal 2018.
DERFE	27/05/2018	10/06/2018	10/06/2018	Notificación ciudadana para ubicación de casilla del Proceso Electoral Federal 2018.

Calendario del Proceso Electoral Federal 2017-2018		2017												2018											
Hito	Subproceso	UR	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	FECHA CRÍTICA	PROYECTO ESPECÍFICO	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
	Actividad																								
	14.3.4 Generación y reproducción de archivos de impresión de productos cartográficos																								
	14.3.4.1 Elaborar archivos de impresión de Coque-Cartel que se utilizarán en el Proceso Electoral Federal 2017-2018 para publicar la ubicación de casillas extraordinarias de zona urbana y zonas con afluencia al Marco Geográfico Electoral	DERFE	30/04/2018	22/06/2018	22/06/2018	Modificación ciudadana para ubicación de casilla del Proceso Electoral Federal 2018.																			
	14.3.5 Modificación de Marco Geográfico Electoral																								
	14.3.5.1 Notificar a los ciudadanos que fueron electores por los programas de rescionamiento e integración social, así como por la creación de municipios o modificación de límites municipales en el periodo 2017 al 2017 y que no han convalidado su inscripción por el sistema de inscripción por el sistema de inscripción en la Jornada Electoral Federal a celebrarse en julio de 2018, y presentar informe.	DERFE	01/04/2018	15/07/2018	15/07/2018	Modificación ciudadana para ubicación de casilla del Proceso Electoral Federal 2018.																			
	15. Verificación para el Registro de Candidaturas																								
	15.1 Registro de diversas actividades presentadas por los actores políticos																								
	15.1.1 Registro de Candidatos																								
	15.1.1.1 Recibir y analizar las manifestaciones de intención presentadas por las personas interesadas en postularse para alguna Candidatura Independiente y, en su caso, emitir la constancia de Aspirante respectiva	DEPPP	11/09/2017	14/10/2017	10/10/2017	Registro de Candidatos																			
	16. Registro de Candidaturas de Partidos Políticos y Coaliciones																								
	16.1 Registro de diversas actividades presentadas por los actores políticos																								
	16.1.1 Registro de Candidatos																								
	16.1.1.1 Llevar a cabo las solicitudes y cancelaciones de Candidatos. Elaborar los proyectos de resolución que se emitirán como resultado de las resoluciones emitidas por el TEPJF, en relación con el Registro de Candidatos	DEPPP	30/03/2018	01/07/2018	01/07/2018	Registro de Candidatos																			
	16.1.1.2 Elaborar y someter a consideración del CG el Proyecto de Acuerdo por el que se establecen los criterios relativos al inicio de precampañas para el Proceso Electoral Federal 2017-2018	DEPPP	15/08/2017	05/09/2017	07/09/2017	Registro de Candidatos																			
	16.1.1.3 Elaborar y someter a consideración del CG el Proyecto de Acuerdo relativo al marco normativo para el registro de Candidatos a Diputados y Senadores por ambos principios y Presidente de la República, que deberán observar los Partidos Políticos y, en su caso, las Coaliciones ante los Comités del Instituto	DEPPP	01/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	Registro de Candidatos																			
	16.1.1.4 Verificar que los métodos de selección, que en su momento sean informados por los Partidos Políticos, se encuentren alineados a lo señalado en el Acuerdo del CG respectivo, así como a los Estatutos y a la Ley Electoral, y en su oportunidad rendir un Informe al CG	DEPPP	17/10/2017	31/12/2017	31/12/2017	Registro de Candidatos																			
	16.1.1.5 Dilucidar con participación los plazos para el registro de Candidatos a Diputados, Senadores y Presidente de la República	DEPPP	15/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	Registro de Candidatos																			
	16.1.1.6 Dar seguimiento a las solicitudes de registro de candidaturas de Diputados y Senadores por el principio de Mayoría Relativa que no fueron registradas de forma supletoria ante el CG	DEPPP	11/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	Registro de Candidatos																			
	16.1.1.7 Recibir las solicitudes de registro de candidaturas y analizar que las mismas cumplan con los requisitos legales. Elaborar y someter a consideración del CG los proyectos de Acuerdo por los que se aprueba el registro correspondiente.	DEPPP	11/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	Registro de Candidatos																			

Calendario del Proceso Electoral Federal 2017-2018		2017												2018											
Hito	UR	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	FECHA CRÍTICA	PROYECTO	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP		
17.1.2.1 Dar soporte a la operación del Sistema de Solicitud de Registro de Candidatos Independientes	UNICOM	01/03/2018	01/04/2018	01/04/2018	01/04/2018	Actualizar e implementar los sistemas de soporte para los procedimientos 2017-2018 y 2018-2019																			
17.2 Insumos de información registral para apoyo a Procesos Electorales																									
17.2.1 Verificación de ciudadanos en el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores	DERFE	05/11/2017	04/03/2018	04/03/2018	04/03/2018	Fortalecimiento de las aplicaciones de Verificación de Ciudadano para Candidatos Independientes e Incidentes Sucesos																			
17.3 Registro de diversas actividades presentadas por los actores políticos																									
17.3.1 Registro de Candidatos	DEPPP	15/08/2017	10/09/2017	07/09/2017	07/09/2017	Registro de Candidatos Independientes																			
18. Administración de los Tiempos que corresponden al Estado en Radio y Televisión en Materia Electoral																									
18.1 Construcción de Catálogos, Mapas de Cobertura y Pautas																									
18.1.1 Elaboración de Catálogos de Cobertura	DEPPP	01/03/2017	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	Registro de Candidatos Independientes																			
18.1.1.1 Solicitar al IFT la última actualización a la infraestructura de Radio y Televisión *	DEPPP	01/03/2017	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	No aplica																			
18.1.1.2 Solicitar información de Mapas de Cobertura a la DERFE *	DEPPP	05/04/2017	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	No aplica																			
18.1.1.3 Solicitar último corte de información del Marco Geográfico *	DEPPP	15/05/2017	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	No aplica																			
18.1.1.4 Elaborar Mapas de Cobertura	DEPPP	01/08/2017	31/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	Reforzamiento Operativo Institucional para la administración de los tiempos electorales en Radio y Televisión para el Proceso Electoral Federal 2017-2018																			
18.1.1.5 Actualizar, con base en la información proporcionada por el IFT, el Catálogo de Emisores de Radio y Televisión para el Proceso Electoral Federal 2017-2018	DEPPP	01/08/2017	31/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	Reforzamiento Operativo Institucional para la administración de los tiempos electorales en Radio y Televisión para el Proceso Electoral Federal 2017-2018																			
18.1.1.6 Solicitar a la Dirección de Partidos Políticos y Financiamiento el porcentaje de votación efectiva de la elección de Diputados de Mayoría Relativa del Proceso Electoral Federal 2014-2015 *	DEPPP	01/09/2017	07/09/2017	07/09/2017	07/09/2017	No aplica																			

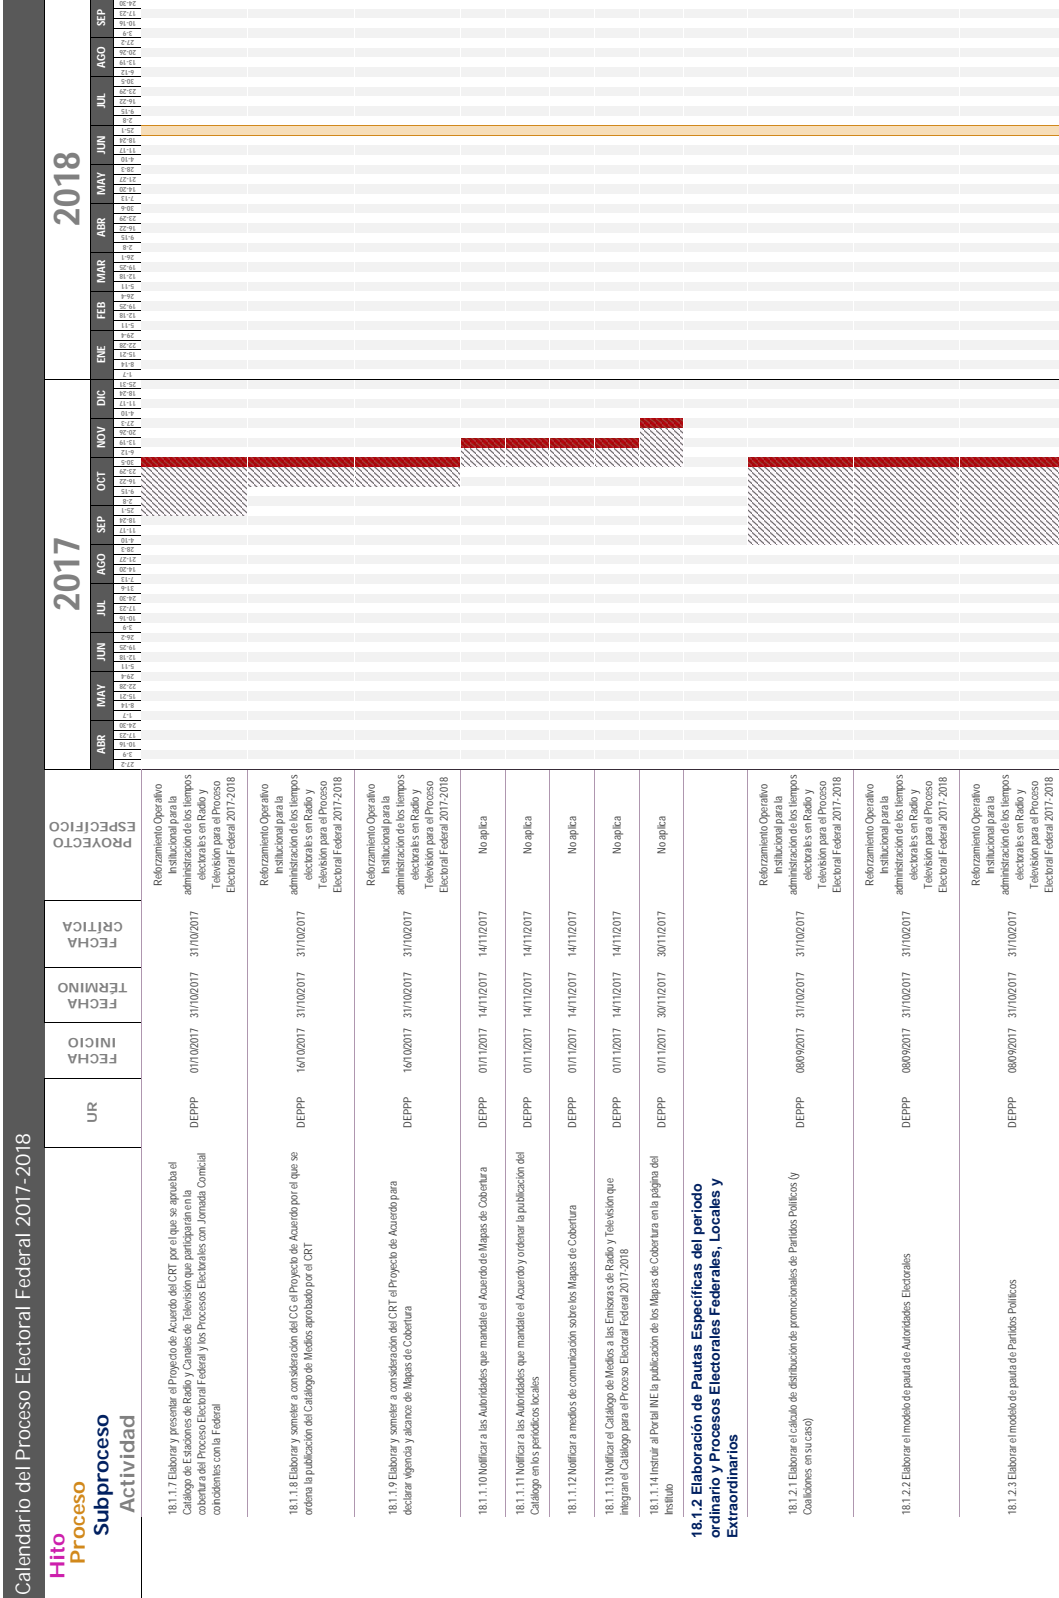



Calendario del Proceso Electoral Federal 2017-2018		2017												2018																
		ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP											
Hito Proceso Subproceso Actividad	UR	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	FECHA CRÍTICA	PROYECTO ESPECÍFICO																									
		DEPPP	08/09/2017	31/10/2017	31/10/2017	Reforzamiento Operativo Institucional para la administración de los tiempos electorales en Radio y Televisión para el Proceso Electoral Federal 2017-2018																								
		DEPPP	08/09/2017	31/10/2017	31/10/2017	Reforzamiento Operativo Institucional para la administración de los tiempos electorales en Radio y Televisión para el Proceso Electoral Federal 2017-2018																								
		DEPPP	08/09/2017	31/10/2017	31/10/2017	Reforzamiento Operativo Institucional para la administración de los tiempos electorales en Radio y Televisión para el Proceso Electoral Federal 2017-2018																								
		DEPPP	01/11/2017	14/11/2017	14/11/2017	Reforzamiento Operativo Institucional para la administración de los tiempos electorales en Radio y Televisión para el Proceso Electoral Federal 2017-2018																								
		DEPPP	13/11/2017	23/11/2017	23/11/2017	No aplica																								
		DEPPP	13/11/2017	23/11/2017	23/11/2017	No aplica																								
		DEPPP	10/12/2017	26/06/2018	26/06/2018	No aplica																								
	18.2 Sistema de Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 18.2.1 Desarrollo y entrega de TIC																													
		UNICOM	18/03/2017	27/11/2017	27/11/2017	No aplica																								
	UNICOM	15/08/2017	15/11/2017	15/11/2017	No aplica																									
18.2.2 Soporte a la operación																														
	UNICOM	07/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	No aplica																									
	UNICOM	01/11/2017	31/08/2018	01/11/2017	No aplica																									
18.3 Administración de órdenes de transmisión y materiales 18.3.1 Recepción, calificación técnica y notificación de materiales																														
	DEPPP	15/09/2017	30/09/2017	30/09/2017	No aplica																									

Calendario del Proceso Electoral Federal 2017-2018		2018																	
		ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP
Hito Proceso Subproceso Actividad	UR	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	FECHA CRÍTICA	PROYECTO ESPECÍFICO														
	DEPPP	01/12/2017	25/06/2018	25/06/2018	Reforzamiento Operativo Institucional para la administración de los tiempos electorales en Radio y Televisión para el Proceso Electoral Federal 2017-2018														
	DEPPP	01/12/2017	25/06/2018	25/06/2018	Reforzamiento Operativo Institucional para la administración de los tiempos electorales en Radio y Televisión para el Proceso Electoral Federal 2017-2018														
	DEPPP	01/12/2017	30/06/2018	30/06/2018	Reforzamiento Operativo Institucional para la administración de los tiempos electorales en Radio y Televisión para el Proceso Electoral Federal 2017-2018														
18.3.2 Elaboración y puesta a disposición de órdenes de transmisión y materiales																			
DEPPP	08/12/2017	30/06/2018	30/06/2018	No aplica	18.3.2.1 Localizar instrucciones electrónicas de transmisión de promocionales y estrategias generadas por los actores políticos, mediante el Sistema Electrónico														
DEPPP	01/12/2017	25/06/2018	25/06/2018	Reforzamiento Operativo Institucional para la administración de los tiempos electorales en Radio y Televisión para el Proceso Electoral Federal 2017-2018	18.3.2.2 Elaborar y enviar la lista de materiales que ingresan en la orden de transmisión respectiva														
DEPPP	08/12/2017	30/06/2018	30/06/2018	Reforzamiento Operativo Institucional para la administración de los tiempos electorales en Radio y Televisión para el Proceso Electoral Federal 2017-2018	18.3.2.3 Injugar en los órdenes de transmisión los materiales traducidos a otros lenguajes desuaves al español														
DEPPP	09/12/2017	26/06/2018	26/06/2018	No aplica	18.3.2.4 Firmar electrónicamente las versiones de las órdenes de transmisión respectivas														
DEPPP	09/12/2017	30/06/2018	30/06/2018	No aplica	18.3.2.5 Generar la versión de la orden de transmisión respectiva														
18.4 Gestión de requerimientos																			
18.4.1 Atención de medidas cautelares																			
DEPPP	01/12/2017	01/07/2018	La que señale el acuerdo de resolución a notificar	No aplica	18.4.1.1 Modificar los acuerdos o resoluciones mediante los cuales se declaró procedente la adopción de medidas cautelares														
18.4.2 Desahogo de requerimientos relacionados con Procedimientos Sancionadores																			
DEPPP	01/12/2017	01/07/2018	30/06/2018-01/07/2018	No aplica	18.4.2.1 Recabar la información y entregarla al órgano instructor que la requiera en el plazo señalado														
18.4.3 Requerimientos a concesionarios por incumplimientos en la transmisión del pautaado																			

Calendario del Proceso Electoral Federal 2017-2018					2017												2018															
Hito	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FECHA CRITICA	PROYECTO ESPECIFICO	2017												2018											
									ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP						
18.5	Monitoreo y verificación de pautas y transmisiones en Radio y Televisión	18.5.1	Administración de Infraestructura para el Monitoreo	DEPPP	01/10/2017	10/07/2018	30/04/2018 al 27/06/2018	SCER (Actualización y mantenimiento)																								
18.5	Monitoreo y verificación de pautas y transmisiones en Radio y Televisión	18.5.2	Verificación de señales en Radio y Televisión	DEPPP	01/10/2017	31/07/2018	26/06/2018	SCER (Actualización y mantenimiento)																								
18.5	Monitoreo y verificación de pautas y transmisiones en Radio y Televisión	18.5.3	Análisis y aprovechamiento de la Información	DEPPP	08/11/2017	03/07/2018	03/07/2018	Reforzamiento institucional para el monitoreo de los tiempos electrónicos en Radio y Televisión en los Centros de Verificación y Monitoreo en la modalidad línea ante																								
19.	Monitoreo de Programas de Radio y Televisión que difunden Noticias y Comunicaciones	19.1	Desarrollo y entrega de TIC	UNICOM	20/02/2017	31/10/2018	12/12/2017	No aplica																								

Calendario del Proceso Electoral Federal 2017-2018		2017												2018															
		ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP										
Hito Proceso Subproceso Actividad	UR	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	FECHA CRÍTICA	ESPECÍFICO																								
						UNICOM	23/03/2017	13/12/2017	13/12/2017	No aplica																			
19.1.2 Soporte a la operación																													
19.1.2.1 Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema de Monitoreo de Noticiarios						UNICOM	19/09/2017	31/10/2018	31/10/2018	No aplica																			
19.1.2.2 Dar soporte a la operación del Sistema de Monitoreo de Noticiarios						UNICOM	01/11/2017	31/07/2018	01/11/2017	No aplica																			
19.2 Monitoreo y verificación de pautas y transmisiones en Radio y Televisión																													
19.2.1 Verificación de señales en Radio y Televisión																													
19.2.1.1 Agregar los lineamientos generales que recomiendan a los radiodifusores de la información y edición de los contenidos de programación y campañas de los Partidos Políticos y de los Candidatos Independientes.						DEPPP	01/08/2017	20/08/2017	20/08/2017	Monitoreo de espacios que difunden noticias en Radio y Televisión durante las Precampañas y Campañas del Proceso Electoral Federal 2017-2018																			
19.2.1.2 Elaborar y someter a consideración del CG el Proyecto de Acuerdo para aprobar la metodología y catálogo de noticiarios						DEPPP	01/09/2017	14/11/2017	14/11/2017	Monitoreo de espacios que difunden noticias en Radio y Televisión durante las Precampañas y Campañas del Proceso Electoral Federal 2017-2018																			
19.2.1.3 Elaborar y someter a consideración del CG el Proyecto de Acuerdo por el que se ordena la realización de monitoreos de las transmisiones sobre las precampañas y campañas federales del año 2018 en los programas de Radio y Televisión que difundan noticias						DEPPP	01/09/2017	14/11/2017	14/11/2017	Monitoreo de espacios que difunden noticias en Radio y Televisión durante las Precampañas y Campañas del Proceso Electoral Federal 2017-2018																			
19.2.1.4 Firmar el convenio con la Institución de Investigación seleccionada que realizará el Monitoreo de Noticiarios apoyado en el Sistema de Monitoreo de Noticiarios						DEPPP	01/09/2017	14/11/2017	14/11/2017	Monitoreo de espacios que difunden noticias en Radio y Televisión durante las Precampañas y Campañas del Proceso Electoral Federal 2017-2018																			
19.2.1.5 Implementar el Sistema de Monitoreo de Pautas y Transmisiones en Radio y Televisión y realizar serie de pruebas de integración y su carga al servidor (primer periodo en precampaña)						DEPPP	14/11/2017	14/12/2017	14/12/2017	Monitoreo de espacios que difunden noticias en Radio y Televisión durante las Precampañas y Campañas del Proceso Electoral Federal 2017-2018																			
19.2.1.6 Llevar a cabo la capacitación del uso del Sistema de Monitoreo y Entrega de Guía (primer periodo)						DEPPP	14/11/2017	14/12/2017	14/12/2017	Monitoreo de espacios que difunden noticias en Radio y Televisión durante las Precampañas y Campañas del Proceso Electoral Federal 2017-2018																			
19.2.1.7 Cargar los logs de noticiarios y aplicación de la metodología (primer periodo)						DEPPP	14/12/2017	19/02/2018	19/02/2018	Monitoreo de espacios que difunden noticias en Radio y Televisión durante las Precampañas y Campañas del Proceso Electoral Federal 2017-2018																			

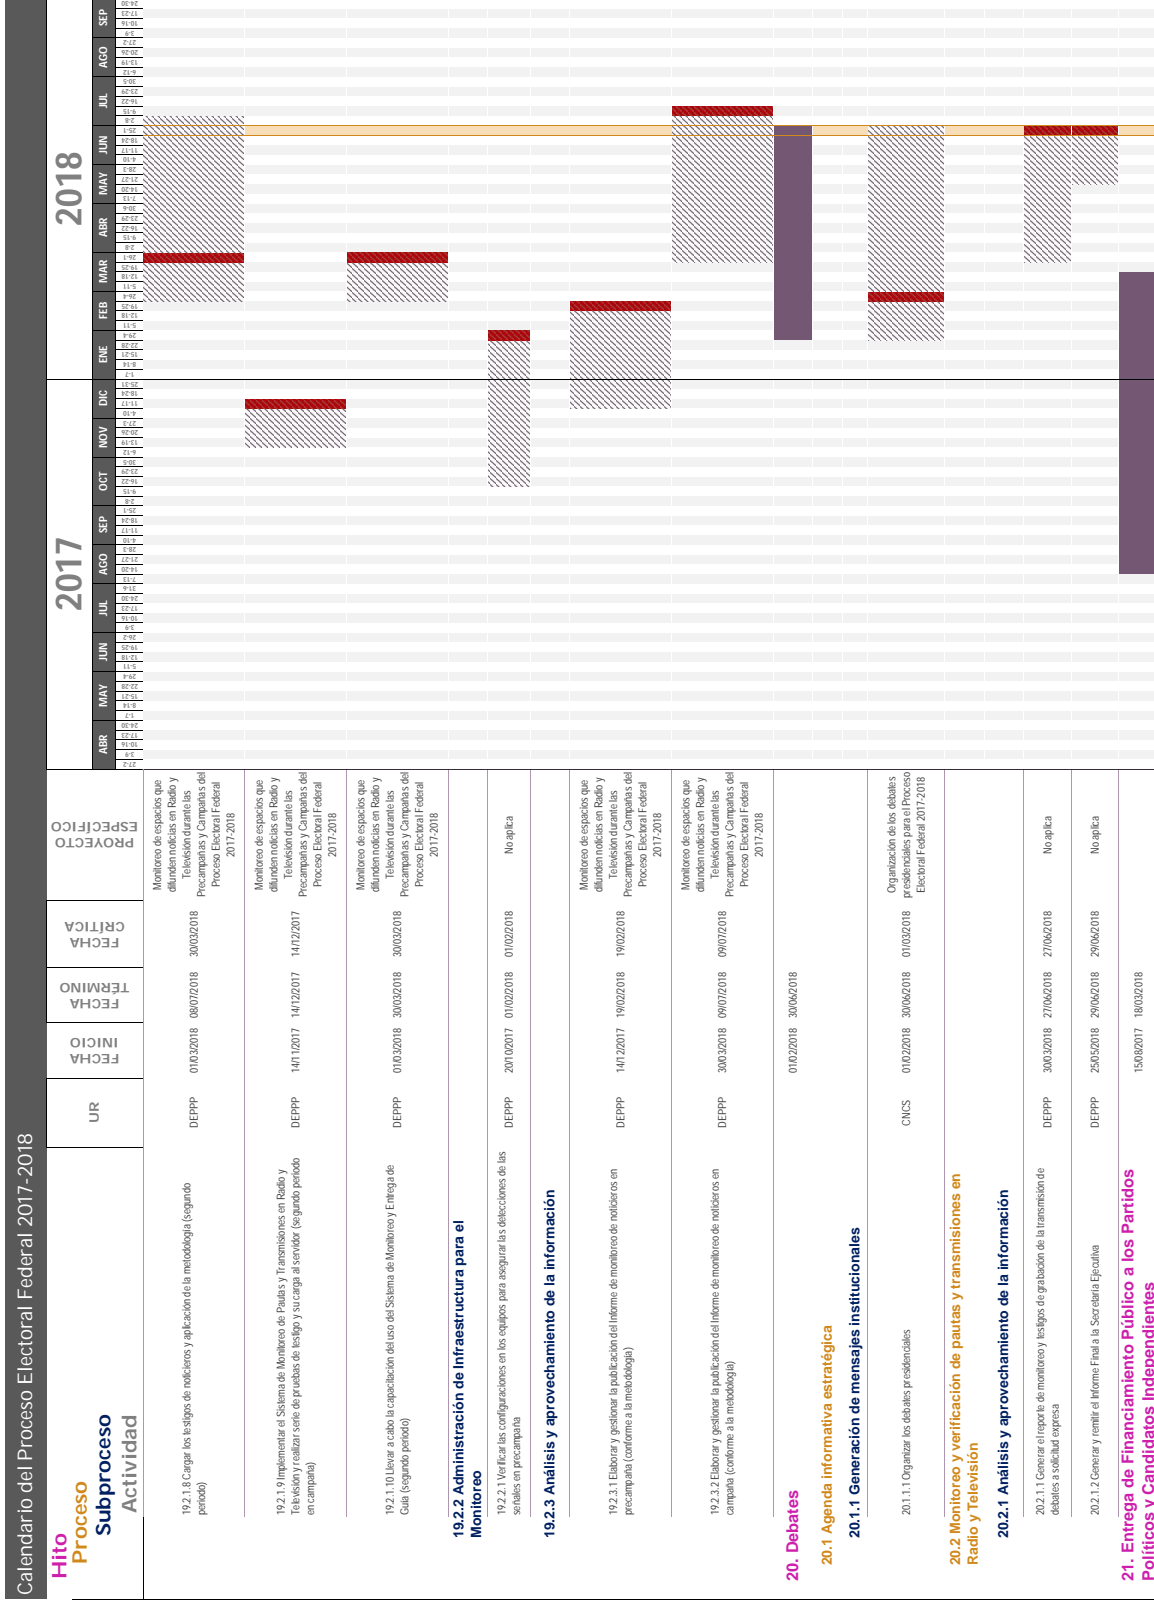

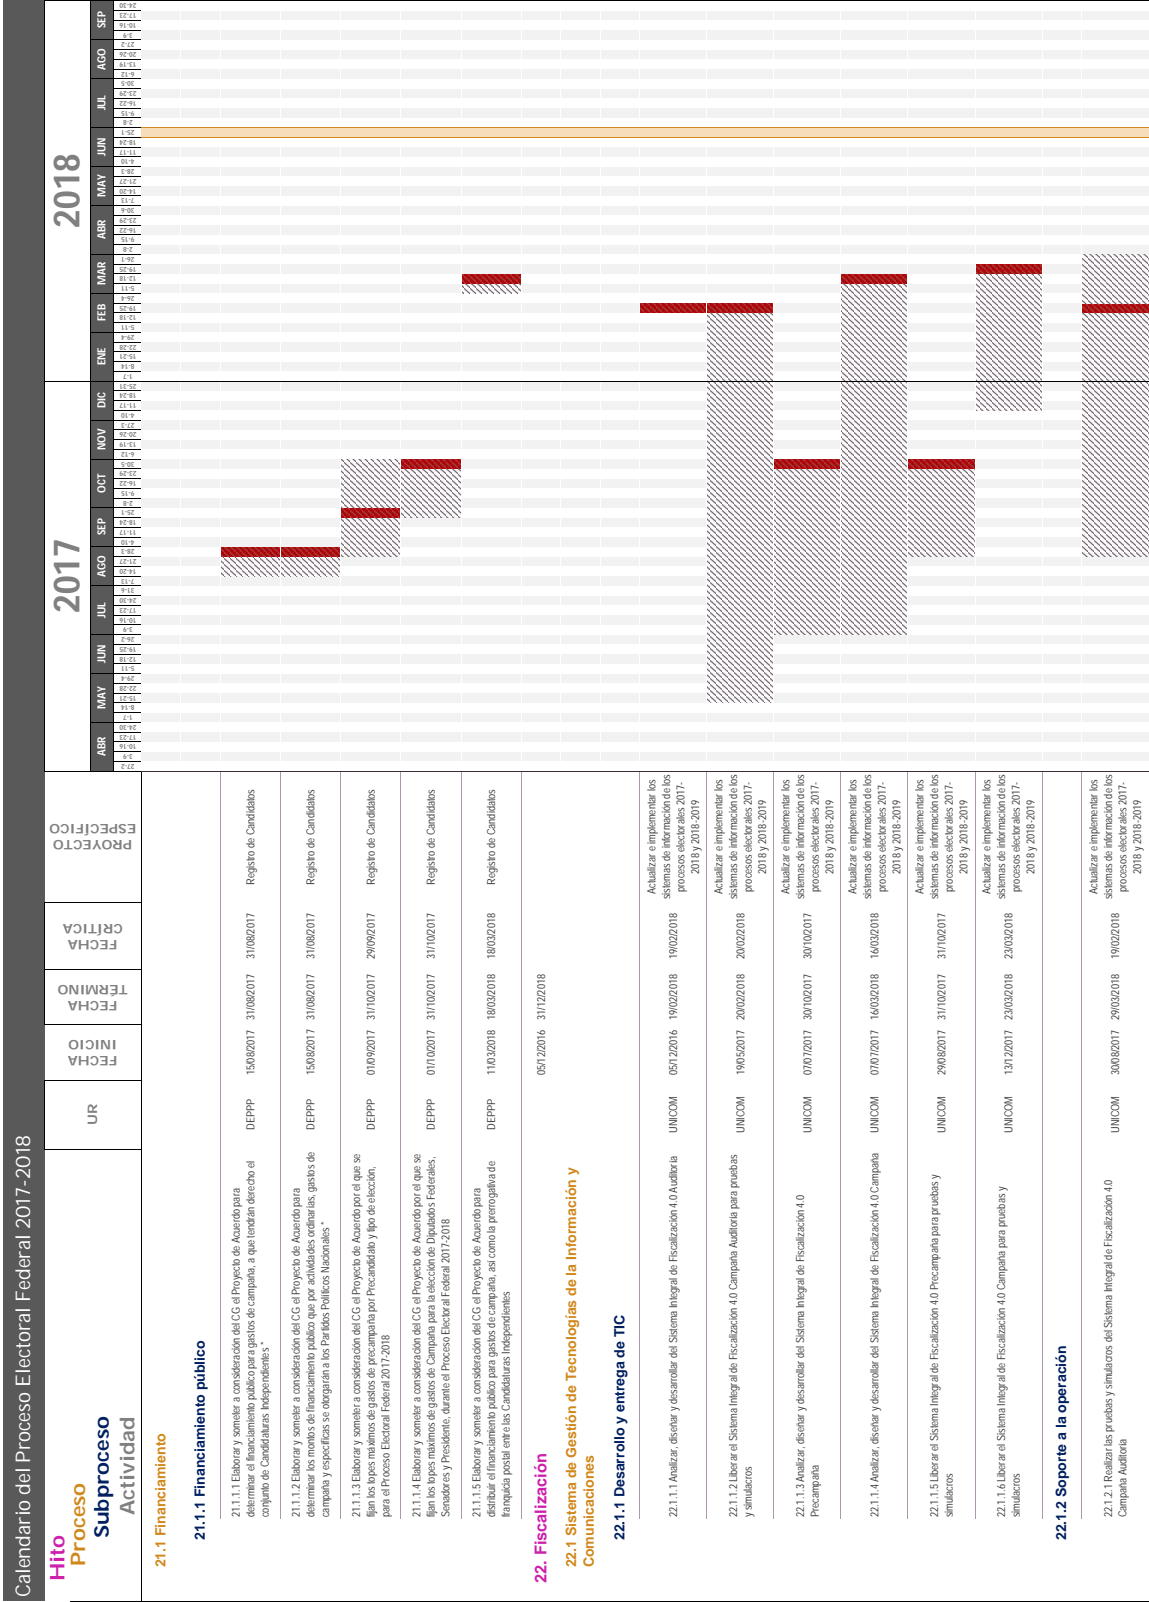

Calendario del Proceso Electoral Federal 2017-2018

UR	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	FECHA CRÍTICA	PROYECTO ESPECÍFICO
DEPPP	15/08/2017	31/08/2017	31/08/2017	Registro de Candidatos
DEPPP	15/08/2017	31/08/2017	31/08/2017	Registro de Candidatos
DEPPP	01/09/2017	31/10/2017	29/09/2017	Registro de Candidatos
DEPPP	01/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	Registro de Candidatos
DEPPP	11/03/2018	18/03/2018	18/03/2018	Registro de Candidatos
	05/12/2016	31/12/2018		
UNICOM	05/12/2016	19/02/2018	19/02/2018	Actualizar e implementar los sistemas de información de los procesos electorales 2017-2018 y 2018-2019
UNICOM	19/05/2017	20/02/2018	20/02/2018	Actualizar e implementar los sistemas de información de los procesos electorales 2017-2018 y 2018-2019
UNICOM	07/07/2017	30/10/2017	30/10/2017	Actualizar e implementar los sistemas de información de los procesos electorales 2017-2018 y 2018-2019
UNICOM	07/07/2017	16/03/2018	16/03/2018	Actualizar e implementar los sistemas de información de los procesos electorales 2017-2018 y 2018-2019
UNICOM	29/08/2017	31/10/2017	31/10/2017	Actualizar e implementar los sistemas de información de los procesos electorales 2017-2018 y 2018-2019
UNICOM	13/12/2017	23/03/2018	23/03/2018	Actualizar e implementar los sistemas de información de los procesos electorales 2017-2018 y 2018-2019
UNICOM	30/08/2017	29/03/2018	19/02/2018	Actualizar e implementar los sistemas de información de los procesos electorales 2017-2018 y 2018-2019

Hito
Proceso
Subproceso
Actividad

21.1 Financiamiento

21.1.1 Financiamiento público

- 21.1.1.1 Elaborar y someter a consideración del CG el Proyecto de Acuerdo para determinar el monto máximo de gastos de campaña, a que tendrán derecho el conjunto de Candidatos Registrados.
- 21.1.1.2 Elaborar y someter a consideración del CG el Proyecto de Acuerdo para determinar los montos de financiamiento público que por actividades ordinarias, gastos de campaña y específicas se otorgan a los Partidos Políticos Nacionales.*
- 21.1.1.3 Elaborar y someter a consideración del CG el Proyecto de Acuerdo por el que se fijan los topos máximos de gastos de precampaña por Precandidato y tipo de elección, para el Proceso Electoral Federal 2017-2018.
- 21.1.1.4 Elaborar y someter a consideración del CG el Proyecto de Acuerdo por el que se fijan los topos máximos de gastos de Campaña para la elección de Diputados Federales, Senadores y Presidente, durante el Proceso Electoral Federal 2017-2018.
- 21.1.1.5 Elaborar y someter a consideración del CG el Proyecto de Acuerdo para destinar el financiamiento público para gastos de campaña, así como la prerrogativa de franquicia postal en el caso de Candidatos Independientes.

22. Fiscalización

22.1 Sistema de Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones


22.1.1 Desarrollo y entrega de TIC


- 22.1.1.1 Analizar, diseñar y desarrollar del Sistema Integral de Fiscalización 4.0 Auditoría y Simulacro
- 22.1.1.2 Elaborar el Sistema Integral de Fiscalización 4.0 Campaña Auditoría para pruebas y Simulacro
- 22.1.1.3 Analizar, diseñar y desarrollar del Sistema Integral de Fiscalización 4.0 Precampaña
- 22.1.1.4 Analizar, diseñar y desarrollar del Sistema Integral de Fiscalización 4.0 Campaña
- 22.1.1.5 Elaborar el Sistema Integral de Fiscalización 4.0 Precampaña para pruebas y simulacro
- 22.1.1.6 Elaborar el Sistema Integral de Fiscalización 4.0 Campaña para pruebas y simulacro

22.1.2 Soporte a la operación

- 22.1.2.1 Realizar las pruebas y simulacro del Sistema Integral de Fiscalización 4.0 Campaña Auditoría

Calendario del Proceso Electoral Federal 2017-2018		2017												2018																
		ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP											
Hito	Proceso	UR	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	FECHA CRÍTICA	ESPECÍFICO																								
	22.1.2.2 Realizar las pruebas y simulacro del Sistema Integral de Fiscalización 4.0 Precampaña	UNICOM	18/09/2017	06/10/2017	06/10/2017	Actualizar e implementar los sistemas de información de los procesos electorales 2017-2018 y 2018-2019																								
	22.1.2.3 Dar soporte a la operación del Sistema Integral de Fiscalización 4.0 Precampaña	UNICOM	07/10/2017	20/03/2018	07/10/2017	Actualizar e implementar los sistemas de información de los procesos electorales 2017-2018 y 2018-2019																								
	22.1.2.4 Dar soporte a la operación del Sistema Integral de Fiscalización 4.0 Campaña	UNICOM	07/10/2017	31/08/2018	07/10/2017	Actualizar e implementar los sistemas de información de los procesos electorales 2017-2018 y 2018-2019																								
	22.1.2.5 Realizar las pruebas y simulacro del Sistema Integral de Fiscalización 4.0 Campaña	UNICOM	15/01/2018	29/03/2018	29/03/2018	Actualizar e implementar los sistemas de información de los procesos electorales 2017-2018 y 2018-2019																								
	22.1.2.6 Dar soporte a la operación del Sistema Integral de Fiscalización 4.0 Campaña	UNICOM	30/03/2018	20/07/2018	30/03/2018	Actualizar e implementar los sistemas de información de los procesos electorales 2017-2018 y 2018-2019																								
22.2 Coordinación y Vinculación																														
22.2.1 Capacitación																														
	22.2.1.1 Ingresar a los Partidos Políticos, Aspirantes y Candidatos la orientación de las actividades de capacitación y vinculación de los obligados y del personal de la UTF en materia de los procesos electorales 2017-2018 y 2018-2019	UTF	01/09/2017	31/12/2018	31/12/2018	Formación y especialización de los sujetos obligados y del personal de la UTF en materia de los procesos electorales 2017-2018 y 2018-2019																								
22.3 Fiscalización																														
22.3.1 Auditar Procesos Electorales Federales y Locales																														
	22.3.1.1 Realizar la inspección para la selección de los distritos electorales a verificar durante el etapa de campañas	UTF	01/09/2017	23/09/2017	23/09/2017	Proceso Electoral Local y Federal 2017-2018																								
	22.3.1.2 Entregar a la Comisión de Fiscalización la metodología para seleccionar uno o varios distritos, estados o municipios según corresponda, para la realización de visitas de verificación a los Partidos Políticos, Candidatos y Candidatos Independientes	UTF	23/09/2017	23/09/2017	23/09/2017	No aplica																								
	22.3.1.3 Realizar la inspección para la selección de los distritos electorales a verificar durante el etapa de precampañas	UTF	23/09/2017	31/10/2017	31/10/2017	Proceso Electoral Local y Federal 2017-2018																								
	22.3.1.4 Elaborar y someter a consideración de la Comisión de Fiscalización el Proyecto de Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos que deberá observar la UTF para la emisión y práctica de las ordenes de visita de verificación a los Partidos Políticos, Precandidatos, Aspirantes, Candidatos y Candidatos Independientes con el fin de corroborar el cumplimiento de sus obligaciones. (Precampaña y campaña)	UTF	01/10/2017	15/11/2017	15/11/2017	Proceso Electoral Local y Federal 2017-2018																								
	22.3.1.5 Recibir los informes que presenten los Partidos Políticos por cada uno de sus Precandidatos a cargos de elección popular, respecto de la ubicación de casetas y actos de precampaña a celebrar	UTF	01/11/2017	14/12/2017	14/12/2017	Proceso Electoral Local y Federal 2017-2018																								
	22.3.1.6 Realizar visitas de verificación a los Distritos Electorales durante los periodos de precampañas electorales, a cargo de personal de la UTF, con el apoyo de la Junta Local Organizadora, para corroborar el cumplimiento de las obligaciones de los Partidos Políticos, Aspirantes y Candidatos Independientes, a efecto de fortalecer la legalidad y equidad del Proceso Electoral Federal 2017-2018	UTF	07/10/2017	11/02/2018	11/02/2018	Proceso Electoral Local y Federal 2017-2018																								

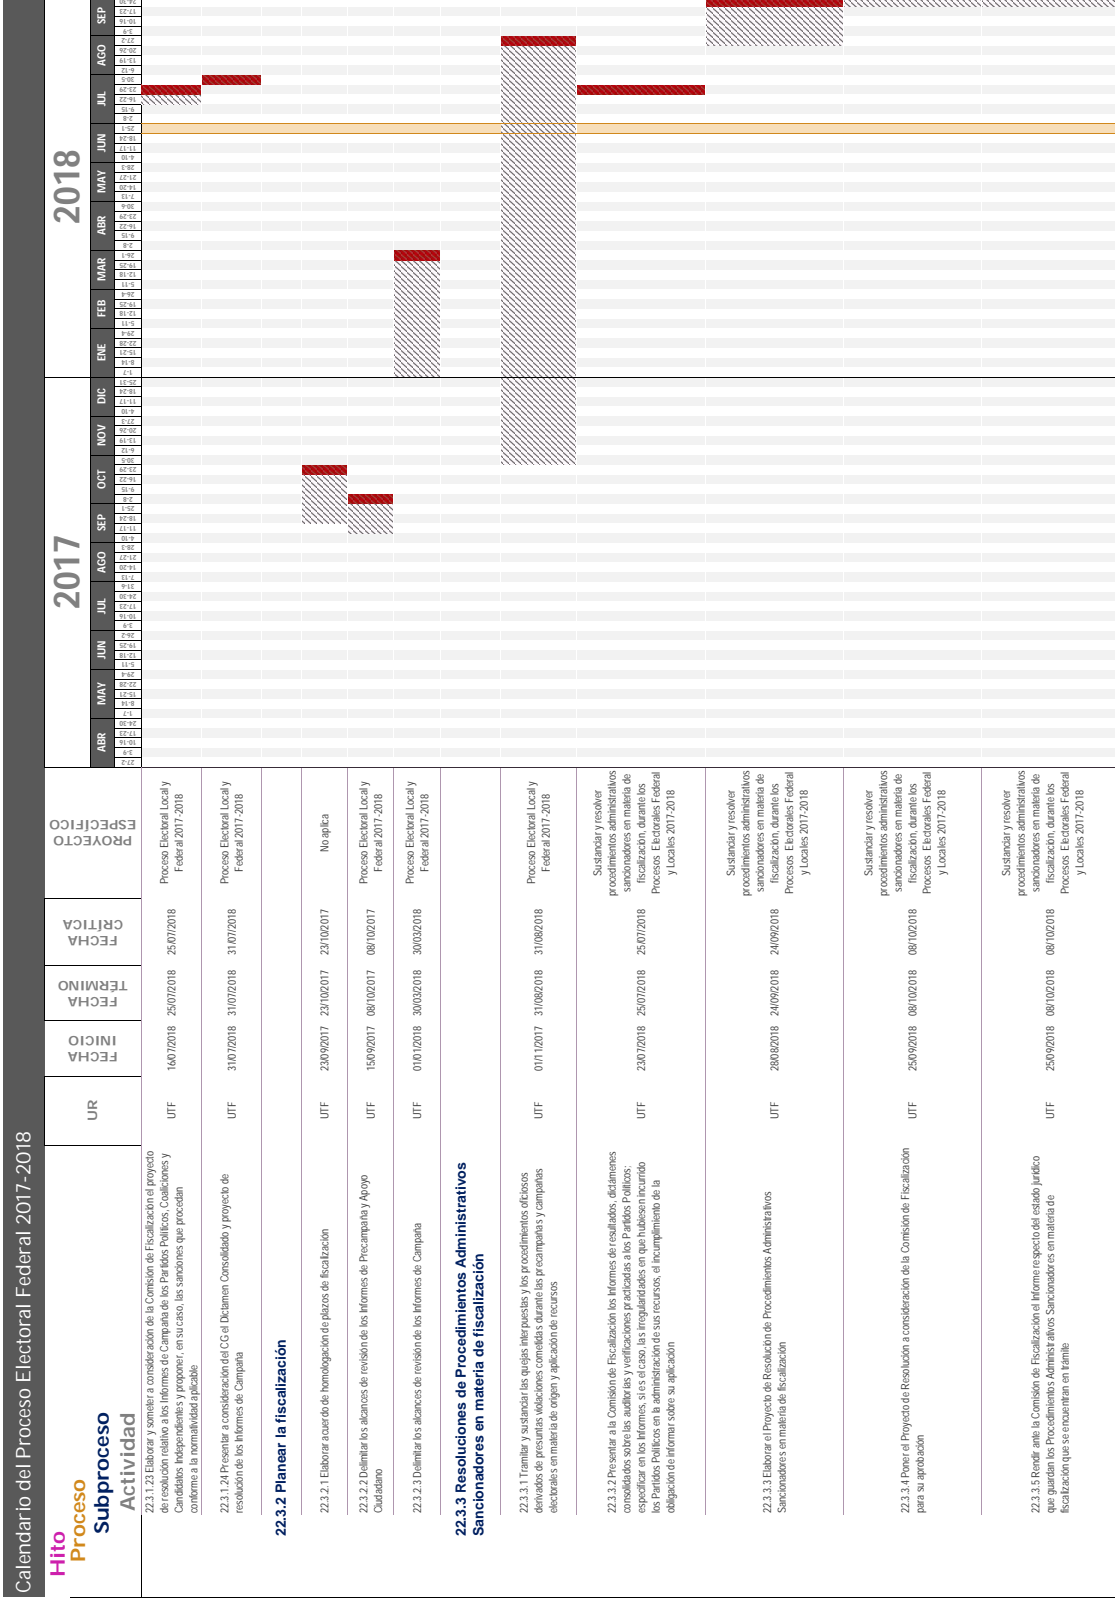


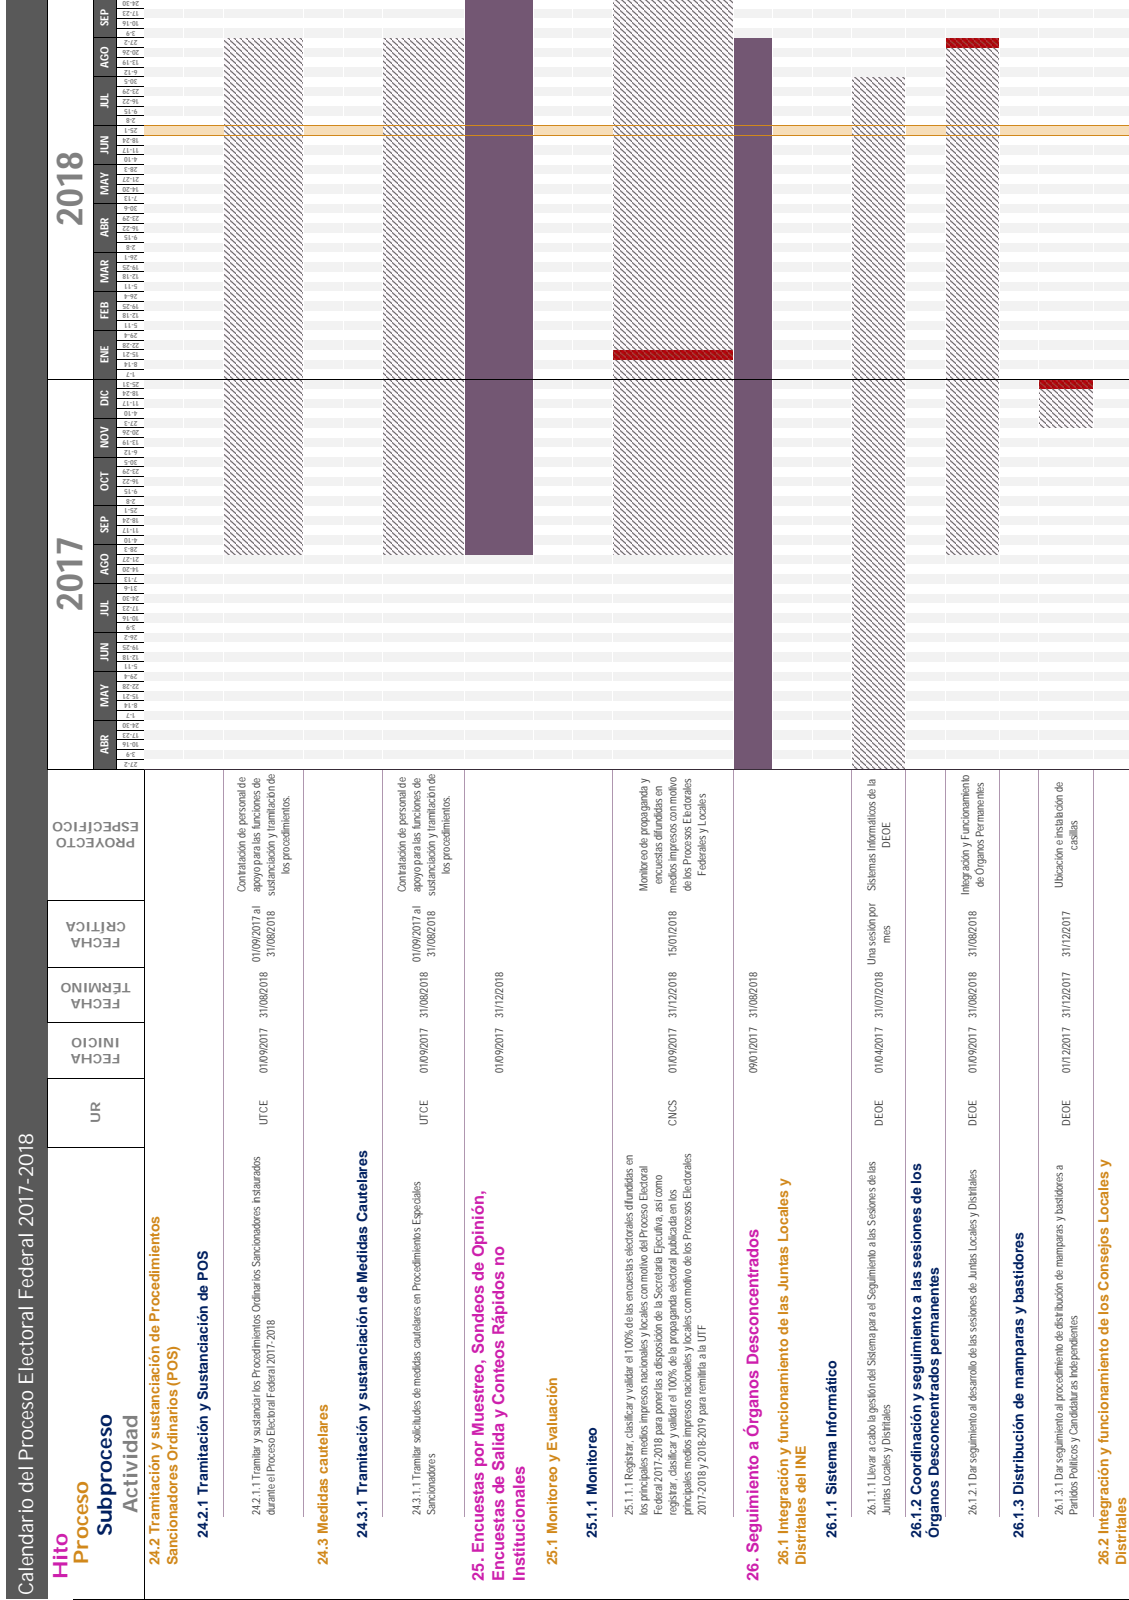


Calendario del Proceso Electoral Federal 2017-2018					2017												2018											
Hito Proceso Subproceso Actividad	UR	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	FECHA CRÍTICA	PROYECTO ESPECÍFICO	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP					
						17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8
26.2.1 Sistema Informático	DECE	01/04/2017	31/07/2018	Una sesión por mes	Sistemas Informáticos de la DECE																							
26.2.2 Publicación de la integración de los Órganos Desconcentrados temporales	DECE	01/01/2018	28/02/2018	28/02/2018	Integración y Funcionamiento de Órganos Temporales																							
26.2.3 Supervisión y seguimiento a la integración de los Órganos Desconcentrados temporales	DECE	01/11/2017	31/08/2018	31/08/2018	Integración y Funcionamiento de Órganos Temporales																							
26.2.3.1 Dar seguimiento a la generación de vacantes de los Consejeros Electorales Locales y Distritales	DECE	01/11/2017	31/08/2018	31/08/2018	Integración y Funcionamiento de Órganos Temporales																							
26.2.3.2 Dar seguimiento a la acreditación y sustitución de representantes de Partidos Políticos ante los Órganos Desconcentrados temporales	DECE	01/11/2017	31/08/2018	31/08/2018	Integración y Funcionamiento de Órganos Temporales																							
26.2.3.3 Dar seguimiento a las inscripciones de representantes de Partidos Políticos y de Candidaturas independientes a las sesiones de Consejos Locales y Distritales, para que se informe al CGC	DECE	01/11/2017	31/08/2018	31/08/2018	Integración y Funcionamiento de Órganos Temporales																							
26.2.3.4 Dar seguimiento al desarrollo de las sesiones de Consejos Locales y Distritales	DECE	01/11/2017	31/08/2018	31/08/2018	Integración y Funcionamiento de Órganos Temporales																							
26.2.3.5 Dar seguimiento a la designación de los Consejeros Electorales que integran los Consejos Distritales del INE	DECE	01/11/2017	08/12/2017	08/12/2017	Integración y Funcionamiento de Órganos Temporales																							
26.2.3.6 Dar seguimiento a la acreditación y sustitución de representantes de Candidaturas independientes ante los Órganos Desconcentrados temporales	DECE	01/03/2018	31/08/2018	31/08/2018	Integración y Funcionamiento de Órganos Temporales																							
26.3 Sistema de Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones																												
26.3.1 Desarrollo y entrega de TIC																												
26.3.1.1 Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema Sesiones de Junta y de Consejo	UNICOM	09/01/2017	30/09/2017	30/09/2017	Actualizar e implementar los sistemas de información de los procesos electorales 2017-2018 y 2018-2019																							
26.3.1.2 Liberar el Sistema Sesiones de Junta y de Consejo para pruebas y simulacros *	UNICOM	01/03/2017	14/08/2017	14/08/2017	Actualizar e implementar los sistemas de información de los procesos electorales 2017-2018 y 2018-2019																							
26.3.2 Soporte a la operación																												
26.3.2.1 Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema Sesiones de Junta y de Consejo	UNICOM	04/09/2017	09/09/2017	09/09/2017	Actualizar e implementar los sistemas de información de los procesos electorales 2017-2018 y 2018-2019																							
26.3.2.2 Dar soporte a la operación del Sistema Sesiones de Junta y de Consejo	UNICOM	15/09/2017	31/08/2018	15/09/2017	Actualizar e implementar los sistemas de información de los procesos electorales 2017-2018 y 2018-2019																							
26.4 Integración de los Órganos de Dirección superior de los OPL																												
26.4.1 Designación de las y los Consejeros de los OPL																												



Calendario del Proceso Electoral Federal 2017-2018		2017												2018														
		ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP									
Hito	Proceso																											
Subproceso	Actividad																											
UR	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	FECHA CRÍTICA	ESPECÍFICO																								
DECE	28/04/2018	21/06/2018	21/06/2018	Ubicación e instalación de casillas																								
DEPPP	01/09/2017	30/09/2017	30/09/2017	Registro de Candidatos																								
27.3 Registro de diversas actividades presentadas por los actores políticos 27.3.1 Registro de Representantes de los Partidos Políticos Nacionales ante los diversos Consejos del Instituto 27.3.1.1 Elaborar el manual para capacitar al personal adscrito al área y en Organos Desconcentrados para recibir y organizar la documentación correspondiente a las acreditaciones y sustituciones de los Representantes de Partidos Políticos, que se registren ante los diversos Organos del Instituto																												
28. Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) 28.1 Sistema de Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 28.1.1 Desarrollo y entrega de TIC																												
UNICOM	08/01/2018	31/05/2018	31/05/2018	Actualizar e implementar los sistemas de jornada y resultados electorales para los PE 2017-2018 y 2018-2019																								
UNICOM	01/03/2018	31/05/2018	31/05/2018	Actualizar e implementar los sistemas de jornada y resultados electorales para los PE 2017-2018 y 2018-2019																								
28.1.2 Soporte a la operación																												
UNICOM	01/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	Actualizar e implementar los sistemas de jornada y resultados electorales para los PE 2017-2018 y 2018-2019																								
UNICOM	01/07/2018	01/07/2018	01/07/2018	Actualizar e implementar los sistemas de jornada y resultados electorales para los PE 2017-2018 y 2018-2019																								
28.2 SIJE																												
28.2.1 Definición de procedimientos																												
DECE	01/07/2017	31/08/2017	28/08/2017	Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) 2018																								
DECE	01/07/2017	31/08/2017	28/08/2017	Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) 2018																								
28.2.2 Sistema Informático																												
DECE	01/09/2017	31/07/2018	15/12/2017	Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) 2018																								

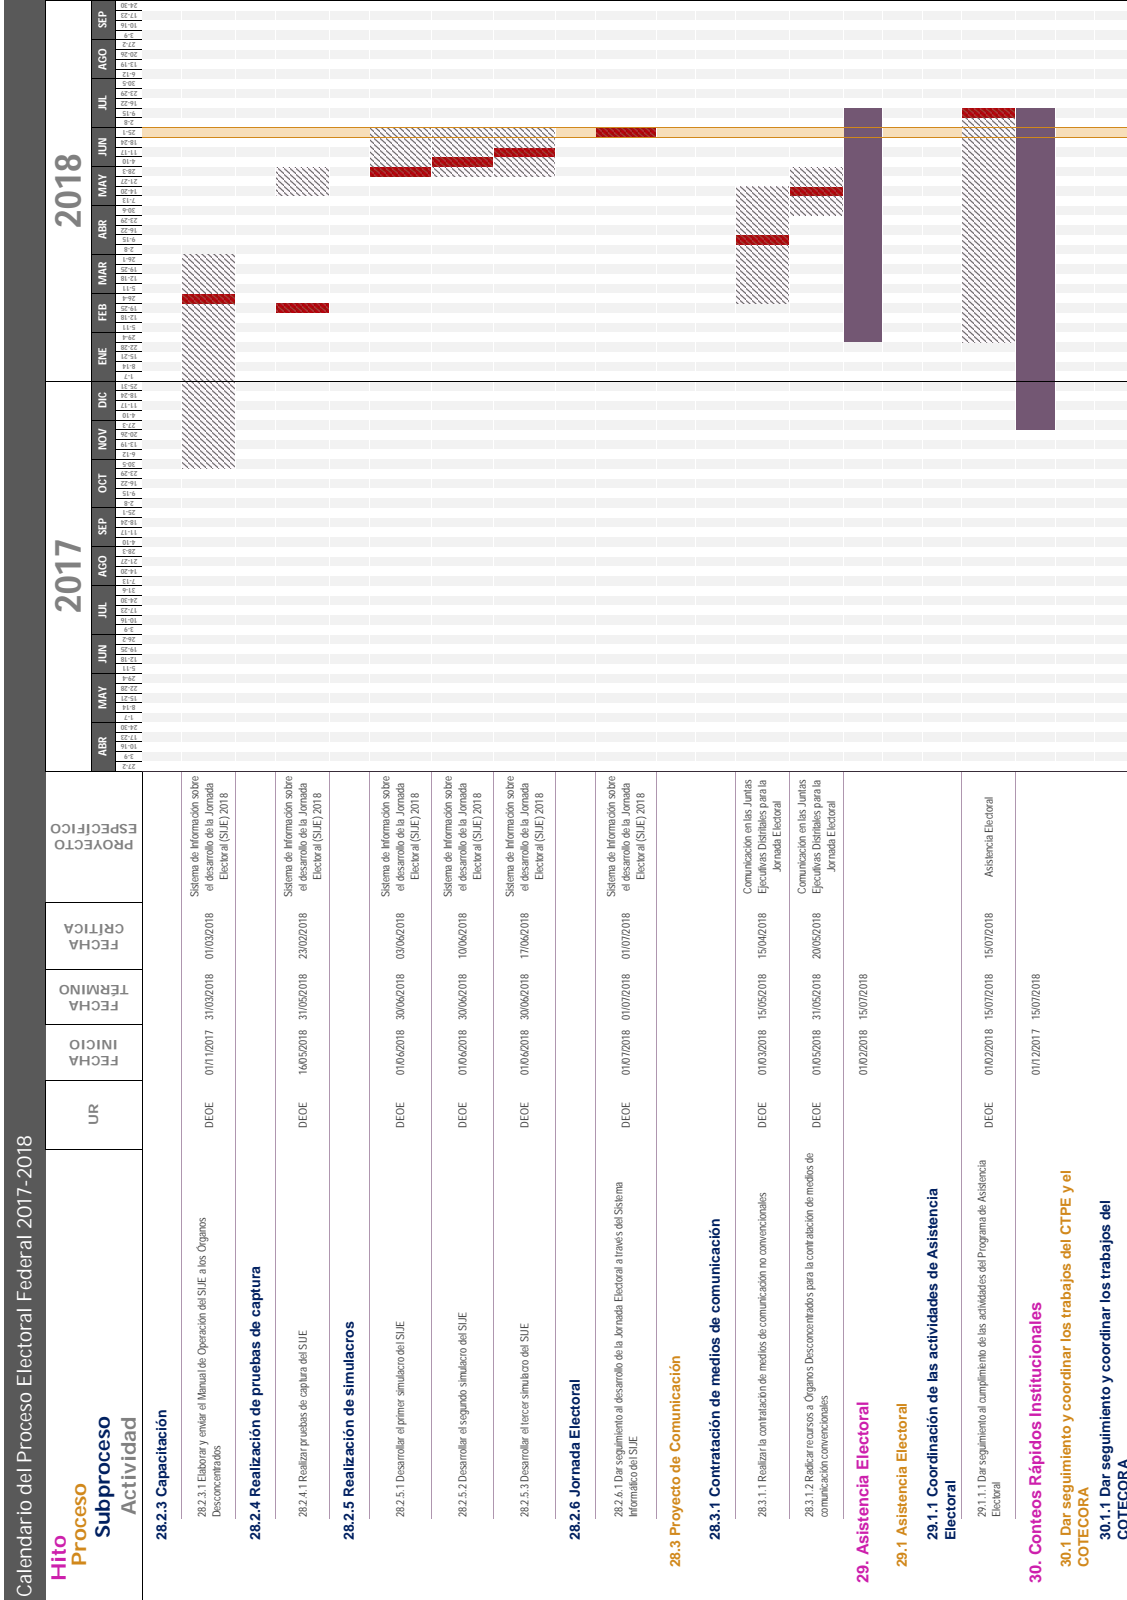


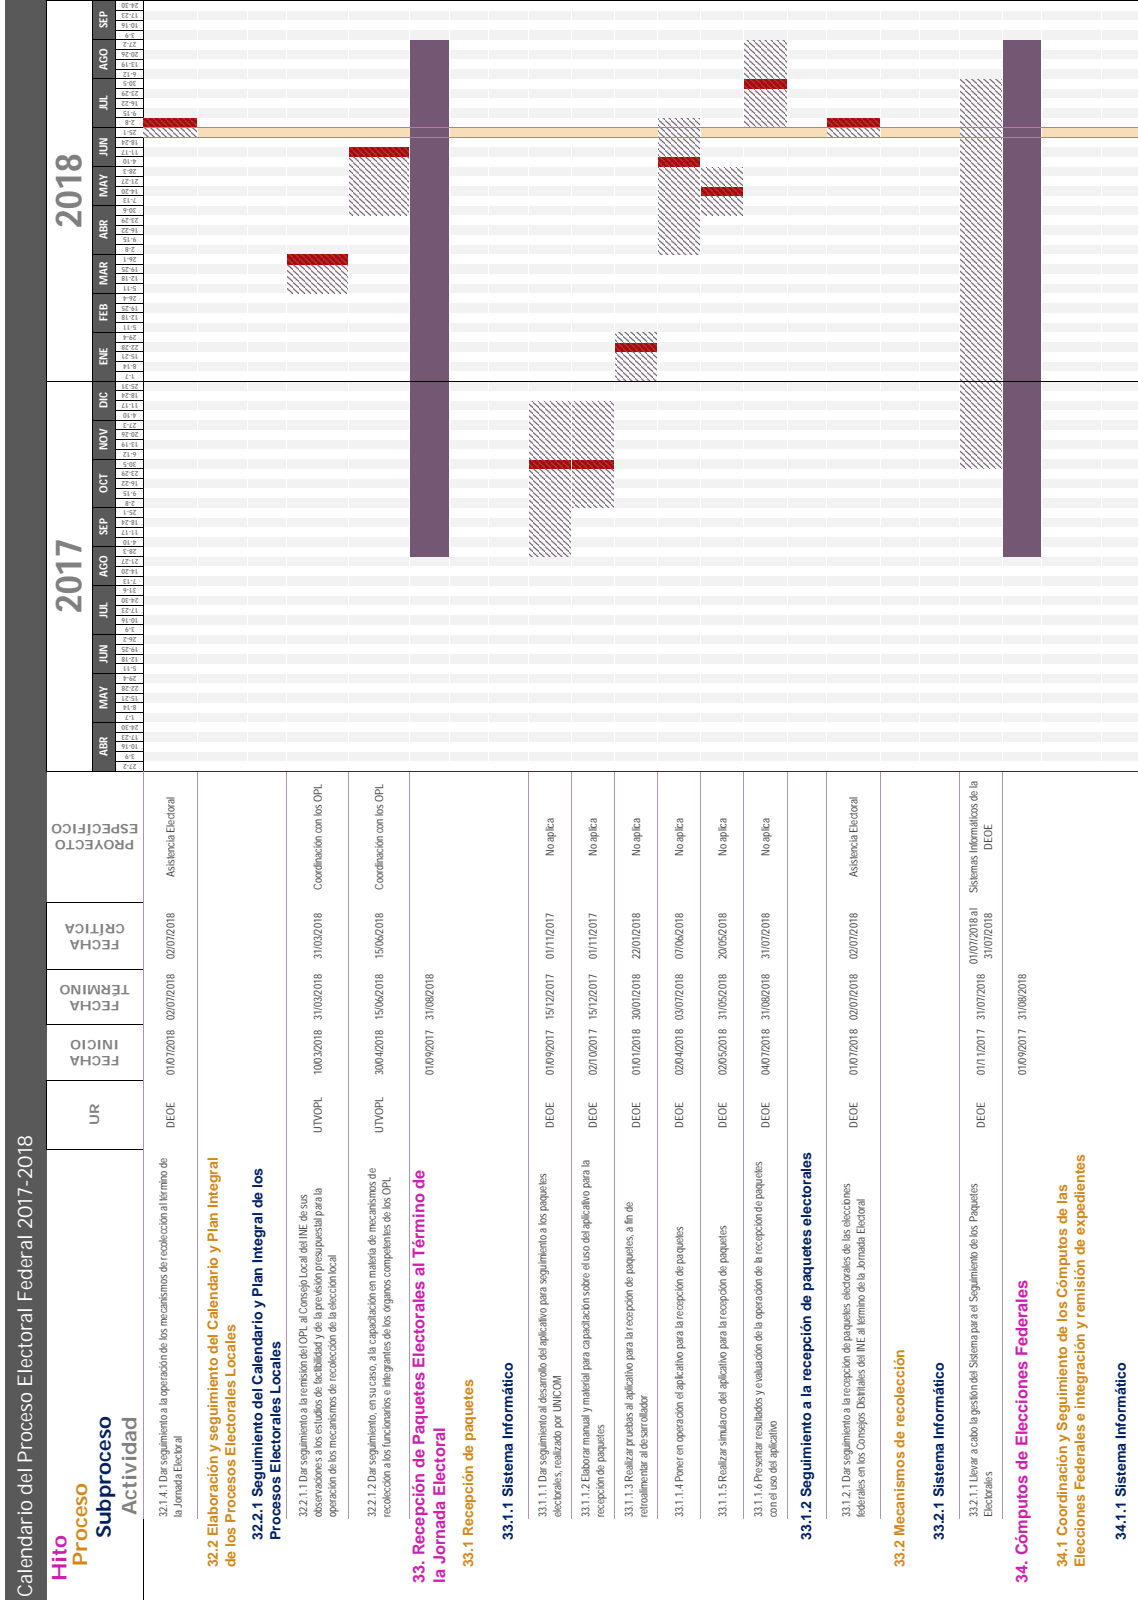

Hito
Proceso
Subproceso
Actividad

UR	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	FECHA CRÍTICA	PROYECTO ESPECÍFICO
DECE	01/07/2018	02/07/2018	02/07/2018	Asistencia Electoral
32.2 Elaboración y seguimiento del Calendario y Plan Integral de los Procesos Electorales Locales				
32.2.1 Seguimiento del Calendario y Plan Integral de los Procesos Electorales Locales				
UTVOP	10/03/2018	31/03/2018	31/03/2018	Coordinación con los OPL
UTVOP	30/04/2018	15/06/2018	15/06/2018	Coordinación con los OPL
33. Recepción de Paquetes Electorales al Término de la Jornada Electoral				
33.1 Recepción de paquetes				
33.1.1 Sistema Informático				
DECE	01/09/2017	15/12/2017	01/11/2017	No aplica
DECE	02/10/2017	15/12/2017	01/11/2017	No aplica
DECE	01/01/2018	30/01/2018	22/01/2018	No aplica
DECE	02/04/2018	03/07/2018	07/06/2018	No aplica
DECE	02/05/2018	31/05/2018	20/05/2018	No aplica
DECE	04/07/2018	31/08/2018	31/07/2018	No aplica
33.1.2 Seguimiento a la recepción de paquetes electorales				
DECE	01/07/2018	02/07/2018	02/07/2018	Asistencia Electoral
33.2 Mecanismos de recolección				
33.2.1 Sistema Informático				
DECE	01/11/2017	31/07/2018	01/07/2018 al 31/07/2018	Sistemas informáticos de la DECE
34. Cómputos de Elecciones Federales				
34.1 Coordinación y Seguimiento de los Cómputos de las Elecciones Federales e Integración y remisión de expedientes				
34.1.1 Sistema Informático				

Calendario del Proceso Electoral Federal 2017-2018		2017												2018															
		ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP										
Hito Proceso Subproceso Actividad	UR	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	FECHA CRÍTICA	PROYECTO ESPECÍFICO																								
	DEOE	01/09/2017	31/07/2018	01/04/2018 al 31/07/2018	Sistemas Informativos de la DEOE																								
34.1.1.1 Llevar a cabo la gestión del Sistema para el Seguimiento a los Resultados Electorales (Sistemas Informativos de Registro de Actas y Computos). Proponer los recursos financieros a la UNICOM para llevar a cabo la auditoría de los sistemas que refiere a: El análisis y verificación del cumplimiento de la normalidad informática en el desarrollo de los sistemas, así como de la revisión de la gestión de recursos informáticos	DEOE	09/07/2018	31/07/2018	20/07/2018	Estadística Electoral Nacional																								
34.1.1.2 Participar en la recopilación de la información de los expedientes de cómputo distrital (actas digitalizadas de las actas de escrutinio y cómputo y/o actas circunstanciales)	DEOE	16/05/2018	30/06/2018	30/06/2018	Integración y Funcionamiento de Organos Permanentes																								
34.1.2 Capacitación sobre documentos normativos en materia de cómputos	DEOE	03/07/2018	03/07/2018	03/07/2018	Integración y Funcionamiento de Organos Permanentes																								
34.1.2.1 Coordinar e impartir cursos de capacitación y asesoría a los integrantes de las Juntas y Consejos Locales y Distritales del INE para el adecuado desarrollo de los cómputos distritales	DEOE	03/07/2018	03/07/2018	03/07/2018	Integración y Funcionamiento de Organos Permanentes																								
34.1.3 Coordinación y seguimiento a la normativa aplicable a los actos preparatorios	DEOE	04/07/2018	07/07/2018	07/07/2018	Integración y Funcionamiento de Organos Permanentes																								
34.1.3.1 Dar seguimiento a la reunión de trabajo y a la sesión extraordinaria de los Consejos Distritales previa al cómputo	DEOE	08/07/2018	08/07/2018	08/07/2018	Integración y Funcionamiento de Organos Permanentes																								
34.1.4 Coordinación y seguimiento a la celebración de las sesiones de cómputos distritales	DEOE	08/07/2018	08/07/2018	08/07/2018	Integración y Funcionamiento de Organos Permanentes																								
34.1.4.1 Dar seguimiento a la Sesión Especial de cómputos distritales	DEOE	10/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	Integración y Funcionamiento de Organos Permanentes																								
34.1.5 Coordinación y seguimiento a la celebración de las sesiones de cómputos de Entidad Federativa	DEOE	08/07/2018	08/07/2018	08/07/2018	Integración y Funcionamiento de Organos Permanentes																								
34.1.5.1 Dar seguimiento al desarrollo de la sesión especial de cómputo de Entidad Federativa	DEOE	08/07/2018	08/07/2018	08/07/2018	Integración y Funcionamiento de Organos Permanentes																								
34.1.6 Coordinación y seguimiento a la celebración de las sesiones de cómputos de los Consejos Locales cabecera de Circunscripción	DEOE	08/07/2018	08/07/2018	08/07/2018	Integración y Funcionamiento de Organos Permanentes																								
34.1.6.1 Dar seguimiento al desarrollo de la sesión especial de cómputo de Representación Proporcional en cada circunscripción	DEOE	08/07/2018	08/07/2018	08/07/2018	Integración y Funcionamiento de Organos Permanentes																								
34.1.7 Integración y remisión de expedientes de las elecciones federales y de las consultas populares	DEOE	10/07/2018	31/08/2018	31/08/2018	Computo y remisión de expedientes																								
34.1.7.1 Dar seguimiento a la integración y remisión de los expedientes de las elecciones federales a las instancias correspondientes	DEOE	10/07/2018	31/08/2018	31/08/2018	Computo y remisión de expedientes																								
34.2 Sistema de Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones																													
34.2.1 Desarrollo y entrega de TIC																													
34.2.1.1 Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema de Cómputos Distritales y de Circunscripción	UNICOM	15/10/2017	15/04/2018	15/04/2018	Actualizar e implementar los sistemas de jornada y resultados electorales para los PE 2017-2018 y 2018-2019																								
34.2.1.2 Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema de Registro de Actas de Escrutinio Computo de Casillas	UNICOM	15/10/2017	28/02/2018	28/02/2018	Actualizar e implementar los sistemas de jornada y resultados electorales para los PE 2017-2018 y 2018-2019																								

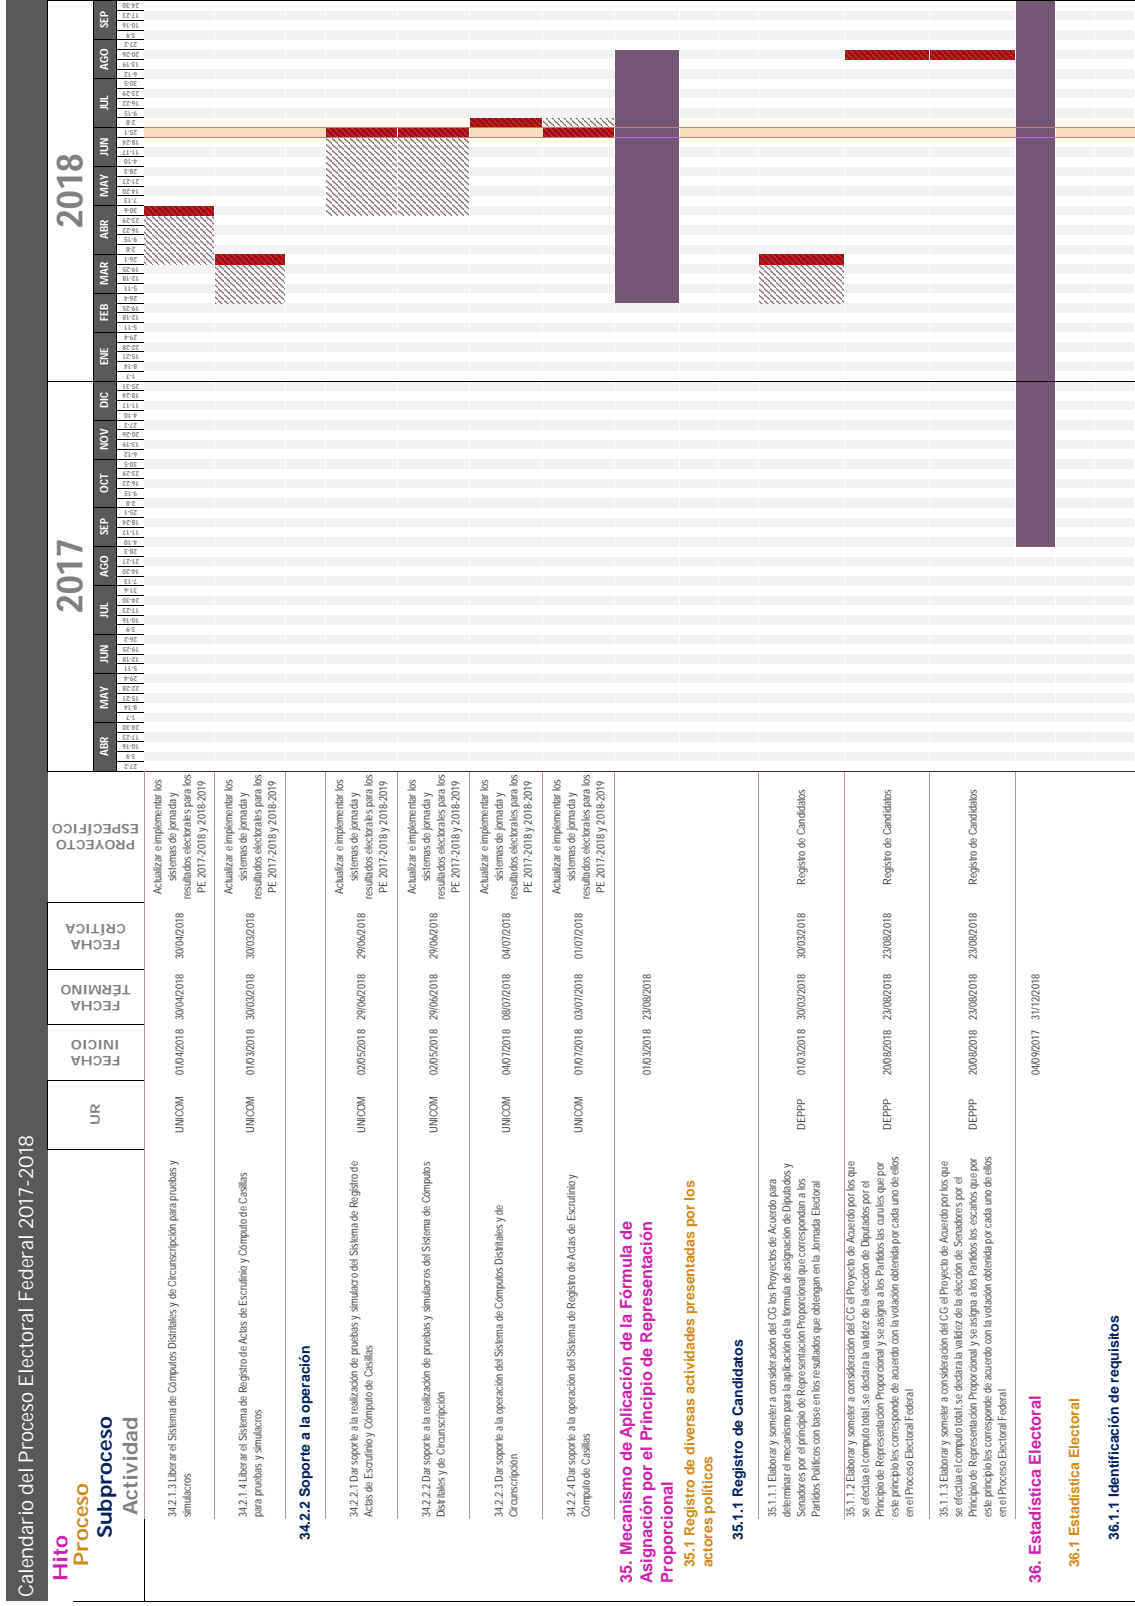

Calendario del Proceso Electoral Federal 2017-2018

Hito	Subproceso	Actividad	UR	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	FECHA CRÍTICA	PROYECTO ESPECÍFICO
		34.2.1.3 Liberar el Sistema de Computos Distritales y de Circunscripción para pruebas y simulacros	UNICOM	01/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	Actualizar e implementar los sistemas de jornada y resultados electorales para los PE 2017-2018 y 2018-2019
		34.2.1.4 Liberar el Sistema de Registro de Actas de Escrutinio y Computo de Casillas para pruebas y simulacros	UNICOM	01/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	Actualizar e implementar los sistemas de jornada y resultados electorales para los PE 2017-2018 y 2018-2019
		34.2.2 Soporte a la operación					
		34.2.2.1 Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema de Registro de Actas de Escrutinio y Computo de Casillas	UNICOM	02/05/2018	29/06/2018	29/06/2018	Actualizar e implementar los sistemas de jornada y resultados electorales para los PE 2017-2018 y 2018-2019
		34.2.2.2 Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema de Computos Distritales y de Circunscripción	UNICOM	02/05/2018	29/06/2018	29/06/2018	Actualizar e implementar los sistemas de jornada y resultados electorales para los PE 2017-2018 y 2018-2019
		34.2.2.3 Dar soporte a la operación del Sistema de Computos Distritales y de Circunscripción	UNICOM	04/07/2018	08/07/2018	04/07/2018	Actualizar e implementar los sistemas de jornada y resultados electorales para los PE 2017-2018 y 2018-2019
		34.2.2.4 Dar soporte a la operación del Sistema de Registro de Actas de Escrutinio y Computo de Casillas	UNICOM	01/07/2018	03/07/2018	01/07/2018	Actualizar e implementar los sistemas de jornada y resultados electorales para los PE 2017-2018 y 2018-2019
		35. Mecanismo de Aplicación de la Fórmula de Asignación por el Principio de Representación Proporcional					
		35.1 Registro de diversas actividades presentadas por los actores políticos					
		35.1.1 Registro de Candidatos					
		35.1.1.1 Elaborar y someter a consideración del CG los Proyectos de Acuerdo para determinar el mecanismo para la aplicación de la Fórmula de Asignación de Diputados y Senadores por el Principio de Representación Proporcional que correspondan a los Partidos Políticos con base en los resultados que obtengan en la Jornada Electoral	DEPPP	01/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	Registro de Candidatos
		35.1.1.2 Elaborar y someter a consideración del CG el Proyecto de Acuerdo por el que se efectúa el cómputo total, se declara la validez de la elección de Diputados por el Principio de Representación Proporcional y se asigna a los Partidos los escaños que por este principio les corresponde de acuerdo con la votación obtenida por cada uno de ellos en el Proceso Electoral Federal	DEPPP	20/08/2018	25/08/2018	23/08/2018	Registro de Candidatos
		35.1.1.3 Elaborar y someter a consideración del CG el Proyecto de Acuerdo por el que se efectúa el cómputo total, se declara la validez de la elección de Senadores por el Principio de Representación Proporcional y se asigna a los Partidos los escaños que por este principio les corresponde de acuerdo con la votación obtenida por cada uno de ellos en el Proceso Electoral Federal	DEPPP	20/08/2018	23/08/2018	23/08/2018	Registro de Candidatos
		36. Estadística Electoral					
		36.1 Estadística Electoral					
		36.1.1 Identificación de requisitos					

Calendario del Proceso Electoral Federal 2017-2018		2017												2018															
		ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP										
Hito Proceso Subproceso Actividad	UR	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	FECHA CRÍTICA	PROYECTO																								
	DECE	04/09/2017	30/10/2017	15/10/2017	Estadística Electoral Nacional																								
36.1.1 Realizar el proceso de Sistema de Consulta de Estadísticas de las Elecciones Federales 2017-2018 (Más de Resultados Electorales 1991-2018) incorporando innovaciones y nuevas tecnologías	DECE	04/09/2017	30/10/2017	15/10/2017	Estadística Electoral Nacional																								
36.1.2 Sistema Informático																													
36.1.1 Realizar la integración definitiva de los resultados de las elecciones del Proceso Electoral Federal 2017-2018, utilizando los resultados entregados por el TEPJF	DECE	01/01/2018	30/11/2018	30/11/2018	Estadística Electoral Nacional																								
36.1.3 Tablas de resultados																													
36.1.3.1 En su caso, actualizar los lineamientos para el diseño de las tablas de resultados electorales de los OPL	DECE	01/01/2018	01/07/2018	01/05/2018	Estadística Electoral Nacional																								
36.1.3.2 Brindar asesoría a los OPL para la elaboración de las tablas de resultados conforme a lo dispuesto en los lineamientos para el diseño de las tablas de resultados electorales	DECE	09/07/2018	31/12/2018	31/12/2018	Estadística Electoral Nacional																								
36.1.3.3 Incorporar las tablas de resultados electorales de los OPL, en la versión del Sistema de Consulta de la Estadística Electoral del INE	DECE	09/07/2018	31/12/2018	31/12/2018	Estadística Electoral Nacional																								
36.2 Encuestas por muestreo, sondeos de opinión, encuestas de salida y conteos rápidos no institucionales																													
36.2.1 Verificación del cumplimiento de criterios científicos sobre encuestas publicadas																													
36.2.1.1 Monitorear para seleccionar encuestas publicadas en medios impresos	SE	08/09/2017	31/07/2018	No aplica	No aplica																								
36.2.1.2 Probar estudios de encuestas publicadas para verificar el cumplimiento de criterios científicos en materia de regulación de encuestas	SE	08/09/2017	31/07/2018	No aplica	No aplica																								
36.2.1.3 Acreditara a las personas físicas y morales que den aviso a la autoridad y cumplan con los criterios científicos para llevar a cabo encuestas de salida y conteos rápidos no institucionales el día de la Jornada Electoral	SE	01/05/2018	20/06/2018	20/06/2018	No aplica																								
36.2.2 Seguimiento al cumplimiento de sus obligaciones del OPL en materia de encuestas electorales																													
36.2.2.1 Probar y publicar los informes mensuales que se presentan ante el Consejo General de los OPL, en cada sesión ordinaria durante Proceso Electoral	SE	08/09/2017	31/07/2018	No aplica	No aplica																								
36.3 Elaboración y seguimiento del Calendario y Plan Integral de los Procesos Electorales Locales																													
36.3.1 Seguimiento del Calendario y Plan Integral de los Procesos Electorales Locales																													
36.3.1.1 Dar seguimiento a la publicación de las bases de datos de los computos de votos de las elecciones locales en los portales de Internet de los OPL	UTVOPL	13/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	Coordinación con los OPL																								
36.3.1.2 Probar de los OPL, las tablas de los resultados electorales actualizadas y definitivas de las elecciones que habrán celebrado (ordinarias y extraordinarias)	UTVOPL	13/07/2018	31/12/2018	31/12/2018	Coordinación con los OPL																								
36.4 Elaboración y seguimiento del Calendario y Plan Integral de los Procesos Electorales Locales																													

